

令和5年1月18日

国土交通省関東地方整備局

利根川水系砂防事務所

## 工事発注手続きについて

### ～「R4大日向川工事用道路工事」の発注手続きを行います～

「R4大日向川工事用道路工事」において「公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）」「余裕期間制度（フレックス方式）」を試行します。併せて「難工事指定」を採用します。

工事発注において、入札参加者がいないことなどを理由として、入札の取りやめや不調が予測される工事について、不調・不落対策を試行しています。

今回発注する「R4大日向川工事用道路工事」については、以下のとおり不調・不落対策を採用します。

#### ①「公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）」

競争参加者が少数と見込まれる工事について、対象工事ごとに技術資料収集に係る公示資料の交付を受けて、競争参加希望者が参加表明確認申請書及び技術資料（参加要件は企業のみとして技術者要件を求めない。）を提出し、指名基準による選定を行い、指名された競争参加希望者により総合評価落札方式で落札者を決定するものです。なお、総合評価は、災害活動実績及び賃上げの実施を加算点としています。

#### ②「余裕期間制度（フレックス方式）」

受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定する制度です。

#### ③「難工事指定」

工事を適切に完成させた場合、その後の発注工事における総合評価項目「難工事施工実績評価対象工事（試行）」を加点対象とする「難工事指定」を採用します。

<発表記者クラブ> 竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、長野県庁会見場、佐久記者クラブ

問い合わせ先>

関東地方整備局 利根川水系砂防事務所

電話 0279-22-4177（代表） FAX：0279-24-4184


副所長 小島 宏一（内線：204）

工務課長 野村 利幸（内線：311）


《工事概要》

- (1) 工 事 名 : R4大日向川工事用道路工事
- (2) 工事場所 : 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉地先
- (3) 工 期 : 契約締結の翌日から令和6年2月29日まで
- (4) 入札方式 : 公募型指名競争入札方式 (総合評価落札方式)
- (5) 工事種別 : 一般土木工事 C等級
- (6) 工事内容 : 土工 1式
  - 掘削工 約500m<sup>3</sup>
  - 路体盛土 約1,600m<sup>3</sup>
  - 植生工 1式
    - 植生マット 約1,500m<sup>2</sup>
  - 伐木除根工 約6,600m<sup>2</sup>
  - コンクリートブロック運搬 6,517個

平面図

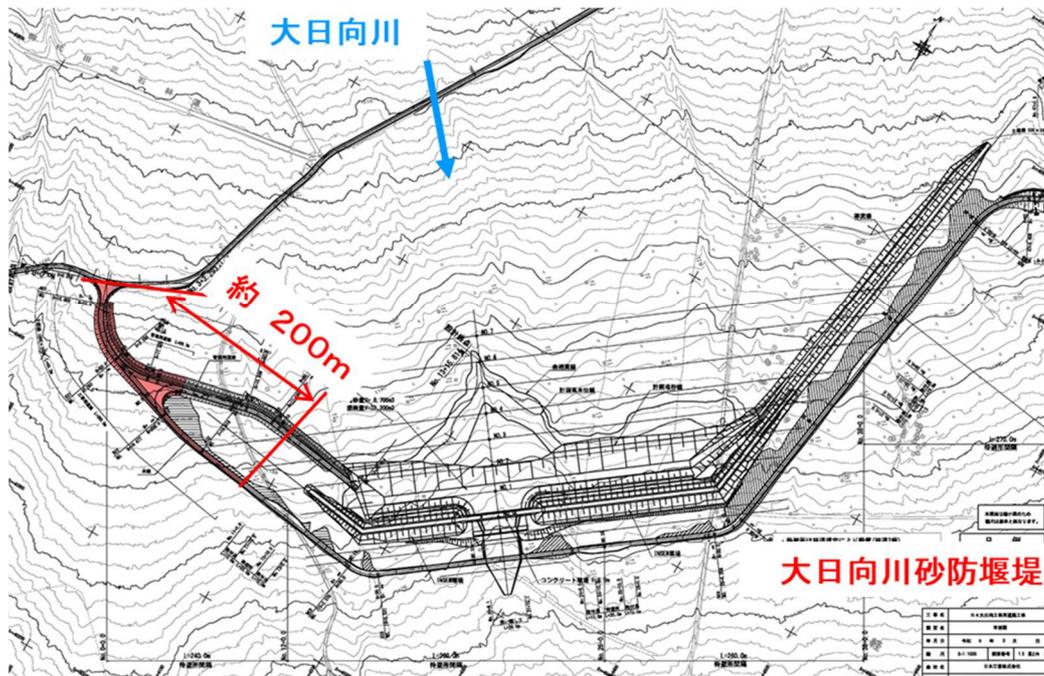

標準断面図



《余裕期間制度（フレックス）の試行について》

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保の準備を行うことができる余裕期間制度を採用します。契約時に令和6年2月29日までの間で受注者は工事の始期・終期を任意に設定することができます。監理技術者等の配置が不要となります。また、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）についても、監理技術者等の配置が不要となります。

《難工事指定について》

本工事は、山間部における急峻で狭隘な箇所での施工となるため、厳しい安全管理が必要であるため、「難工事」の指定を実施します。

「難工事」指定された工事は、完成時に70点以上の工事成績評定を通知された場合、今後発注される「難工事施工実績評価対象工事（試行）」の総合評価の評価項目において加対象となります。また、加対象となる期間は、審査基準日の月以前の1年間に元請けとして、完成・引き渡し完了した施工実績が加対象となります。

また、主任（監理）技術者または現場代理人として従事した経験について、審査基準日の月以前の4年間を評価対象となります。

《スケジュール》

- 入札公示、入札説明書 交付 : 令和5年 1月18日（水）
- 競争参加資格確認申請書、資料 提出期限 : 令和5年 1月27日（金）
- 入札書・工事費内訳書 提出期限 : 令和5年 2月27日（月）
- 開札日 : 令和5年 3月 2日（木）

【見積参考資料】概略工事工程表  
 工事名：R4大日向川工事用道路工事

工程	単位	数量	令和5年度												備考 (パーティ(pt)数等)	
			3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		
準備	式	1	■													・40日間
道路土工	式	1									■					・掘削(1pt) ・路体盛土(1pt) ・法面整形(1pt)
法面工	式	1										■				・法面整形(1pt) ・植生工(1pt)
伐木除根工	式	1							■	■	■					・伐木除根工(1pt)
根固めブロック工	式	1		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		・根固めブロック運搬(1pt)
片付け	式	1												■		・20日間
関連工事(前工事)	-															
関係機関協議	-		■	■	■	■	■	■	■							
住民合意	-															
用地確保	-															
法定手続き	-															
支障物件の移設	-															
年末年始、お盆	-															・8月中旬 ・12月下旬～1月上旬
出水期間	-															
路上工事抑制	-															

《余裕期間制度（フレックス）の活用について》  
 本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、発注者があらかじめ設定した全体工期（余裕期間と工期を合わせた期間）の中で、受注者は工事の始期と終期を任意に設定することができます。  
 なお、工事の始期までの余裕期間は、監理技術者等の配置が不要となります。

# 公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式)の試行について

対象は  
一般土木  
C,B+C工事  
維持修繕等

## 【メリット】

- ✓ 施工体制確保→発注工事の公募
- ✓ 資料は参加希望の意思確認時のみの提出  
→資料の簡素化、合理化(個別発注時では不要)
- ✓ 手続期間の短縮  
→指名通知から決定まで2週間程度
- ✓ **指名競争・総合評価落札方式**  
→災害協定の締結や活動に係るインセンティブの向上

**公示**

(工事内容・入札時期・落札方式等)



工事参加希望の意思確認・技術資料の提出

(参加意思表明申請書+必要資料の提出)



参加要件は企業とし、  
技術者要件は求めない

指名基準による選定



**発注(指名通知)**

以降は指名競争・総合評価  
落札方式の手続き



指名競争・総合評価落札方式により落札決定

(標準点100点+加算点(11点)+施工体制  
評価点(30点))÷入札価格=評価値  
※加算点は災害活動実績+賃上げの実施  
に関する評価

公募による企業の参加

公募結果に基づく指名

災害協定の締結や活動に  
係るインセンティブの向上
