

令和 5 年 1 月 24 日
国土交通省関東地方整備局
相武国道事務所

工事発注手続きについて

～跨道橋(プレストレスト・コンクリート橋)上部工事 2 件の発注手続きを行います～

相武国道事務所発注工事において、「公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式)」及び「材料単価の公表」を試行します。併せて「余裕期間制度(フレックス方式)」 「難工事指定」を採用します。

工事発注において、予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札の取り止めや不調が予測される工事について不調不落対策の試行をしております。今回相武国道事務所にて発注する下記対象工事について以下の通り試行、採用します。

【対象工事】

1. R 4 国道 2 0 号八王子南 B P ^{たてこどうきょう}館跨道 橋 上部工事
2. R 4 国道 2 0 号八王子南 B P ^{てらだこどうきょう}寺田跨道 橋 上部工事

【不調・不落対策】

- : ①、②、③、④
: ①、②、③、④

- ①公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式)
- ②材料単価の公表
- ③余裕期間制度(フレックス方式)
- ④難工事指定

※詳細は次頁以降をご覧ください。

<発表記者クラブ>

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、都庁記者クラブ、神奈川県政記者クラブ、八王子記者クラブ、立川市政記者クラブ 青梅・西多摩記者クラブ 相模原記者クラブ

<問い合わせ先>

関東地方整備局 相武国道事務所

電話：0 4 2 - 6 4 3 - 2 0 0 1 (代表) FAX：0 4 2 - 6 4 3 - 2 3 2 0

副所長 ^{みつや}三屋 ^{りゅういち}竜一 (内線：2 0 4)

工務課長 ^{やまだ}山田 ^{まさひと}正人 (内線：4 1 1)

《公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）地域防災実績評価型》

競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について、対象工事ごとに技術資料収集に係る公示資料の交付を受けて、競争参加希望者が参加表明確認申請書及び技術資料（参加要件は企業のみとして技術者要件を求めない。）を提出し、指名基準による選定を行い、指名された競争参加希望者により総合評価落札方式で落札者を決定するものです。

なお、総合評価は、災害活動実績及び賃上げの実施を加算点としています。

《材料単価の公表》

事業執行における円滑な発注及び施工体制の確保に向け特別調査（臨時調査）により設定した「主たる建設資材」の材料単価について公表を行います。

《余裕期間制度（フレックス方式）》

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間制度を採用します。契約時に受注者は、工事の始期・終期を任意に設定することができます。

なお、工事の始期までの余裕期間内は、契約期間内ではあるが工期外であることから、監理技術者等の配置が不要となります。

また、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）についても、監理技術者等の配置が不要となります。

《難工事指定》

本工事は、支保工下を工事用道路として利用するため、隣接する他工事との密接な調整が必要となるため、厳しい安全管理が必要となることから「難工事指定」を採用します。

「難工事指定」された工事は、完成時に70点以上の工事成績評定を通知された場合、今後発注される「難工事施工実績評価対象工事（試行）」の総合評価の評価項目において加点対象となります。また、加点対象となる期間は、審査基準日の月以前の1年間に元請けとして、完成・引き渡し完了した施工実績が加点対象となります。また、主任（監理）技術者または現場代理人として従事した経験について、審査基準日の月以前の4年間で評価対象となります。

《スケジュール》

- 入札公示、入札説明書の交付 ： 令和5年1月24日（火）
- 技術資料等の提出期限 ： 令和5年2月 7日（火）
- 入札書、工事費内訳書の提出期限 ： 令和5年3月 3日（金）
- 開札日 ： 令和5年3月 8日（水）

工事名：R 4 国道 2 0 号八王子南 BP^{たてこどうきょう}館^{たてまち}跨道 橋 上部工事

《工事概要》

- (1) 工事場所：東京都八王子市館町地先
- (2) 工 期：契約締結の翌日から令和 6 年 9 月 3 0 日まで
- (3) 入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）
- (4) 工事種別：プレストレスト・コンクリート
- (5) 工事内容（概要）：コンクリート橋上部 1 式、PC 方杖ラーメン橋工 1 式、
橋梁付属物工 1 式、コンクリート橋足場等設置工 1 式、
仮設工 1 式、橋台工 1 式、RC 橋脚工 1 式



R4.12 ※空撮に跨道橋のイメージを反映させものである

優位性

① 現場へのアクセス性

施工箇所には町田街道（医療センター入口交差点）からの搬入となり、八王子南バイパス工事施工区間を通行することとなるが、大型車両による搬入搬出に十分な幅員が確保されている。

② 関連工事の状況

下部工事(写真黄色部分)は R5.3 末に完了予定である。



③ 周囲状況

周辺は山林に囲まれており、家屋が少ない。

工事名：R 4 国道 2 0 号八王子南 BP寺田跨道 橋 上部工事

《工事概要》

- (1) 工事場所：東京都八王子市寺田町地先～東京都八王子市館町地先
- (2) 工 期：契約締結の翌日から令和 6 年 3 月 2 0 日まで
- (3) 入札方式：公募型指名入札方式（総合評価落札方式）
- (4) 工事種別：プレストレスト・コンクリート
- (5) 工事内容（概要）：コンクリート橋上部 1 式、PC 斜材付変形 π 型ラーメン橋 1 式
橋梁付属物工 1 式、コンクリート橋足場等設置工 1 式、
仮設工 1 式、RC 橋脚工 1 式

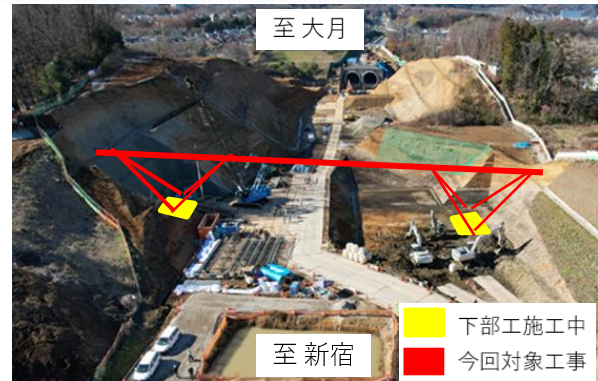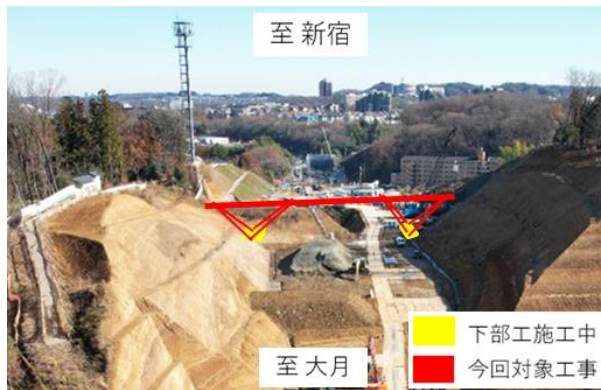

R4.12 ※空撮に跨道橋のイメージを反映させものである

優位性

① 現場へのアクセス性

施工箇所には、めじろ台寺田線側からの搬入となり、八王子南バイパス工事施工区間を通行することとなるが、大型車搬入搬出に十分な幅員があり、場内での車両の待機場所も十分に確保がされている。

② 関連工事の状況

下部工事(写真黄色部分)は R5.3 末に完了予定である。

③ 周囲状況

周辺は山林に囲まれており、家屋が少ない。

公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式・実績評価型)の試行について

【メリット】

- ✓ 資料は参加希望の意思確認時のみの提出
→資料の簡素化、合理化(個別発注時では不要)
- ✓ 手続期間の短縮
→指名通知から決定まで2週間程度
- ✓ 指名競争(総合評価落札方式・実績評価型)
→民間工事を含む施工実績及び災害活動実績を評価

