

工事発注手続きについてのお知らせ

～「R7国道298号戸田市美女木東地区交通安全対策工事」の発注手続きを行います～

北首都国道事務所が発注する「R7国道298号戸田市美女木東地区交通安全対策工事」において、不調・不落対策等を試行、採用します。

工事発注において、予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりやめや不調が予想される工事について、不調・不落対策等を試行、採用しています。

今回発注する「R7国道298号戸田市美女木東地区交通安全対策工事」については、以下のとおり不調・不落対策等を試行、採用します。

【不調・不落対策等】

1. 公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式） 企業実績評価型
2. 競争参加資格の緩和
3. 難工事指定
4. 余裕期間制度（発注者指定方式）

※詳細は次頁をご覧ください。

<問い合わせ先>

関東地方整備局 北首都国道事務所

電話：048-942-4041（代表） メールアドレス：ktr-kitasyuto001@mlit.go.jp

副所長（技術） 茅根 （ちのね） （内線：205）

管理課 課長 星野 （ほしの） （内線：431）


《工事概要》

- (1) 工 事 名：R 7 国道 2 9 8 号戸田市美女木東地区交通安全対策工事
- (2) 工事場所：埼玉県戸田市美女木東地先
- (3) 工 期：令和 8 年 4 月 1 日から令和 8 年 9 月 3 0 日まで
(余裕期間：契約締結日の翌日から令和 8 年 3 月 3 1 日まで)
- (4) 入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型
- (5) 工事種別：維持修繕工事
- (6) 工事内容（概要）：

○北戸田駅入口交差点

舗装工 6 7 0 m² 縁石工 3 5 m、標識工 1 6 基、
区画線工 1 1 1 m、道路付属施設工 1 式

【位置図】

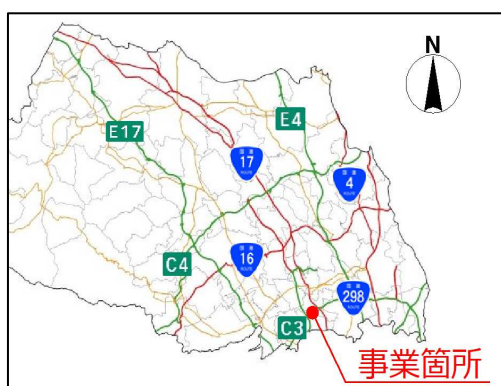

【現地地図】




出典: 国土地理院(地理院地図を加工して使用)

【写真】



【工事概要図】

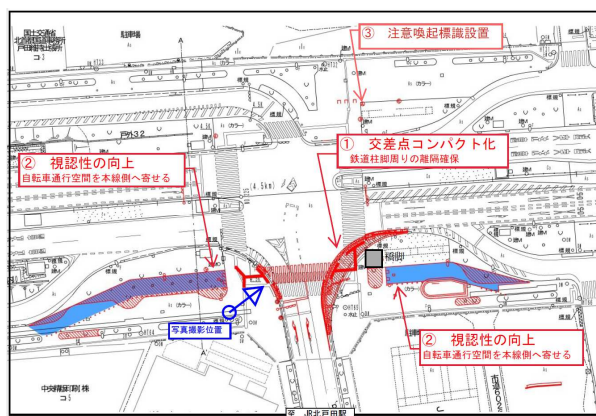

《不調・不落対策等》

1. 公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型

競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について、試行するものです。

特徴は次のとおりです。なお、公共工事の実績のない企業でも参加しやすい方式となっています。

1) 競争参加時に配置予定技術者の申請は不要です。

(参加要件として配置予定技術者の工事経験の設定はありません。)

2) 総合評価における加算点の評価対象は、企業における防災に係る取組姿勢、同種工事の施工実績、本発注工事の工事種別における新規契約の有無及び賃上げの実施、**ワーク・ライフ・バランス関連認定企業の評価**を加算点としています。

3) 過去の工事成績や表彰実績、配置予定技術者の技術力は評価対象としません。

2. 競争参加資格の緩和

1) 地域要件の拡大

工事場所等の地理的条件を勘案し、競争参加資格の地域要件を「埼玉県内」に建設業法に基づく本店、支店又は営業所を有する企業から「関東地方整備局管内」に建設業法に基づく本店、支店又は営業所を有する企業に拡大します。

2) 企業に求める施工実績の緩和

企業に求める施工実績を「舗装修繕工事」に限定せず、「道路で行う舗装修繕または新設舗装の施工実績」として緩和します。

3. 難工事指定

本工事は、交通量の多い国道298号の本線車道での作業となり、交通規制を行いながら車道舗装等を施工することから、厳しい安全管理が必要であるため、「難工事」の指定を実施します。

「難工事」指定された工事は、完成時に70点以上の工事成績評定を通知された場合、今後発注される「難工事施工実績評価対象工事（試行）」の総合評価の評価項目において加点対象となります。なお、主任（監理）技術者または現場代理人として従事した経験について、審査基準日の月以前の4年間で評価対象となります。

4. 余裕期間制度（発注者指定方式）

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事あり、**契約締結日の翌日から令和8年3月31日までが余裕期間となります。**

なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。

《スケジュール》

○入札公示、入札説明書交付	： 令和 8年 1月22日（木）
○技術資料等の提出期限	： 令和 8年 2月 3日（火）
○入札書・工事費内訳書の提出期限	： 令和 8年 3月 9日（月）
○開札日	： 令和 8年 3月12日（木）

概略工事工程表

工事名 : R7国道298号戸田市美女木東地区交通安全対策工事

工 種		単位	数量	令和7年度	令和8年度												備 考 パーティ(pt)数等	
				R8. 3月	4月			5月		6月		7月		8月		9月		
準備工		式	1	※契約締結日の翌日から令和8年3月31日まで 余裕期間														・50日間
道路維持【北戸田駅入口交差点】																		
道路土工		式	1															1pt
舗装工		式	1															1pt 信号機設置工事との調整
排水構造物工、縁石工		式	1															1pt
防護柵工		式	1															1pt
標識工		式	1															1pt 制作期間30日含む
区画線工		式	1															1pt 信号機設置工事との調整
道路付属施設工		式	1															1pt
構造物撤去工		式	1															1pt
後片付け工		式	1														・20日間	
条 制 件 約	年末年始・お盆																	
	信号機設置																	
	関係機関協議																所轄警察署との協議 (道路交通法第80条)	
雨休率の適用		準備・後片付けを除く、雨休率（猛暑日補正あり）を適用。																

《余裕期間制度（発注者指定方式）の活用について》

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働力確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、発注者が指定した工事の始期までが余裕期間となります。

なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。

公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式・企業実績評価型)の試行について

【メリット】

- ✓ 施工体制確保→発注工事の公募
- ✓ 資料は参加希望の意思確認時のみの提出
→資料の簡素化、合理化(個別発注時では不要)
- ✓ 手続期間の短縮
→指名通知から決定まで2週間程度
- ✓ **総合評価落札方式・企業実績評価型**
→企業における防災に係る取組姿勢と施工実績等を評価

公示

(工事内容・入札時期・落札方式等)



工事参加希望の意思確認・技術資料の提出

(参加意思表明申請書+必要資料の提出)



参加要件は企業とし、
技術者要件は求めない

指名基準による選定



発注(指名通知)

以降は指名競争・総合評価
落札方式の手続き



指名競争・総合評価落札方式により落札決定

(標準点100点+加算点(11.5点)+施工体制
評価点(30点))÷入札価格=評価値
※加算点は企業における防災に係る取組
姿勢と施工実績等+賃上げの実施
に関する評価+WLB関連企業の評価

公募による企業の参加

公募結果に基づく指名

防災に係る取組姿勢と
施工実績等を評価
