工　事　設　計　書

工事設計書のダウンロードにあたって

　知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による２次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省　関東地方整備局
日光砂防事務所

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ８般若沢第４床固改築工事
工事地名	栃木県日光市中宮祠地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 7月	
２）	事務所名	日光砂防事務所　工務課	
３）	工事番号	2026070017	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	
５）	変更回数	0回	
６）	主 工 種	砂防・地すべり等工事	
７）	工 事 量		
８）	工　　期	810日間　自　令和 8年10月 5日	
		（当初）　至　令和10年12月22日	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	
９）	施 工 県	栃木県	
１０）	地　　区	日光地区	
１１）	河川・路線	鬼怒川	
１２）	設 計 年 月	令和 8年 8月	
１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
１４）	単価適用年月	2026年 8月	
１５）	歩掛適用年月	2026年 8月	
１６）	前請負工事費	0	
１７）	前請負代金額	0	
１８）	調 整 区 分	0	
１９）	共通仮設費対象額		
２０）	現場管理費対象額		
２１）	一般管理費等対象額		
２２）	処 分 費 等	76,375	
２３）	公 告 日	令和 8年 7月17日	
２４）	入 札 締 切 日	年 月 日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ８般若沢第４床固改築工事	（当　初）	事業区分	砂防･地すべり対策
			工事区分	流路

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流路		式	1		146,608,576			
砂防土工		式	1		127,320			
残土処理工		式	1		127,320			
整地	残土受入れ地での処理	式	1		127,320			内-1号
床固め工		式	1		44,347,100			
作業土工		式	1		954,526			
床掘り(掘削(砂防))	土砂	式	1		625,990			内-2号
埋戻し	転圧無	式	1		47,736			内-3号
埋戻し	転圧有	式	1		280,800			内-4号
整形仕上げ工		式	1		34,020			
基礎面整形		m2	70	486	34,020			単-1号
床固め本体工		式	1		43,358,554			

設計内訳書

工事名	Ｒ８般若沢第４床固改築工事	（当　初）	事業区分	砂防･地すべり対策
			工事区分	流路

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
D種ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-5-40(高炉)	m3	734	35,760	26,247,840			単-2号
堤冠ｺﾝｸﾘｰﾄ A種	27-5-40(高炉)	m3	21	39,850	836,850			単-3号
堤冠ｺﾝｸﾘｰﾄ G種	鉄材ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	2	317,500	635,000			単-4号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ50×800mm	孔	959	3,463	3,321,017			単-5号
差筋	SD345 D25×1600mm	本	959	2,305	2,210,495			単-6号
ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ(既設腹付け面)		m2	470	1,502	705,940			単-7号
補強鉄筋	SD345 D16～25	t	0.13	313,900	40,807			単-8号
残存滑面型枠		m2	320	15,710	5,027,200			単-9号
残存型枠		m2	210	15,120	3,175,200			単-10号
型枠		式	1		486,240			内-5号
足場		式	1		671,965			内-6号
構造物撤去工		式	1		1,031,122			

設計内訳書

工事名	Ｒ８般若沢第４床固改築工事	（当　初）	事業区分	砂防･地すべり対策
			工事区分	流路

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1		533,820			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	62	8,610	533,820			単-11号
運搬処理工		式	1		497,302			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	62	6,846	424,452			単-12号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	62	1,175	72,850			単-13号
仮設工		式	1		101,103,034			
工事用道路工		式	1		3,614,716			
仮道路		式	1		2,060,896			内-7号
道路補修		式	1		1,553,820			内-8号
資材運搬設備工		式	1		72,075,034			
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備	Aﾗｲﾝ	式	1		46,323,770			内-9号
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備	Bﾗｲﾝ	式	1		11,122,103			内-10号

設計内訳書

工事名	Ｒ８般若沢第４床固改築工事	（当　初）	事業区分	砂防･地すべり対策
			工事区分	流路

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運搬	Aﾗｲﾝ	式	1		2,637,801			内-11号
作業構台		式	1		11,991,360			内-12号
人員輸送工		式	1		21,898,620			
ﾓﾉﾚｰﾙ		式	1		21,898,620			内-13号
通路工		式	1		1,912,520			
人道足場		式	1		1,912,520			内-14号
砂防仮締切工		式	1		657,744			
土砂締切		式	1		261,528			内-15号
大型土のう締切		式	1		396,216			内-16号
仮水路工		式	1		489,400			
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ		式	1		489,400			内-17号
交通管理工		式	1		455,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ８般若沢第４床固改築工事	（当　初）	事業区分	砂防･地すべり対策
			工事区分	流路

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		式	1		455,000			内-18号
直接工事費		式	1		146,608,576			
共通仮設費		式	1		21,521,151			
共通仮設費		式	1		11,112,151			
運搬費		式	1		9,738,231			
重建設機械分解組立費		式	1		8,936,000			内-19号
機材運搬		式	1		554,803			内-20号
仮設材運搬費		式	1		247,428			内-21号
安全費		式	1		304,920			
落石防護ﾈｯﾄ		式	1		304,920			内-22号
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,069,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		10,409,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ８般若沢第４床固改築工事	（当　初）	事業区分	砂防･地すべり対策
			工事区分	流路

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		168,129,727			
現場管理費		式	1		40,149,000			
工事原価		式	1		208,278,727			
一般管理費等		式	1		34,801,273			
工事価格		式	1		243,080,000			
消費税相当額		式	1		24,308,000			
工事費計		式	1		267,388,000			

一式当たり内訳書

整地

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地工	残土受入れ地での処理	m３	400	318.3	127,320			
合　計					127,320			

一式当たり内訳書

床掘り(掘削(砂防))

第　2号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（砂防）	土砂	m３	590	1,061	625,990			
合　計					625,990			

一式当たり内訳書

埋戻し

第　3号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込工(ﾙｰｽﾞ)(砂防)	土砂	m３	90	530.4	47,736			
合　計					47,736			

一式当たり内訳書

埋戻し

第　4号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻し幅1m以上4m未満	m３	90	3,120	280,800			
合　計					280,800			

一式当たり内訳書

型枠

第　5号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工（ケーブルクレーン（両端固定式））		m２	48	10,130	486,240			
合　計					486,240			

一式当たり内訳書

足場

第　6号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【残存型枠部】								
足場（キャットウォーク）設置・撤去		m	73	4,877	356,021			
天端手摺設置・撤去		m	176	1,624	285,824			
【一般型枠部】								
足場設置・撤去［砂防］		m	10	3,012	30,120			
合　計					671,965			

一式当たり内訳書

仮道路

第　7号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（砂防）	土砂	m３	210	1,061	222,810			
路体（築堤）盛土	2.5m未満	m３	70	3,304	231,280			
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	m３	30	2,754	82,620			
大型土のう工	製作	袋	153	7,527	1,151,631			
大型土のう=長期仮設（3年）対応；								
大型土のう工	設置	袋	153	2,435	372,555			
合　計					2,060,896			

一式当たり内訳書

道路補修

第　8号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路補修工	0～1000m未満 道路幅員4m 未舗装 利用率100%	回	19	81,780	1,553,820			
合　計					1,553,820			

一式当たり内訳書

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備

第　9号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ(両端固定式)基礎･据付･解体(中間支柱有)	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動式 2.9t ｽﾊﾟﾝ500m ｳｲﾝﾁﾍﾞｰｽ3m3	基	1	25,610,000	25,610,000			
ｳｲﾝﾁ小屋設置･撤去工		基	1	127,000	127,000			
支柱設備設置･撤去工	12mを超え16m以下	基	1	5,528,000	5,528,000			
門型支柱設備設置･撤去工	12mを超え16m以下	基	1	5,528,000	5,528,000			
支柱設備設置･撤去工	8mを超え12m以下	基	1	3,750,000	3,750,000			
ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ･ｳｲﾝﾁﾍﾞｰｽ材料費(ｺﾝｸﾘｰﾄ,合板,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ)	18-8-40(高炉)	ｍ３	77	28,010	2,156,770			
ワイヤーロープ損耗費	23.8ヶ月,主索531m,巻上索1041m,横行索1302m	式	1		3,624,000			
合　計					46,323,770			

一式当たり内訳書

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備

第　10号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ(両端固定式)基礎･据付･解体工	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動式 2.9t ｽﾊﾟﾝ172m ｳｲﾝﾁﾍﾞｰｽ3m3	基	1	8,537,000	8,537,000			
ｳｲﾝﾁ小屋設置･撤去工		基	1	127,000	127,000			
支柱設備設置･撤去工	4mを超え8m以下	基	2	954,600	1,909,200			
ｳｲﾝﾁﾍﾞｰｽ材料費	18-8-40(高炉)	ｍ３	3	26,200	78,600			
ワイヤーロープ損耗費	5.0ヶ月,主索183m,巻上索345m,横行索431m	式	1		339,800			
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	3	35,480	106,440			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 49.4km以下 全ての費用	ｍ３	3	6,846	20,538			
処分費（ｍ３）		ｍ３	3	1,175	3,525			
合　計					11,122,103			

一式当たり内訳書

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運搬

第　11号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【コンクリート運搬】								
コンクリート投入（ケーブルクレーン両端固定式）	無 各種 有 304m 55m 58m	ｍ３	757	1,992	1,507,944			
【コンクリート殻運搬】								
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運搬工（土砂等）	横行距離　平均L=304m	ｍ３	62	14,060	871,720			
【型枠材等運搬】								
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運搬工（鋼材等）	横行距離　平均L=304m	ｔ	46.9	5,504	258,137			
合　計					2,637,801			

一式当たり内訳書

作業構台

第　12号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業構台設置･撤去	ｼｽﾃﾑ足場	空ｍ３	470	5,088	2,391,360			
作業構台賃料	13.2ヶ月	式	1		9,600,000			
合　計					11,991,360			

一式当たり内訳書

モノレール
第　13号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人員輸送ﾓﾉﾚｰﾙ　ﾙｰﾄ設定工	500kg/45°,単軌条ﾚｰﾙ,L=410m	回	1	55,420	55,420			
人員輸送ﾓﾉﾚｰﾙ　軌条設置工	500kg/45°,単軌条ﾚｰﾙ	m	410	7,032	2,883,120			
人員輸送ﾓﾉﾚｰﾙ　軌条撤去工	500kg/45°,単軌条ﾚｰﾙ	m	410	3,012	1,234,920			
人員輸送ﾓﾉﾚｰﾙ　保守点検工（軌条）	500kg/45°,単軌条ﾚｰﾙ,L=410m,定期点検1回/月	回	17	74,980	1,274,660			
人員輸送ﾓﾉﾚｰﾙ　保守点検工（動力車･乗用台車）	500kg/45°,乗用台車(5人乗り),定期点検1回/月	回	15	33,260	498,900			
ﾓﾉﾚｰﾙ賃料（１年目）	動力車+乗用台車,1ヶ月以内	式	1		724,000			
ﾓﾉﾚｰﾙ返納整備費（１年目）	動力車+乗用台車,1ヶ月以内	式	1		72,400			
ﾓﾉﾚｰﾙ賃料（２年目）	動力車+乗用台車,9ヶ月以内	式	1		2,830,000			
ﾓﾉﾚｰﾙ返納整備費（２年目）	動力車+乗用台車,9ヶ月以内	式	1		283,000			
ﾓﾉﾚｰﾙ賃料（３年目）	動力車+乗用台車,8ヶ月以内	式	1		2,640,000			
ﾓﾉﾚｰﾙ返納整備費（３年目）	動力車+乗用台車,8ヶ月以内	式	1		264,000			
ﾓﾉﾚｰﾙ賃料	単軌条ﾚｰﾙ,26ヶ月以内	m	410	20,000	8,200,000			

一式当たり内訳書

モノレール
第　13号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モノレール返納整備費	単軌条ﾚｰﾙ,26ヶ月以内	m	410	2,000	820,000			
ガソリン	レギュラー	L	788	150	118,200			
合　計					21,898,620			

一式当たり内訳書

人道足場

第　14号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人道足場設置･撤去	W=450mm	m	15	2,168	32,520			
人道足場賃料	23.8ヶ月	式	1		1,880,000			
合　計					1,912,520			

一式当たり内訳書

土砂締切

第　15号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防土砂仮締切工	設置　地山（土砂）	ｍ３	170	1,061	180,370			
砂防土砂仮締切工	撤去　地山（土砂）	ｍ３	170	477.4	81,158			
合　計					261,528			

一式当たり内訳書

大型土のう締切

第　16号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作	袋	32	7,527	240,864			
大型土のう=長期仮設（3年）対応；								
大型土のう工	設置	袋	32	2,435	77,920			
大型土のう工	撤去	袋	32	1,221	39,072			
遮水シート	t=0.5㎜	ｍ２	56	685	38,360			
合　計					396,216			

一式当たり内訳書

ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ

第　17号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コルゲートパイプ	据付･撤去 ﾌﾗﾝｼﾞ型 800以上1200以下 全ての費用	m	20	14,560	291,200			
コルゲートパイプ損料	1形　Φ1200　t=2.0mm　損率30%（1年未満）	m	20	9,910	198,200			
合　計					489,400			

一式当たり内訳書

交通誘導警備員

第　18号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	26	17,500	455,000			
合　計					455,000			

一式当たり内訳書

重建設機械分解組立費

第　19号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設機械分解･組立工	0.5m3級ﾊﾞｯｸﾎｳ　ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ2.9t吊	台	4	1,117,000	4,468,000			
建設機械分解･組立工	4.9t吊ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ　ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ2.9t吊	台	4	1,117,000	4,468,000			
合　計					8,936,000			

一式当たり内訳書

機材運搬

第　20号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運搬工（鋼材等）	横行距離　平均L=304m	t	100.8	5,504	554,803			
合　計					554,803			

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第　21号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･関東･北陸･中部 52.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	34.8	5,610	195,228			
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	34.8	1,500	52,200			
合　計					247,428			

一式当たり内訳書

落石防護ﾈｯﾄ

第　22号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落石防止網(繊維網)設置	ﾈｯﾄ(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ37.5×37.5)	m２	150	1,401	210,150			
落石防止網(繊維網)撤去	ﾈｯﾄ(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ37.5×37.5)	m２	150	631.8	94,770			
合　計					304,920			

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	基礎面整形		単位	m2	数量	1	単価	486

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	486	486	
計					486	
単価					486	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	D種ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-5-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	35,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート投入（ケーブルクレーン両端固定式）	24-5-40(高炉) 横行距離27m 巻上高35m 巻下高41m	ｍ３	1	30,760	30,760	
コンクリート締固め･打継面清掃	50m3/日未満	ｍ３	1	4,373	4,373	
コンクリート養生	散水養生	ｍ３	1	619.6	619.6	
計					35,752.6	
単価					35,760	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	堤冠ｺﾝｸﾘｰﾄ A種	27-5-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	39,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート投入（ケーブルクレーン両端固定式）	無 各種 有 27m 35m 41m	ｍ３	1	30,460	30,460	
堤冠コンクリート締固め	富配合30(m3/ﾌﾞﾛｯｸ)未満	ｍ３	1	6,344	6,344	
堤冠コンクリート養生	散水養生	ｍ３	1	3,039	3,039	
計					39,843	
単価					39,850	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	堤冠ｺﾝｸﾘｰﾄ G種	鉄材ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	317,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート投入（ケーブルクレーン両端固定式）	無 各種 有 27m 35m 41m	ｍ３	1	1,441	1,441	
G種コンクリート		ｍ３	1.04	245,300	255,112	
堤冠コンクリート締固め	鉄材3(m3/ﾌﾞﾛｯｸ)未満	ｍ３	1	57,810	57,810	
堤冠コンクリート養生	散水養生	ｍ３	1	3,039	3,039	
計					317,402	
単価					317,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ50×800mm	単位	孔	数量	1	単価	3,463

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（さく岩機）	800mm以上1000mm未満	孔	1	3,463	3,463	
計					3,463	
単価					3,463	円／孔

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	差筋	SD345 D25×1600mm	単位	本	数量	1,000	単価	2,305

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25	t	6.37	298,300	1,900,171	
グラウト注入（アンカー）		m３	1.17	345,500	404,235	
計					2,304,406	
単価					2,305	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ（既設腹付け面）		単位	m2	数量	1	単価	1,502

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チッピング工（既設腹付け面）		ｍ２	1	1,502	1,502	
計					1,502	
単価					1,502	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	補強鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	313,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	313,900	313,900	
計					313,900	
単価					313,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	残存滑面型枠		単位	m2	数量	1	単価	15,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠工（ケーブルクレーン（両端固定式））		ｍ２	1	15,710	15,710	
計					15,710	
単価					15,710	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	15,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠工（ケーブルクレーン（両端固定式））		ｍ２	1	15,120	15,120	
計					15,120	
単価					15,120	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	8,610	8,610	
計					8,610	
単価					8,610	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	6,846

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 49.4km以下 全ての費用	ｍ３	1	6,846	6,846	
計					6,846	
単価					6,846	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,175

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	1,175	1,175	
計					1,175	
単価					1,175	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	整地工	残土受入れ地での処理	単位	ｍ３	数量	100	単価	318.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3 平積0.4m3 排対2次	日	0.6	53,040	31,824	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					31,830	
単価					318.3	円／ｍ３

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	掘削（砂防）	土砂	単位	ｍ３	数量	100	単価	1,061

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3 平積0.4m3 排対2次	日	2	53,040	106,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					106,100	
単価					1,061	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	積込工(ﾙｰｽﾞ)(砂防)	土砂	単位	ｍ３	数量	100	単価	530.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3 平積0.4m3 排対2次	日	1	53,040	53,040	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					53,040	
単価					530.4	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	埋戻し	最大埋戻し幅1m以上4m未満	単位	ｍ３	数量	100	単価	3,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	4	24,300	97,200	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3 平積0.4m3 排対2次	時間	10	9,106	91,060	
振動ﾛｰﾗ(舗装用)運転	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 質量0.8~1.1t	時間	10	6,541	65,410	
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ運転	質量60~80kg	日	2	29,160	58,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					312,000	
単価					3,120	円／ｍ３

参考資料（1）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート投入（ケーブルクレーン両端固定式）	24-5-40(高炉) 横行距離27m 巻上高35m 巻下高41m	単位	ｍ３	数量	100	単価	30,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	24-5-40(高炉) W/C60%以下	ｍ３	104	23,400	2,433,600	
生コンクリート割増額		ｍ３	104	3,600	374,400	
コンクリート投入（ケーブルクレーン両端固定式）		時間	15	17,830	267,450	
諸雑費（まるめ）		式	1		550	
計					3,076,000	
単価					30,760	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート締固め･打継面清掃	50m3/日未満	単位	ｍ３	数量	10	単価	4,373

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	32,600	8,150	
特殊作業員		人	0.5	27,500	13,750	
普通作業員		人	0.75	24,300	18,225	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		3,605	
計					43,730	
単価					4,373	円／ｍ３

参考資料（1）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート養生	散水養生	単位	m３	数量	10	単価	619.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.25	24,300	6,075	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		121	
計					6,196	
単価					619.6	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート投入（ケーブルクレーン両端固定式）	無 各種 有 27m 35m 41m	単位	ｍ３	数量	100	単価	30,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	27-5-40(高炉) W/C50%以下	ｍ３	104	24,300	2,527,200	
生コンクリート割増額		ｍ３	104	3,600	374,400	
コンクリート投入（ケーブルクレーン両端固定式）		時間	9.202	15,650	144,011	
諸雑費（まるめ）		式	1		389	
計					3,046,000	
単価					30,460	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	堤冠コンクリート締固め	富配合30(m3/ﾌﾞﾛｯｸ)未満	単位	ｍ３	数量	10	単価	6,344

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	32,600	9,780	
特殊作業員		人	1.3	27,500	35,750	
普通作業員		人	0.5	24,300	12,150	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		5,760	
計					63,440	
単価					6,344	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	堤冠コンクリート養生	散水養生	単位	ｍ３	数量	10	単価	3,039

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.9	24,300	21,870	
諸雑費（率＋まるめ） 39%		式	1		8,520	
計					30,390	
単価					3,039	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート投入（ケーブルクレーン両端固定式）	無 各種 有 27m 35m 41m	単位	ｍ３	数量	100	単価	1,441

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	（材料費別途計上）	ｍ３	104	0	0	
生コンクリート割増額	（材料費別途計上）	ｍ３	104	0	0	
コンクリート投入（ケーブルクレーン両端固定式）		時間	9.202	15,650	144,011	
諸雑費（まるめ）		式	1		89	
計					144,100	
単価					1,441	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	G種コンクリート		単位	ｍ３	数量	1	単価	245,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G種コンクリート材料費		ｍ３	1	82,010	82,010	
コンクリートミキサ混合		ｍ３	1	163,200	163,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					245,300	
単価					245,300	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	堤冠コンクリート締固め	鉄材3(m3/ﾌﾞﾛｯｸ)未満	単位	ｍ３	数量	10	単価	57,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.3	32,600	107,580	
特殊作業員		人	5.7	27,500	156,750	
普通作業員		人	12	24,300	291,600	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		22,170	
計					578,100	
単価					57,810	円／ｍ３

参考資料（1）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	298,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D16～D25 標準	t	1	190,400	190,400	
鉄筋工　組立	差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25	t	1	107,900	107,900	
計					298,300	
単価					298,300	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	チッピング工（既設腹付け面）		単位	ｍ２	数量	100	単価	1,502

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.66	32,600	21,516	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3 排対2次 油圧式 600~800kg級	日	2	64,340	128,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					150,200	
単価					1,502	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	313,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D16～D25 標準	t	1	190,400	190,400	
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	123,500	123,500	
計					313,900	
単価					313,900	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	残存型枠工（ケーブルクレーン（両端固定式））		単位	ｍ２	数量	100	単価	15,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.86	32,600	60,636	
型わく工		人	5.83	31,800	185,394	
溶接工		人	3.14	37,300	117,122	
特殊作業員		人	1.86	27,500	51,150	
普通作業員		人	7.46	24,300	181,278	
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転(残存型枠､基礎･据付･解体)	両端固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動(簡易ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ)定格荷重2.9t	日	1.86	50,910	94,692	
残存滑面型枠	組立部材含む	ｍ２	106	7,250	768,500	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		112,228	
計					1,571,000	
単価					15,710	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	残存型枠工（ケーブルクレーン（両端固定式））		単位	ｍ２	数量	100	単価	15,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.86	32,600	60,636	
型わく工		人	5.83	31,800	185,394	
溶接工		人	3.14	37,300	117,122	
特殊作業員		人	1.86	27,500	51,150	
普通作業員		人	7.46	24,300	181,278	
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転(残存型枠､基礎･据付･解体)	両端固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動(簡易ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ)定格荷重2.9t	日	1.86	50,910	94,692	
残存型枠	組立部材含む	ｍ２	106	6,690	709,140	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		112,588	
計					1,512,000	
単価					15,120	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	型枠工（ケーブルクレーン（両端固定式））		単位	ｍ２	数量	100	単価	10,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	32,600	65,200	
型わく工		人	13	31,800	413,400	
普通作業員		人	13	24,300	315,900	
ケーブルクレーン（両端固定式）運転	3.0h/日（型枠小運搬）	日	2	73,610	147,220	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		71,280	
計					1,013,000	
単価					10,130	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場（キャットウォーク）設置・撤去		単位	m	数量	100	単価	4,877

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.7	32,600	88,020	
とび工		人	6.2	29,800	184,760	
普通作業員		人	5.5	24,300	133,650	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		81,270	
計					487,700	
単価					4,877	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	天端手摺設置・撤去		単位	m	数量	100	単価	1,624

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	32,600	29,340	
とび工		人	3.2	29,800	95,360	
普通作業員		人	1	24,300	24,300	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		13,400	
計					162,400	
単価					1,624	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場設置・撤去［砂防］		単位	m	数量	10	単価	3,012

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	32,600	3,260	
とび工		人	0.4	29,800	11,920	
普通作業員		人	0.4	24,300	9,720	
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		5,220	
計					30,120	
単価					3,012	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	8,610	8,610	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,610	
単価					8,610	円／ｍ３

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	1,175

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	コンクリート殻（無筋）	ｍ３	100	1,175	117,500	
計					117,500	
単価					1,175	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	掘削（砂防）	土砂	単位	ｍ３	数量	100	単価	1,061

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3 平積0.4m3 排対2次	日	2	53,040	106,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					106,100	
単価					1,061	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路体（築堤）盛土	2.5m未満	単位	ｍ３	数量	100	単価	3,304

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	3	24,300	72,900	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3 平積0.4m3 排対2次	日	3	53,040	159,120	
振動ﾛｰﾗ(舗装用)運転	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 質量0.8~1.1t	日	3	32,790	98,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					330,400	
単価					3,304	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	ｍ３	数量	100	単価	2,754

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.5	24,300	60,750	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3 平積0.4m3 排対2次	日	2.5	53,040	132,600	
振動ﾛｰﾗ(舗装用)運転	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 質量0.8~1.1t	日	2.5	32,790	81,975	
諸雑費（まるめ）		式	1		75	
計					275,400	
単価					2,754	円／ｍ３

参考資料（1）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作	単位	袋	数量	10	単価	7,527

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.17	32,600	5,542	
特殊作業員		人	0.17	27,500	4,675	
普通作業員		人	0.17	24,300	4,131	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊 排対2次	日	0.17	50,730	8,624	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3 平積0.4m3 排対2次	日	0.17	53,040	9,016	
大型土のう袋材	丸型 φ110×110 長期仮設対応3年	袋	10	4,300	43,000	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		282	
計					75,270	
単価					7,527	円／袋

参考資料（1）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	設置	単位	袋	数量	10	単価	2,435

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.18	32,600	5,868	
特殊作業員		人	0.18	27,500	4,950	
普通作業員		人	0.18	24,300	4,374	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊 排対2次	日	0.18	50,730	9,131	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		27	
計					24,350	
単価					2,435	円／袋

参考資料（1）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路補修工	0～1000m未満 道路幅員4m 未舗装 利用率100%	単位	回	数量	1	単価	81,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路補修	0～1000m未満 道路幅員4m 未舗装 利用率100%	m	150	545.2	81,780	
計					81,780	
単価					81,780	円／回

参考資料（1）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ(両端固定式)基礎･据付･解体(中間支柱有)	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動式 2.9t ｽﾊﾟﾝ500m ｳｲﾝﾁﾍﾞｰｽ3m3	単位	基	数量	1	単価	25,610,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	75	32,600	2,445,000	
型わく工		人	3	31,800	95,400	
とび工		人	267	29,800	7,956,600	
特殊作業員		人	45	27,500	1,237,500	
普通作業員		人	276	24,300	6,706,800	
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転(残存型枠､基礎･据付･解体)	両端固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動(簡易ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ)定格荷重2.9t	日	57	50,910	2,901,870	
諸雑費 （率＋まるめ） 20%		式	1		4,266,830	
計					25,610,000	
単価					25,610,000	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｳｲﾝﾁ小屋設置･撤去工		単位	基	数量	1	単価	127,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工		人	1.5	29,800	44,700	
普通作業員		人	3	24,300	72,900	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		9,400	
計					127,000	
単価					127,000	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	支柱設備設置･撤去工	12mを超え16m以下	単位	基	数量	1	単価	5,528,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	6	32,600	195,600	
とび工		人	18	29,800	536,400	
普通作業員		人	6	24,300	145,800	
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転（支柱設備設置･撤去）	両端固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動(簡易ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ) 定格荷重2.9t	日	6	106,000	636,000	
支柱損料	23.8ヶ月	t	4.68	841,000	3,935,880	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		78,320	
計					5,528,000	
単価					5,528,000	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	門型支柱設備設置･撤去工	12mを超え16m以下	単位	基	数量	1	単価	5,528,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	6	32,600	195,600	
とび工		人	18	29,800	536,400	
普通作業員		人	6	24,300	145,800	
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転（支柱設備設置･撤去）	両端固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動(簡易ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ) 定格荷重2.9t	日	6	106,000	636,000	
支柱損料	23.8ヶ月	t	4.68	841,000	3,935,880	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		78,320	
計					5,528,000	
単価					5,528,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	支柱設備設置･撤去工	8mを超え12m以下	単位	基	数量	1	単価	3,750,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4	32,600	130,400	
とび工		人	14	29,800	417,200	
普通作業員		人	4	24,300	97,200	
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転（支柱設備設置･撤去）	両端固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動(簡易ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ) 定格荷重2.9t	日	4	106,000	424,000	
支柱損料	23.8ヶ月	t	3.12	841,000	2,623,920	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		57,280	
計					3,750,000	
単価					3,750,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ･ｳｲﾝﾁﾍﾞｰｽ材料費(ｺﾝｸﾘｰﾄ,合板,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ)	18-8-40(高炉)	単位	ｍ３	数量	77	単価	28,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	18-8-40(高炉) W/C指定なし 山岳地補正込み	ｍ３	77	26,200	2,017,400	
型枠用合板	ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　１２×９００×１８００	枚	44	1,850	81,400	
構造用丸鋼	ＳＳ４００　径３８	t	0.044	154,000	6,776	
一般構造用棒鋼	ＳＳ４００　径７０	t	0.316	162,000	51,192	
諸雑費（まるめ）		式	1		232	
計					2,157,000	
単価					28,010	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ワイヤーロープ損耗費	23.8ヶ月，主索531m，巻上索1041m，横行索1302m	単位	式	数量	1	単価	3,624,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主索（ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ）	6×7　径50mm　A種　損率0.4	m	531	2,620	1,391,220	
巻上索（ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ）	6×19　径18mm　A種　損率1.0	m	1,041	781	813,021	
横行策	6×19　径22mm　A種　損率1.0	m	1,302	1,090	1,419,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		579	
計					3,624,000	
単価					3,624,000	円／式

参考資料（1）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ(両端固定式)基礎･据付･解体工	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動式 2.9t ｽﾊﾟﾝ172m ｳｲﾝﾁﾍﾞｰｽ3m3	単位	基	数量	1	単価	8,537,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	25	32,600	815,000	
型わく工		人	1	31,800	31,800	
とび工		人	89	29,800	2,652,200	
特殊作業員		人	15	27,500	412,500	
普通作業員		人	92	24,300	2,235,600	
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転(残存型枠､基礎･据付･解体)	両端固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動(簡易ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ)定格荷重2.9t	日	19	50,910	967,290	
諸雑費 （率＋まるめ） 20%		式	1		1,422,610	
計					8,537,000	
単価					8,537,000	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	支柱設備設置･撤去工	4mを超え8m以下	単位	基	数量	1	単価	954,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3	32,600	97,800	
とび工		人	8	29,800	238,400	
普通作業員		人	3	24,300	72,900	
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転（支柱設備設置･撤去）	両端固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動(簡易ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ) 定格荷重2.9t	日	3	106,000	318,000	
支柱損料	5.0ヶ月	t	1.09	175,000	190,750	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		36,750	
計					954,600	
単価					954,600	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｳｲﾝﾁﾍﾞｰｽ材料費	18-8-40(高炉)	単位	ｍ３	数量	1	単価	26,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	18-8-40(高炉) W/C指定なし 山岳地補正込み	ｍ３	1	26,200	26,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					26,200	
単価					26,200	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ワイヤーロープ損耗費	5.0ヶ月，主索183m，巻上索345m，横行索431m	単位	式	数量	1	単価	339,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主索（ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ））	6×7　径42mm　A種　損率0.19	m	183	822	150,426	
巻上索（ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ）	6×19　径14mm　A種　損率0.47	m	345	244	84,180	
横行策（ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ）	6×19　径14mm　A種　損率0.47	m	431	244	105,164	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					339,800	
単価					339,800	円／式

参考資料（1）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m３	数量	1	単価	35,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m３	1	35,475	35,475	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					35,480	
単価					35,480	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート投入（ケーブルクレーン両端固定式）	無 各種 有 304m 55m 58m	単位	ｍ３	数量	100	単価	1,992

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	（材料費別途計上）	ｍ３	104	0	0	
生コンクリート割増額	（材料費別途計上）	ｍ３	104	0	0	
コンクリート投入（ケーブルクレーン両端固定式）		時間	12.726	15,650	199,161	
諸雑費（まるめ）		式	1		39	
計					199,200	
単価					1,992	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運搬工（土砂等）	横行距離　平均L=304m	単位	ｍ３	数量	1	単価	14,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転	両端固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動(簡易ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ) 定格荷重2.9t	時間	0.72	18,980	13,665	
コンクリートバケット	［両開ゴムシール付ローラゲート型］１．０ｍ３	日	0.21	1,840	386	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					14,060	
単価					14,060	円／ｍ３

参考資料（1）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運搬工（鋼材等）	横行距離　平均L=304m	単位	t	数量	1	単価	5,504

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転	両端固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動(簡易ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ) 定格荷重2.9t	時間	0.29	18,980	5,504	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,504	
単価					5,504	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	作業構台設置･撤去	ｼｽﾃﾑ足場	単位	空ｍ３	数量	100	単価	5,088

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	32,600	81,500	
とび工		人	7	29,800	208,600	
普通作業員		人	9	24,300	218,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					508,800	
単価					5,088	円／空ｍ３

参考資料（1）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人員輸送ﾓﾉﾚｰﾙ　ﾙｰﾄ設定工	500kg/45°，単軌条ﾚｰﾙ,L=410m	単位	回	数量	1	単価	55,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7	32,600	55,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					55,420	
単価					55,420	円／回

参考資料（1）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人員輸送ﾓﾉﾚｰﾙ　軌条設置工	500kg/45°，単軌条ﾚｰﾙ	単位	m	数量	100	単価	7,032

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.14	32,600	134,964	
山林砂防工		人	13.67	33,000	451,110	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		117,126	
計					703,200	
単価					7,032	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人員輸送ﾓﾉﾚｰﾙ　軌条撤去工	500kg/45°，単軌条ﾚｰﾙ	単位	m	数量	100	単価	3,012

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.77	32,600	57,702	
山林砂防工		人	5.86	33,000	193,380	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		50,118	
計					301,200	
単価					3,012	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人員輸送ﾓﾉﾚｰﾙ　保守点検工（軌条）	500kg/45°，単軌条ﾚｰﾙ,L=410m,定期点検1回/月	単位	回	数量	1	単価	74,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.3	32,600	74,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					74,980	
単価					74,980	円／回

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人員輸送ﾓﾉﾚｰﾙ　保守点検工（動力車･乗用台車）	500kg/45°，乗用台車(5人乗り),定期点検1回/月	単位	回	数量	1	単価	33,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.02	32,600	33,252	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					33,260	
単価					33,260	円／回

参考資料（1）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人道足場設置･撤去	W=450mm	単位	m	数量	10	単価	2,168

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	32,600	8,150	
とび工		人	0.25	29,800	7,450	
普通作業員		人	0.25	24,300	6,075	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					21,680	
単価					2,168	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	砂防土砂仮締切工	設置　地山（土砂）	単位	ｍ３	数量	100	単価	1,061

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3 平積0.4m3 排対2次	日	2	53,040	106,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					106,100	
単価					1,061	円／ｍ３

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	砂防土砂仮締切工	撤去　地山（土砂）	単位	ｍ３	数量	100	単価	477.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3 平積0.4m3 排対2次	日	0.9	53,040	47,736	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					47,740	
単価					477.4	円／ｍ３

参考資料（1）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作	単位	袋	数量	10	単価	7,527

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.17	32,600	5,542	
特殊作業員		人	0.17	27,500	4,675	
普通作業員		人	0.17	24,300	4,131	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊 排対2次	日	0.17	50,730	8,624	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3 平積0.4m3 排対2次	日	0.17	53,040	9,016	
大型土のう袋材	丸型 φ110×110 長期仮設対応3年	袋	10	4,300	43,000	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		282	
計					75,270	
単価					7,527	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	設置	単位	袋	数量	10	単価	2,435

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.18	32,600	5,868	
特殊作業員		人	0.18	27,500	4,950	
普通作業員		人	0.18	24,300	4,374	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊 排対2次	日	0.18	50,730	9,131	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		27	
計					24,350	
単価					2,435	円／袋

参考資料（1）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去	単位	袋	数量	10	単価	1,221

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	32,600	3,586	
特殊作業員		人	0.11	27,500	3,025	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊 排対2次	日	0.11	50,730	5,580	
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	1		19	
計					12,210	
単価					1,221	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	17,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	17,500	17,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,500	
単価					17,500	円／人日

参考資料（1）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	建設機械分解･組立工	0.5m3級ﾊﾞｯｸﾎｳ　ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ2.9t吊	単位	台	数量	1	単価	1,117,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械工		人	4	37,300	149,200	
特殊作業員		人	12	27,500	330,000	
普通作業員		人	8	24,300	194,400	
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転		日	4	52,010	208,040	
諸雑費（率＋まるめ） 35%		式	1		235,360	
計					1,117,000	
単価					1,117,000	円／台

参考資料（1）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	建設機械分解・組立工	4.9t吊ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ　ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ2.9t吊	単位	台	数量	1	単価	1,117,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械工		人	4	37,300	149,200	
特殊作業員		人	12	27,500	330,000	
普通作業員		人	8	24,300	194,400	
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転		日	4	52,010	208,040	
諸雑費（率＋まるめ） 35%		式	1		235,360	
計					1,117,000	
単価					1,117,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運搬工（鋼材等）	横行距離　平均L=304m	単位	t	数量	1	単価	5,504

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転	両端固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動(簡易ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ) 定格荷重2.9t	時間	0.29	18,980	5,504	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,504	
単価					5,504	円／ｔ

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･関東･北陸･中部 52.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 60kmまで	t	1	5,610	5,610	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,610	
単価					5,610	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	落石防止網(繊維網)設置	ﾈｯﾄ(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ37.5×37.5)	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,401

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	5.2	24,300	126,360	
落石防止網	繊維ﾈｯﾄ　網目37.5㎜　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ　損率30%	ｍ２	101.3	135	13,675	
諸雑費（まるめ）		式	1		65	
計					140,100	
単価					1,401	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	落石防止網(繊維網)撤去	ﾈｯﾄ(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ37.5×37.5)	単位	ｍ２	数量	100	単価	631.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.6	24,300	63,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					63,180	
単価					631.8	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3 平積0.4m3 排対2次	単位	日	数量	1	単価	53,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,900	27,900	
軽油		L	53	146	7,738	
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次）　バケット容量０．５ｍ３	供用日	1.5	11,600	17,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					53,040	
単価					53,040	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3 平積0.4m3 排対2次	単位	日	数量	1	単価	53,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,900	27,900	
軽油		L	53	146	7,738	
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次）　バケット容量０．５ｍ３	供用日	1.5	11,600	17,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					53,040	
単価					53,040	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3 平積0.4m3 排対2次	単位	日	数量	1	単価	53,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,900	27,900	
軽油		L	53	146	7,738	
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次）　バケット容量０．５ｍ３	供用日	1.5	11,600	17,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					53,040	
単価					53,040	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3 平積0.4m3 排対2次	単位	時間	数量	1	単価	9,106

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	27,900	4,743	
軽油		L	9.2	146	1,343	
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次）　バケット容量０．５ｍ３	時間	1	3,020	3,020	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,106	
単価					9,106	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ﾛｰﾗ(舗装用)運転	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 質量0.8~1.1t	単位	時間	数量	1	単価	6,541

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2	27,500	5,500	
軽油		L	1.3	146	189	
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	時間	1	852	852	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,541	
単価					6,541	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ運転	質量60~80kg	単位	日	数量	1	単価	29,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	27,500	27,500	
ガソリン	レギュラー	L	4.6	150	690	
タンパ及びランマ［ランマ］	通称６０～８０ｋｇ級	供用日	1.33	723	961	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					29,160	
単価					29,160	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート投入（ケーブルクレーン両端固定式）		単位	時間	数量	1	単価	17,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.167	27,500	4,592	
普通作業員		人	0.167	24,300	4,058	
ケーブルクレーン（両端固定式）運転	6.0h/日 (ｺﾝｸﾘｰﾄ投入打設)	日	0.167	53,130	8,872	
コンクリートバケット	［両開ゴムシール付ローラゲート型］1.0m3	日	0.167	1,840	307	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					17,830	
単価					17,830	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート投入（ケーブルクレーン両端固定式）		単位	時間	数量	1	単価	15,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.145	27,500	3,987	
普通作業員		人	0.145	24,300	3,523	
ケーブルクレーン（両端固定式）運転	6.9h/日（ｺﾝｸﾘｰﾄ投入打設）	日	0.145	54,270	7,869	
コンクリートバケット	［両開ゴムシール付ローラゲート型］１．０ｍ３	日	0.145	1,840	266	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					15,650	
単価					15,650	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	G種コンクリート材料費		単位	ｍ３	数量	1	単価	82,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	t	0.313	29,000	9,077	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.451	4,970	2,241	
コンクリート用骨材　砂利	２５ｍｍ（洗い）	ｍ３	0.756	4,520	3,417	
コンクリート無収縮剤	ノンシュリンク（スタンダード）	ｋｇ	310	217	67,270	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					82,010	
単価					82,010	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリートミキサ混合		単位	ｍ３	数量	10	単価	163,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	10	27,500	275,000	
普通作業員		人	40	24,300	972,000	
コンクリートミキサ[簡易傾動型]	ﾓｰﾀ付　ﾄﾞﾗﾑ容量0.22m3	日	10	4,650	46,500	
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動　8kVA	日	10	2,743	27,430	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		311,070	
計					1,632,000	
単価					163,200	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工	SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	190,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	32,600	3,260	
鉄筋工		人	1.7	31,400	53,380	
普通作業員		人	0.2	24,300	4,860	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.04	53,200	2,128	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	ｔ	1.03	116,000	119,480	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		7,292	
計					190,400	
単価					190,400	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　組立	差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	107,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	32,600	13,040	
鉄筋工		人	2.8	31,400	87,920	
普通作業員		人	0.2	24,300	4,860	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		2,080	
計					107,900	
単価					107,900	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3 排対2次 油圧式 600~800kg級	単位	日	数量	1	単価	64,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,900	27,900	
軽油		L	53	146	7,738	
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次）　バケット容量０．５ｍ３	供用日	1.5	11,600	17,400	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］	通称６００～８００ｋｇ級	供用日	1.5	7,530	11,295	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					64,340	
単価					64,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	123,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	32,600	13,040	
鉄筋工		人	2.9	31,400	91,060	
普通作業員		人	0.2	24,300	4,860	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	53,200	5,852	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		8,688	
計					123,500	
単価					123,500	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転(残存型枠､基礎･据付･解体)	両端固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動(簡易ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ)定格荷重2.9t	単位	日	数量	1	単価	50,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	27,500	27,500	
軽油		L	37	146	5,402	
ケーブルクレーン	両端固定・ディーゼル駆動式　２．９ｔ	日	1	18,000	18,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					50,910	
単価					50,910	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ケーブルクレーン（両端固定式）運転	3.0h/日（型枠小運搬）	単位	日	数量	1	単価	73,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	27,500	27,500	
普通作業員		人	1	24,300	24,300	
軽油		L	26.1	146	3,810	
ケーブルクレーン	両端固定・ディーゼル駆動式　２．９ｔ	日	1	18,000	18,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					73,610	
単価					73,610	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3 平積0.4m3 排対2次	単位	日	数量	1	単価	53,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,900	27,900	
軽油		L	53	146	7,738	
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次）　バケット容量０．５ｍ３	供用日	1.5	11,600	17,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					53,040	
単価					53,040	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ﾛｰﾗ(舗装用)運転	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 質量0.8~1.1t	単位	日	数量	1	単価	32,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	27,500	27,500	
軽油		L	7	146	1,022	
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	供用日	1.5	2,840	4,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					32,790	
単価					32,790	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3 平積0.4m3 排対2次	単位	日	数量	1	単価	53,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,900	27,900	
軽油		L	53	146	7,738	
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次）　バケット容量０．５ｍ３	供用日	1.5	11,600	17,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					53,040	
単価					53,040	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ﾛｰﾗ(舗装用)運転	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 質量0.8~1.1t	単位	日	数量	1	単価	32,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	27,500	27,500	
軽油		L	7	146	1,022	
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	供用日	1.5	2,840	4,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					32,790	
単価					32,790	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊 排対2次	単位	日	数量	1	単価	50,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,900	27,900	
軽油		L	18	146	2,628	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ損料	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊 排対2次	供用日	1.27	15,900	20,193	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					50,730	
単価					50,730	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3 平積0.4m3 排対2次	単位	日	数量	1	単価	53,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,900	27,900	
軽油		L	53	146	7,738	
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次）　バケット容量０．５ｍ３	供用日	1.5	11,600	17,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					53,040	
単価					53,040	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊 排対2次	単位	日	数量	1	単価	50,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,900	27,900	
軽油		L	18	146	2,628	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ損料	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊 排対2次	供用日	1.27	15,900	20,193	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					50,730	
単価					50,730	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路補修	0～1000m未満 道路幅員4m 未舗装 利用率100%	単位	m	数量	100	単価	545.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.6	24,300	14,580	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3 平積0.6m3 排対2次	日	0.6	66,560	39,936	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					54,520	
単価					545.2	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転(残存型枠､基礎･据付･解体)	両端固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動(簡易ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ)定格荷重2.9t	単位	日	数量	1	単価	50,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	27,500	27,500	
軽油		L	37	146	5,402	
ケーブルクレーン	両端固定・ディーゼル駆動式　２．９ｔ	日	1	18,000	18,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					50,910	
単価					50,910	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転（支柱設備設置･撤去）	両端固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動(簡易ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ) 定格荷重2.9t	単位	日	数量	1	単価	106,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	3	27,500	82,500	
軽油		L	37	146	5,402	
ケーブルクレーン	両端固定・ディーゼル駆動式　２．９ｔ	日	1	18,000	18,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		98	
計					106,000	
単価					106,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転（支柱設備設置･撤去）	両端固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動(簡易ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ) 定格荷重2.9t	単位	日	数量	1	単価	106,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	3	27,500	82,500	
軽油		L	37	146	5,402	
ケーブルクレーン	両端固定・ディーゼル駆動式　２．９ｔ	日	1	18,000	18,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		98	
計					106,000	
単価					106,000	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転(残存型枠､基礎･据付･解体)	両端固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動(簡易ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ)定格荷重2.9t	単位	日	数量	1	単価	50,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	27,500	27,500	
軽油		L	37	146	5,402	
ケーブルクレーン	両端固定・ディーゼル駆動式　２．９ｔ	日	1	18,000	18,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					50,910	
単価					50,910	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転（支柱設備設置･撤去）	両端固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動(簡易ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ) 定格荷重2.9t	単位	日	数量	1	単価	106,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	3	27,500	82,500	
軽油		L	37	146	5,402	
ケーブルクレーン	両端固定・ディーゼル駆動式　２．９ｔ	日	1	18,000	18,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		98	
計					106,000	
単価					106,000	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転	両端固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動(簡易ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ) 定格荷重2.9t	単位	時間	数量	1	単価	18,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.29	27,500	7,975	
普通作業員		人	0.14	24,300	3,402	
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転(ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運搬)	両端固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動(簡易ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ) 定格荷重2.9t	日	0.14	54,260	7,596	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					18,980	
単価					18,980	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転	両端固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動(簡易ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ) 定格荷重2.9t	単位	時間	数量	1	単価	18,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.29	27,500	7,975	
普通作業員		人	0.14	24,300	3,402	
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転(ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運搬)	両端固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動(簡易ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ) 定格荷重2.9t	日	0.14	54,260	7,596	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					18,980	
単価					18,980	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3 平積0.4m3 排対2次	単位	日	数量	1	単価	53,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,900	27,900	
軽油		L	53	146	7,738	
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次）　バケット容量０．５ｍ３	供用日	1.5	11,600	17,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					53,040	
単価					53,040	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊 排対2次	単位	日	数量	1	単価	50,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,900	27,900	
軽油		L	18	146	2,628	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ損料	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊 排対2次	供用日	1.27	15,900	20,193	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					50,730	
単価					50,730	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転		単位	日	数量	1	単価	52,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	27,500	27,500	
軽油		L	44	146	6,424	
ケーブルクレーン	両端固定・ディーゼル駆動式　２．９ｔ	供用日	1.6	11,300	18,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					52,010	
単価					52,010	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ケーブルクレーン（両端固定式）運転	6.0h/日（ｺﾝｸﾘｰﾄ投入打設）	単位	日	数量	1	単価	53,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	27,500	27,500	
軽油		L	52.2	146	7,621	
ケーブルクレーン	両端固定・ディーゼル駆動式　２．９ｔ	日	1	18,000	18,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					53,130	
単価					53,130	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリートバケット	［両開ゴムシール付ローラゲート型］1.0m3	単位	日	数量	1	単価	1,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートバケット	［両開ゴムシール付ローラゲート型］１．０ｍ３	日	1	1,840	1,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,840	
単価					1,840	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ケーブルクレーン（両端固定式）運転	6.9h/日（ｺﾝｸﾘｰﾄ投入打設）	単位	日	数量	1	単価	54,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	27,500	27,500	
軽油		L	60.03	146	8,764	
ケーブルクレーン	両端固定・ディーゼル駆動式　２．９ｔ	日	1	18,000	18,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					54,270	
単価					54,270	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリートバケット	［両開ゴムシール付ローラゲート型］１．０ｍ３	単位	日	数量	1	単価	1,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートバケット	［両開ゴムシール付ローラゲート型］１．０ｍ３	日	1	1,840	1,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,840	
単価					1,840	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動　8kVA	単位	日	数量	1	単価	2,743

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	８ｋＶＡ	日	1	991	991	
軽油		L	12	146	1,752	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,743	
単価					2,743	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3 平積0.6m3 排対2次	単位	日	数量	1	単価	66,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,900	27,900	
軽油		L	87	146	12,702	
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次）　バケット容量０．８ｍ３	供用日	1.5	17,300	25,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					66,560	
単価					66,560	円／日

参考資料（3）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転(ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運搬)	両端固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動(簡易ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ) 定格荷重2.9t	単位	日	数量	1	単価	54,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	27,500	27,500	
軽油		L	60	146	8,760	
ケーブルクレーン	両端固定・ディーゼル駆動式　２．９ｔ	日	1	18,000	18,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					54,260	
単価					54,260	円／日

Ｒ８般若沢第４床固改築工事

（　当　　初　）　請負工事費計算書

(1)直接工事費	146,608,576		
(2)共通仮設費	21,521,151		
(3)純工事費 (1)+(2)	168,129,727		
(4)現場管理費	40,149,000		
(5)工期延長等に伴う現場維持等の費用	0	(16)工場製作純工事費	0
		(17)工場管理費	0
(6)工事原価 (3)+(4)+(5)+(18)	208,278,727	(18)工場製作原価 (16)+(17)	0
(7')一般管理費等(計上額)	34,801,273	((7)一般管理費等(計算額)	34,803,375)
(8')その他費目計	0		
(9)業務委託料等	0		
(10)工事価格 (6)+(7')+(8')+(9)（万円未満切り捨て）	243,080,000		

(11)消費税相当額	24,308,000
(12)請負工事価格 (10)+(11)	267,388,000
(13)入札書比較価格 (請負工事費の100/110)	243,080,000
(14)調査基準価格	243,507,000
(15)調査基準価格の100/110 (万円未満切り捨て)	221,370,000

共通仮設費

主たる工種

単独（追加工事）： 砂防・地すべり等工事　　合算工事： 0

対象工事費	146,608,576	直接工事費	146,608,576	準備費	0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	76,375	現工事	0	合算工事	0

非対象額計（－）	0	
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額）
対象額　支　給　品（＋）	0	
無償貸付機械評価額（＋）	0	

共通仮設費対象額

単独（追加工事）	146,608,576	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額	146,532,201		0		0

共通仮設費（率分）

率（補正前）	7.1 %		0 %
施工地域等補正	0 %	ICT施工補正	1
率（補正後）	7.1 %		
計上額	10,409,000		0

比較結果	当該追加工事	A			
	0	0		調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	146,532,201	直接工事費	146,608,576
非対象額計（－）	76,375		
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）	
管理費区分２，７	0	（工場原価）	
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分９	0	（間接費非対象額）	
管理費区分Ｔ	76,375	（直接工事費に含まれる処分費等）	
対象額　支　給　品（＋）	0		
無償貸付機械評価額（＋）	0		
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）			
単独（追加工事）	146,532,201	現工事	0
		合算工事	0

現場環境改善費							
率（補正前）	0.73	%		0	%	0	%
施工地域等補正	市街地以外						
率（補正後）	0.73	%					
計上額	1,069,000			0		0	

比較結果	当該追加工事	A	調整工事計上額	0
	0	0		

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	10,043,151				
運搬費	9,738,231	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	304,920	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計　21,521,151

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	168,129,727	単独（追加工事）直接工事費	146,608,576	単独（追加工事）共通仮設費	21,521,151
非対象額計（－）	0				
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	168,129,727	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	168,053,352		0		0
現場管理費対象純工事費　（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	23.88 %		0 %		0 %
施工地域等補正	0 %				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	23.88 %		0 %		
計上額	40,149,000		0		0
			9,115,500	（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

事務所名	日光砂防事務所　工務課			工事番号	2026070017　　第　0　回変更
発注年月	令和08年07月	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	主工種	砂防・地すべり等工事

工事原価	208,278,727						
純工事費	168,129,727	現場管理費		40,149,000	工期延長等に伴う現場維持費		0
非対象額計（－）	0						
管理費区分９	0	（支給品を除く間接費非対象額）					
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額）					
一般管理費等対象工事原価							
単独（追加工事）	208,278,727		現工事	0		合算工事	0
全処分費等を除く							
一般管理費等対象工事原価	208,202,352		現工事	0		合算工事	0
（調整工事入力で使用）							
前払金支出割合による補正係数	1		現工事				
財団法人等による補正係数	1						
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	208,278,727						
契約保証に係る補正値	0.04　%						
一般管理費率							
単独（追加工事）	16.67　%		現工事	0　%		合算工事	0　%

一般管理費	34,801,273	
業務委託料等	0	
調査基準価格	243,507,000	
調査基準価格の100/110	221,370,000	（ 91.07　%）

工　事　数　量　総　括　表

工 事 名　　Ｒ８般若沢第４床固改築工事

国土交通省 関東地方整備局
日光砂防事務所　工務課

工事数量総括表

工事名	Ｒ８般若沢第４床固改築工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
流路		式		1		
砂防土工		式		1		
残土処理工		式		1		
整地	残土受入れ地での処理	式		1		
床固め工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削(砂防))	土砂	式		1		
埋戻し	転圧無	式		1		
埋戻し	転圧有	式		1		
整形仕上げ工		式		1		
基礎面整形		m2		70		

工事数量総括表

工事名	Ｒ８般若沢第４床固改築工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
床固め本体工		式		1		
D種ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-5-40(高炉)	m3		734		
堤冠ｺﾝｸﾘｰﾄ A種	27-5-40(高炉)	m3		21		
堤冠ｺﾝｸﾘｰﾄ G種	鉄材ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3		2		
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ50×800mm	孔		959		
差筋	SD345 D25×1600mm	本		959		
ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ(既設腹付け面)		m2		470		
補強鉄筋	SD345 D16～25	t		0.13		
残存滑面型枠		m2		320		
残存型枠		m2		210		
型枠		式		1		

工事数量総括表

工事名	Ｒ８般若沢第４床固改築工事	（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
足場		式		1		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3		62		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		62		
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		62		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
仮道路		式		1		
道路補修		式		1		

工事数量総括表

工事名	Ｒ８般若沢第４床固改築工事	（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
資材運搬設備工		式		1		
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備	Aﾗｲﾝ	式		1		
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備	Bﾗｲﾝ	式		1		
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運搬	Aﾗｲﾝ	式		1		
作業構台		式		1		
人員輸送工		式		1		
ﾓﾉﾚｰﾙ		式		1		
通路工		式		1		
人道足場		式		1		
砂防仮締切工		式		1		
土砂締切		式		1		

工事数量総括表

工事名	Ｒ８般若沢第４床固改築工事	（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
大型土のう締切		式		1		
仮水路工		式		1		
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
重建設機械分解組立費		式		1		
機材運搬		式		1		

工事数量総括表

工事名	Ｒ８般若沢第４床固改築工事	（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設材運搬費		式		1		
安全費		式		1		
落石防護ﾈｯﾄ		式		1		
現場環境改善費（率計上）		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税相当額		式		1		

工事数量総括表

工事名	Ｒ８般若沢第４床固改築工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事費計		式		1		

Ｒ８般若沢第４床固改築工事
特記仕様書

令和８年７月

日光砂防事務所

第１編　共通編
第１章　総則

第１条　摘要

１．この特記仕様書は、関東地方整備局 土木工事共通仕様書(令和８年度版)（以下「共通仕様書」という。)でいう特記仕様書で、本工事の施工に適用する。

２．この工事の施工にあたっての一般的事項は、共通仕様書によるものとする。

３．この特記仕様書に添付されていない別紙様式等については以下 URL よりダウンロードするものとする。　URL　https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/index00000015.html

４．本工事における「条件明示」については、別紙－１「明示項目および明示事項」に記載のとおりとする。

第２条　主任技術者等

本工事の主任技術者又は監理技術者は、受注者が提出した競争参加資格確認申請書に記述した配置予定の技術者でなければならない。

第３条　主任技術者等の専任期間

１．契約締結日の翌日から工事の始期までの期間については、主任技術者又は監理技術者の設置を要しない。

２．契約締結日の翌日から現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。

３．工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手続後、後片付け等のみが残っている期間については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日（例：「完成通知書」等における日付）とする。

４．主任技術者又は監理技術者が技術研鑽のための研修、講習、試験等で短期間工事現場を離れる場合は、適切な施工ができる体制を確保したうえで、監督職員の承諾を得るものとする。

第４条　専任特例１号の場合の監理技術者又は主任技術者の配置

本工事は、建設業法第２６条第３項第一号の規定の適用を受ける監理技術者又は主任技術者の配置は認めない。

第５条　専任特例２号の場合の監理技術者の配置

１.本工事において、建設業法第２６条第３項第二号の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「専任特例２号の場合の監理技術者」という。）の配置を行う場合は以下の（１）～（８）の要件を全て満たさなければならない。

（１）建設業法第２６条第３項第二号による監理技術者の職務を補佐する者（以下、「監理技術者補佐」という。）を専任で配置すること。
（２）監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第２７条の規定に基づく技術検定種目は、専任特例２号の場合の監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。
（３）監理技術者補佐は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
（４）同一の専任特例２号の場合の監理技術者が配置できる工事は、本工事を含め同時に２件までとする。なお、専任特例１号の場合の監理技術者又は主任技術者を活用した工事と兼務することは出来ない。（ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるものについては、これら複数の工事を一の工事とみなす。）
（５）専任特例２号の場合の監理技術者が兼務できる工事は栃木県内の工事でなければならない。
（６）専任特例２号の場合の監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。
（７）専任特例２号の場合の監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。
（８）監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。
２．現場の安全管理体制について、平成７年４月２１日付基発第２６７号の２「元方事業者による建設現場安全管理指針」において、「統括安全衛生責任者の選任を要するときには、その事業場に専属の者とすること。」とされていることから、施工体制に留意すること。
３．本工事の監理技術者が専任特例２号の場合の監理技術者として兼務し、本工事に監理技術者補佐を配置する事を予定している場合、以下の書類を提出すること。
１）監理技術者補佐の資格を有する書類（一級施工管理技士等の国家資格者の合格証の写しなど）
２）監理技術者補佐の直接的かつ恒常的な雇用関係を証明する書類（監理技術者資格者証、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書、所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料（いずれも写し可））
３）専任特例２号の場合の監理技術者が兼務する工事の箇所、内容を示す書類（ＣＯＲＩＮＳの写し）
４．本工事の監理技術者が専任特例２号の場合の監理技術者として兼務し、本工事に監理技術者補佐を配置する事となった場合、第１項（５）～（８）について施工計画書へ記載し、提出すること。
５．本工事において、専任特例２号の場合の監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は、コリンズ（ＣＯＲＩＮＳ）への登録・修正を適切に行うこと。

第６条　コリンズ（CORINS）への登録

１．工事カルテの作成、登録については、共通仕様書「1-1-1-7 コリンズ（CORINS）への登録」によるものとする。

２．受注者は、工事受注後又は施工中において当該工事に係る悪質で不誠実な行為(一括下請負等)が発覚し、指名停止の措置を受けた場合は、登録済みの工事カルテの取り下げを行うものとする。

３．技術者の従事期間は、工期をもって登録するものとする。（余裕期間を含まないことに留意するものとする。）

第７条　コリンズ（CORINS）への位置情報の入力

共通仕様書 1-1-1-7 コリンズ（CORINS）への登録に定める「登録のための確認のお願い」を作成するにあたり、位置情報については以下のとおりとし、工事場所および座標（緯度、経度）を記載するものとする。なお、座標は、世界測地系（JGD2024）に準拠する。

栃木県日光市中宮祠 緯度 ３６° ４５’ ４” 経度 １３９° ３０’ ５３”

第８条　コリンズ（CORINS）への工事概要の入力

共通仕様書 1-1-1-7 コリンズ（CORINS）への登録に定める「登録のための確認のお願い」を受注時に作成するにあたり、工事概要について必須登録とし、記載例を参考にすること。

（記載例）

本工事は、大谷川上流域の崩壊地に位置する般若沢筋に整備した第４床固の改築工事を行うものである。

第９条　コリンズ（CORINS）への設計業務名及びテクリス番号の入力

共通仕様書 1-1-1-7 コリンズ（CORINS）への登録に定める「登録のための確認のお願い」を作成するにあたり、設計業務名およびテクリス番号を登録すること。設計業務名およびテクリス番号については以下のとおりとする。

コリンズへ登録する業務名及びテクリス番号

業　務　名	テクリス番号
Ｒ２日光砂防管内砂防施設設計業務（その４）	4045330098

第１０条　工事用地等の使用

１．工事の履行に先立ち、貸与された資料等により使用条件や履行義務等を確認するとともに、実際の土地の使用範囲や境界杭等を現地で確認するものとする。

また、工事の履行中及び完了時にも確認を行うものとする。

２．現地調査等により確認した内容は書面にて監督職員等に報告するものとする。

３．工事の履行に伴い、下記に示す事案が発生した場合は、監督職員に報告し、その指示によるものとする。

１）貸与された資料等と現地に相違がある場合
２）やむを得ない事情により境界標等の移設が必要な場合
３）やむを得ない事情により使用条件や工事の履行に困難が生じた場合
４）その他、土地の使用にあたって疑義等が生じた場合

第１１条　施工体制台帳

工事成績優秀企業に認定され、認定有効期限内に、工事発注の契約を行った工事の監理技術者、主任技術者（工事成績優秀企業に認定された下請負を含む）は、工事成績優秀企業認定マークの使用や金色帯線（黄色もしくは橙色の帯線でも可）を名札上部に印刷することが出来るものとする。

※作成例



注意１）用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。
注意２）所属会社の写真とする。

第１２条　調査・試験に対する協力

１．契約担当官等が工事の中間において技術検査の必要を認めた場合は、速やかに監督職員の指示に従い、検査を受けなければならない。なお、検査は工事請負契約書及び共通仕様書に適用する条項に準じて行うものとする。

２．予算決算及び会計令第 85 条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合においては、受注者は下記の調査に協力しなければならない。

１）受注者は、下請負者の協力を得て間接工事費等諸経費動向調査票(営繕工事 においては共通費実態調査票)の作成を行い、工事完了後、速やかに発注者に提出するものとする。

２）受注者は、提出された間接工事費等諸経費動向調査票(営繕工事においては共通費実態調査票)の費用の内訳についてヒアリング調査に応じるものとする。この場合において、受注者は下請負者についてもヒアリングに参加させるものとする。

３）工事コスト調査（調査結果でも可）に係る資料は、下記のとおりとし、関東地方整備局又は日光砂防事務所のホームページにより公表する。

４）低入札価格調査と工事コスト調査の結果に大きな乖離がある場合、又は、工事コスト調査資料の提出が無い場合には、工事成績評点を減点する場合がある。

なお、低入札価格調査対象工事については、工事コスト調査終了後に、工事成績評点を通知する。

公表資料は以下のとおり。

資料名	内容
低価格理由とその詳細	当該工事が低価格で施工可能となる理由を示した資料

比較表－１	積算内訳書の発注者と元請における当初と実績の比較表
比較表－２	積算内訳書に対する明細書の発注者と元請における当初と実績の比較表
比較表－３	元請の手持ち資材の当初と実績の比較表
比較表－４	元請の資材購入先一覧の当初と実績の比較表
比較表－５	手持ち機械の当初と実績の比較表
比較表－６	労務者確保計画の当初と実績の比較表
比較表－７	工種別労務者配置計画の当初と実績の比較表
比較表－８	建設副産物の搬出の当初と実績の比較表
諸経費動向調査（工事費）	元請、下請の工事費内訳

第１３条　低入札契約におけるモニターカメラの設置

本工事は、予算決算及び会計令第８５条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合においては、工事の監督補助としてモニターカメラの設置を行う対象工事とする。

なお、モニターカメラの設置費用については、発注者の負担によるものとする。

第１４条　不可視部分の出来形管理について

予算決算及び会計令第８５条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合においては、以下に示す工種の不可視部分について、ビデオカメラを用いた出来形管理を行うこととし、撮影した映像については監督職員に提出するものとする。

①　床固め工

第１５条　工事書類の作成

１．工事書類の作成に当たっては、別に定める「土木工事電子書類作成マニュアル（令和８年３月）」に基づき実施するものとする。

２．工事書類の作成に当たっては、別に定める「土木工事電子書類スリム化ガイド（令和８年３月）」を参考に書類の電子化、受発注者間での作成書類の役割分担の明確化、書類の削減等に留意すること。

３．「工事関係書類一覧表」（別紙様式－１５）により、工事着手前に「作成書類の役割分担」、「作成書類の位置付け」に関して「協議」するものとする。

また、「協議」の内容を変更する場合は、改めて、受発注者で協議を行うものとする。

４．電子により提出、提示した書類については、検査時その他の場合においても紙での提示、提出は行わないものとする。

第１６条　設計図書の照査

発注者は、設計図書の照査の範囲を超える資料の作成については、監督職員の指示とし、その作成費用は、設計変更の対象とする。なお、設計変更の対象については、「土木工事における工事請負契約における設計変更ガイドライン（総合版）：令和７年３月」による

ものとする。

第１７条　情報共有システムの活用

１．本工事は、監督職員及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの活用対象工事である。なお、活用にあたっては「土木工事・業務の情報共有システム活用ガイドライン」（令和８年３月版）に基づき実施すること。

２．受注者は、本工事で使用する情報共有システムを選定し、使用する情報共有システムは次の要件を満たすものとする。

・工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件（Rev5.8）
令和８年３月版　国土交通省（国土技術政策総合研究所）

３．監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者（以下「サービス提供者」という。）との契約は、受注者が行うものとする。また、利用開始日、必要なユーザーＩＤ数、ディスク容量等の仕様やワークフロー機能の対象者等については、監督職員の確認を得た上で決定すること。

４．受注者は、サービス提供者と次の内容を含めた契約を締結するものとする。

①情報共有システムに関する障害を適正に処理、解決できる体制を整える旨

②サービス提供者が善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない不正アクセス等により、情報漏洩、データ破壊、システム停止等があった場合、速やかに受注者に連絡を行い適正な処置を行う旨

③②の場合において、サービス提供者に重大な管理瑕疵があると監督職員若しくは受注者が判断した場合、又は復旧若しくは処理対応が不適切な場合には、受注者はサービス提供者と協議の上情報共有システムの利用を停止することができる旨

５．受注者は、監督職員等から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うためのアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。

第１８条　「設計・施工技術連絡会議（三者会議）」の設置

本工事は、「設計・施工技術連絡会議（三者会議）」（以下、「三者会議」という。）の対象工事では無いが、受注者から「三者会議」の開催を要請した場合、明らかに会議開催の必要性が乏しいと判断される場合を除き、公共工事の品質確保及び円滑な事業執行を目的として、発注者、設計者、施工者（工事受注者）の三者が工事着手前等において一堂に会して、事業目的、設計思想・条件等の情報の共有及び施工上の課題、新たな技術提案に対する意見交換等を行う「三者会議」を開催するものとする。

受注者は、「三者会議」の開催を要請する場合、監督職員と協議するものとする。

「三者会議」の運用にあたっては、「設計・施工技術連絡会議（「三者会議」）運用方針」（https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html）によるものとする。

第１９条　設計審査会の設置

本工事は、発注者と受注者が一堂に会して、現場着手前（準備期間内）に工事工程クリテ

ィカルパスの共有及び工事工程の照合（クロスチェック）を実施し、併せて協議資料作成等の受発注者間の役割分担を明確にする場、また、設計変更手続きの透明性と公正性の向上及び迅速化のため、設計変更の妥当性の審議及び設計変更等に伴う工事中止等の判断等を行う場として開催する「設計審査会」（以下、「審査会」という。）の設置対象工事である。

「審査会」の運用にあたっては、「設計審査会設置運用方針 」

（https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html）によるものとする。

第２０条　工事環境の改善

本工事の実施にあたっては、工事環境の改善に取り組むウィークリースタンスを考慮するものとする。ウィークリースタンスの実施にあたっては、関東地方整備局ホームページ https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html　に掲載している工事環境改善実施要領に基づき、監督職員と確認・調整した内容について取り組むものとする。

第２１条　ワンデーレスポンス

１．この工事はワンデーレスポンス対象工事である。

・「ワンデーレスポンス」とは

受注者からの質問、協議等への回答は、基本的に「その日のうち」に指示、通知等行うよう対応する。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」に通知することである。

２．受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議をおこなうこと。

３．受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。

４．ワンデーレスポンスの実施にあたっては、関東地方整備局ホームページ https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html　に掲載しているワンデーレスポンス実施の手引き（令和５年１２月）に基づき、取り組むものとする。

５．効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合があるため、協力すること。

第２２条　契約内容の変更手続きについて

本工事における契約内容の変更は、以下によるものとする。

①　本工事における設計変更や契約変更は書面に基づき行うことを徹底し、指示書・協議書があるもののみを契約変更の対象とする。

②　受注者は、工事期間中及び工事完成後において、監督職員から契約図書の規定に違反する等の不適切な指示を受けたと思料されるときは、当該監督職員を経由せずに、事務所長へ直接又は契約担当課長経由で書面により、その旨を報告することができる。

第２３条　設計変更等

設計変更等については、契約書第18条から第25条及び共通仕様書共通編1-1-1-17から1-1-1-19に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン（総合版）：令和７年３月」によることとする。

第２４条　スライド条項

工事請負契約書第２６条（スライド条項）については、物価水準の変動により請負代金が不適当となったと認められた時に、相手方に請負代金の変更を請求することができる条項となっている。

単品スライドについては、鋼材類・燃料油の他、コンクリート類、購入土などの主要工事材料も対象となるので、物価水準の変動により請負代金が不適当となった場合には、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

第２５条　公共建設工事における分別解体等・再資源化等及び再生資源活用工事実施要領（土木）

１．本工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（（平成 12 年法律第 104　号 最終改正令和４年６月 17 日法律 68 号）。以下「建設リサイクル法」という。）に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「８解体工事に要する費用等」に定める事項は契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。ただし工事発注後に明らかになった事情により予定した条件により難い場合は監督職員と協議するものとする。

(1)分別解体の方法

	工程	作業内容	分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法	①仮設	仮設工事 ■有　□無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ■有　□無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 □有　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ■有　□無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 □有　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑥　その他 （　　）	その他の工事 □有　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用

(2)再資源化等をする施設の名称及び所在地

特定建設資材廃棄物の種類	施設の名称	所在地

コンクリート塊（無筋）	佐藤商事（株）	栃木県鹿沼市千渡入山 2064-1

上記（2）については、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者の提示する施設と異なる場合でも設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項については、監督職員と協議の上、契約変更の対象とすることができる。

(3)受入時間　　８：００～１７：００

２．受注者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第 18 条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督職員に報告することとする。なお、書面は「建設リサイクルガイドライン(平成 14 年 5 月)」に定めた様式 1〔再生資源利用計画書(実施書)〕及び様式 2〔再生資源利用促進計画書(実施書)〕を兼ねるものとする。

・再資源化等が完了した年月日

・再資源化等をした施設の名称及び所在地

・再資源化等に要した費用

３．工事発注後に明らかになった事情により予定していた条件により難い場合は、監督職員と協議するものとする。

第２６条　建設リサイクル法第１１条通知の徹底

受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成 12 年 5 月 31 日法律第 104 号）第 11 条に基づく、都道府県知事に対する通知を行った旨の書面を監督職員より受領した後に、工事着手（建設リサイクル法第 10 条第 1 項に規定する工事着手をいう。）するものとする。

なお、これによりがたい場合は監督職員と協議の上決定するものとする。

第２７条　コンクリート副産物から再生された資源について

１．コンクリート副産物から再生された資材を利用する場合には、「コンクリート副産物の再生利用に関する用途別品質基準」によるものとする。

２．受注者は、コンクリート副産物から再生された資材の利用を希望する場合は、工事着手時にその適用の有無を監督職員と協議するものとする。

３．受注者は、工場が発行する再生骨材コンクリートの配合計画書及び納入書を整備および管理し、監督職員または検査職員からの請求があった場合は速やかに提示しなければならない。

４．受注者は、再生骨材コンクリートの品質を確かめるための検査を JIS A 5022（再生骨材Mを用いたコンクリート）、JIS A 5023（再生骨材Ｌを用いたコンクリート）により実施しなければならない。また、再生骨材Mを用いたプレキャストコンクリート製品の検査については、JIS A 5365（プレストキャストコンクリート製品－検査方法通則）により実施しなければならない。なお、生産者等に検査のため試験を代行させる場合は受注者がその試験に臨場しなければならない。

５．再生骨材コンクリートの配合については、「土木工事共通仕様書第１編３－３－３　配

合」に従うものとする。

第２８条　建設副産物

１．受領書の交付

受注者は、土砂を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、法令等に基づき、速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。

２．再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項等

受注者は、再生資源利用促進計画の作成に当たり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策法等の手続き状況や、搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて、法令等に基づき確認しなければならない。

また、確認結果は再生資源利用促進計画に添付するとともに、工事現場において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。

３．建設発生土の運搬を行う者に対する通知

受注者は、建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするときは、「再生資源利用促進計画」に記載した事項（搬出先の名称及び所在地、搬出量）と前項の「再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項等」で行った確認結果を、委託した搬出者に対して、法令等に基づいて通知しなければならない。

４．建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等

受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督職員から請求があった場合は、受領書の写しを提出しなければならない。

第２９条　施工管理

１．本工事の施工管理は、関東地方整備局土木工事施工管理基準及び規格値(令和８年度版)によるものとする。なお、この管理基準により難い場合及び基準、規格値が定められていない工種については、監督職員と協議の上、施工管理を行うものとする。

２．本工事の写真管理は、関東地方整備局土木工事写真管理基準(令和８年度版)（以下、「写真管理基準」という。）によるものとする。なお、「撮影項目」、「撮影頻度」等が工事内容に合致しない場合は、監督職員の指示により追加、削減するものとする。

３．本工事の施工管理における適用工種毎の基準類は、ＩＣＴ活用工事実施要領(令和８年３月改定)の関連要領等一覧（ＵＲＬ「https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/sosei_constplan_tk_000051.html」）によるものとする。

第３０条　デジタル工事写真の小黒板情報電子化について

デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入および、工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を

図るものである。

工事では、以下の１．から４．の全てを実施することとする。

１．対象機器の導入

受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等（以降、「使用機器」と称する）については、関東地方整備局写真管理基準（令和８年度版）（以下、写真管理基準）「2-2 撮影方法」に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認（改ざん検知機能）を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認（改ざん検知機能）は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」（URL https://www.cryptrec.go.jp/list.html）に記載している技術を使用していること。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、本工事での使用機器について提示するものとする。

なお、使用機器の事例を以下に示す。

【使用機器の事例】

デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア，（一社）施工管理ソフトウェア産業協会（URL https://www.jcomsia.org/kokuban）

※ここでは使用機器の事例を示したものであり、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない

２．デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入

受注者は、前項１．の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入を行う項目は、写真管理基準「2-2 撮影方法」による。

ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。

３．小黒板情報の電子的記入の取扱い

本工事の工事写真の取扱いは、写真管理基準及びデジタル写真管理情報基準（以下、デジタル写真管理情報基準）に準ずるが、同条２．に示す小黒板情報の電子的記入については、写真管理基準「2-5 写真編集等」及びデジタル写真管理情報基準「6.写真編集等」で規定されている写真編集には該当しない。

４．小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品

受注者は、同項２．に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真（以下、「小黒板情報電子化写真」と称する。）を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお納品時に、受注者は改ざん検知機能（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認することがある。

また、下記のチェックツールを使用して信憑性確認を行い、結果を出力したものでもよい。

【チェックツールの事例】

信憑性チェックツール（一社）施工管理ソフトウェア産業協会

（URL https://www.jcomsia.org/kokuban）

※ここでは使用機器の事例を示したものであり、この使用機器の事例からの選定に限定するものではないなお、デジタル工事写真の小黒板情報電子化を実施しない工事写真がある場合は、工事契約後、監督職員の承諾を得ること。

第３１条　ＩＣＴ活用工事（コンクリート堰堤工）について

１．ＩＣＴ活用工事

本工事は、国土交通省が提唱する i-Construction に基づき、ＩＣＴ施工技術の全面的活用を図るため、受注者の提案・協議により、起工測量、設計図書の照査、施工、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について３次元データを活用するＩＣＴ活用工事の対象工事である。

２．定義

（１）i-Construction とは、ＩＣＴ施工技術の全面的な活用、規格の標準化、施工時期の平準化等の施策を建設現場に導入することによって、建設現場のプロセス全体の最適化を図る取り組みである。本工事では、受注者の希望により、その実現に向けてＩＣＴ施工技術を活用した工事（ＩＣＴ活用工事）を実施するものとする。

（２）ＩＣＴ活用工事とは、施工プロセスの以下段階において、ＩＣＴ施工技術を全面的に活用する工事である。また、本工事においては、次の①②④⑤の段階でＩＣＴ施工技術を活用することをＩＣＴ活用工事とする。

対象は、コンクリート堰堤工等を含む一般土木工事とする。

① ３次元起工測量
② ３次元設計データ作成
③ 該当なし（ＩＣＴ建設機械による施工）
④ ３次元出来形管理等の施工管理
⑤ ３次元データの納品

３．受注者は、ＩＣＴ施工技術の活用を行う希望がある場合、契約後、施工計画書の提出（施工数量や現場条件の変更による、変更施工計画書の提出を含む）までに監督職員へ提案・協議を行い、協議が整った場合に以下４～８によりＩＣＴ施工技術の活用を行うことができる。

４．原則、本工事においては上記①②④⑤の段階でＩＣＴ施工技術を活用することとする。

コンクリート堰堤工等についての施工範囲の全てで適用するが、具体的な工事内容・数量及び対象範囲を明示し、監督職員と協議するものとする。なお、実施内容等については施工計画書に記載するものとする。

５．ＩＣＴ施工技術を用い、以下の施工を実施する。

① ３次元起工測量

受注者は、工事着手前の現場の状況を確認するとともに、設計データの作成に必要な起工測量を実施するものとし、面的な計測により効率的な確認ができる場合には以下１）～４）から選択（複数可）して測量を行うものとする。

ただし、管理断面及び変化点の計測による測量により効率的な確認ができる場合に

おいては、以下５）から７）の管理断面及び変化点の計測による測量が選択できるものとし、ＩＣＴ活用工事とする。

また、コンクリート堰堤工の関連施工としてＩＣＴ土工等が行われる場合、その起工測量データ及び施工用データを活用することができるものとし、ＩＣＴ活用工事とする。

１）空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量
２）地上型レーザースキャナーを用いた起工測量
３）ＴＳ等光波方式を用いた起工測量
４）ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量
５）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量
６）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
７）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量

② ３次元設計データ作成

受注者は、５．①で得られた測量データ等と、発注者が貸与する発注図データを用いて、３次元出来形管理を行うための３次元設計データを作成する。

３次元設計データ作成はＩＣＴ土工等と合わせて行うが、ＩＣＴコンクリート堰堤工の施工管理においては、３次元設計データ（TIN）形式での作成は必須としない。

③ ＩＣＴ建設機械による施工

コンクリート堰堤工においては該当なし。

④ ３次元出来形管理等の施工管理

（１）出来形管理

コンクリート堰堤工の施工管理において、以下１）～７）の技術から選択（複数可）して、出来形管理を実施するものとする。

また、以下１）～４）の出来形管理を行う場合は、工事検査前の工事竣工段階の目的物について点群データを取得し、⑤によって納品するものとする。

１）空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理
２）地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理
３）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理
４）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理
５）ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理
６）ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理
７）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理

なお、計測装置位置と計測対象箇所との離隔・位置関係により上記１）～７）のＩＣＴ施工技術を用いた計測においては精度確保が困難となる箇所や繰り返し計測を行うことが必要となる箇所等も想定される。当該箇所においては、監督職員と協議の上、施工段階における出来形計測結果が判る写真・画像データ等と併用するなどして、出来形管理を行っても良いものとする。

（２）出来形管理基準及び規格値

出来形管理基準及び規格値については、現行の基準及び規格値を用いる。出来形の

算出は、上記（１）で定める計測技術を用い以下１）の出来形管理要領によるものとする。

１）３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）

（３）出来形管理帳票

現行の出来形管理帳票、出来高整理資料を作成する。また、出来形の３次元計測結果が計測（管理）すべき断面上あるいは測線上にあることを示す適用工種の３次元設計データあるいは平面図を提出することとする。

⑤ ３次元データの納品

５．①②④により作成した３次元データを、工事完成図書として電子納品する。３次元データの納品形式は、「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）」によるものとする。

６．上記５．①②④の施工を実施するために使用するＩＣＴ機器類は、受注者が調達すること。また、施工に必要な施工用データは、受注者が作成するものとする。使用するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。

発注者は、３次元設計データの作成に必要な詳細設計において作成したＣＡＤデータを受注者に貸与する。また、ＩＣＴ施工技術の活用を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、施工区間の前後を含め必要な範囲を積極的に受注者に貸与するものとする。

７．土木工事施工管理基準（案）に基づく出来形管理が行われていない箇所で、出来形測量により形状が計測出来る場合は、出来形数量は出来形測量に基づき算出した結果とする。

８．本特記仕様書に疑義を生じた場合または記載のない事項については、監督職員と協議するものとする。

第３２条　ＩＣＴ活用工事における適用（用語の定義）について

１．図面

図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更または追加された設計図、工事完成図、３次元モデルを復元可能なデータ（以下「３次元データ」という。）等をいう。なお、設計図書に基づき監督職員が受注者に指示した図面及び受注者が提出し、監督職員が書面により承諾した図面を含むものとする。

第３３条　ＩＣＴ活用工事（コンクリート堰堤工）の費用について

１ 受注者が、契約後、施工計画書の提出（施工数量や現場条件の変更による、変更施工計画書の提出を含む）までにＩＣＴ施工技術の具体的な工事内容・数量及び対象範囲について明示し、発注者へ提案・協議を行い、協議が整った場合、ＩＣＴ施工技術の活用を実施する項目については、以下の積算要領に基づき以下の（１）（２）により費用を計上することとする。

・ＩＣＴ活用工事（コンクリート堰堤工）積算要領

（１）３次元起工測量・３次元設計データの作成費用

３次元起工測量・３次元設計データの作成（修正含む）を実施した場合は、受注者は発注者からの依頼に基づき、見積り書を提出するものとし、発注者は、費用の妥当性を確認した上で設計変更の対象とする。

なお、受注者から見積りの提出がない場合は、「３次元起工測量・３次元設計データの作成費用」は計上しないものとする。

（２）３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、外注経費等の費用

出来形管理の計測範囲において、面的に座標を取得し、ソフトウェア上で面の法長・高さ等の出来形管理を実施し、工事検査前の工事竣工段階の目的物について点群データを取得し、３次元データ納品を行った場合、標記費用の対象とする。

費用の計上方法については、受注者より提出された見積により費用の妥当性を確認することとし、官積による算出方法については、共通仮設費率、現場管理費率に以下の補正の補正係数を乗じるものとする。

なお、受注者は、発注者からの依頼に基づき、見積り書を提出するものとする。受注者からの見積により算出される金額が以下の補正係数を乗じて算出される金額を下回る場合は、見積により算出される金額を積算計上額とする。

また、受注者から見積の提出がない場合は、３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、外注経費等の費用は計上しないものとする。ただし、コンクリート堰堤工（ＩＣＴ）と同時に実施する土工（ＩＣＴ）等他工種において補正係数を乗じる場合は適用しない。

・共通仮設費率補正係数：1.2

・現場管理費率補正係数：1.1

上記費用の対象となる出来形管理は、以下の１）～４）とし、それ以外の出来形管理の費用は、共通仮設費率及び現場管理費率に含まれるため、別途計上は行わない。

１）空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理

２）地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理

３）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理

４）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理

なお、以下の５）～７）による出来形管理を実施した場合は、「３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、外注経費等の費用」については、計上しない。

５）ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理

６）ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理

７）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理

２ 施工合理化調査を実施する場合はこれに協力すること。

第３４条　ＩＣＴ活用工事の活用効果等に関する調査

ＩＣＴ活用工事を行った施工者は、活用目的等の把握のための「ＩＣＴ活用工事の活用効果等に関する調査」の対象であり、別途監督職員より指示される調査票に基づき実施するものとする。

施工者は、工事完了後直ちに調査票を監督職員へ提出・確認後、発注者が指示するメールアドレスまで調査票を電子メールにより提出すること。また調査票の聞き取り調査等を実施する場合はこれに協力するものとする。

調査費用については当初は計上していないため、設計変更の対象とする。

第３５条　現場環境改善（快適トイレの設置）

１．内 容

受注者は、現場に以下の（１）～（11）の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。

（12）～（17）については、満たしていればより快適に使用出来ると思われる項目であり、必須ではない。

【快適トイレに求める機能】

（１）洋式（洋風）便器

（２）水洗及び簡易水洗機能
（し尿処理装置付き含む）

（３）臭い逆流防止機能

（４）容易に開かない施錠機能

（５）照明設備

（６）衣類掛け等のフック、又は、荷物の置ける棚等（耐荷重を５kg 以上とする）

【付属品として備えるもの】

（７）現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示

（８）周囲からトイレの入口が直接見えない工夫

（９）サニタリーボックス
（女性用トイレに必ず設置）

(10) 鏡と手洗器

(11) 便座除菌クリーナー等の衛生用品

【推奨する仕様、付属品】

(12) 室内寸法 900㎜×900㎜ 以上（面積ではない）

(13) 擬音装置（機能を含む）

(14) 着替え台

(15) 臭気対策機能の多重化

(16) 室内温度の調整が可能な設備

(17) 小物置き場
（トイレットペーパー予備置き場等）

２．快適トイレに要する費用

快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。

受注者は、上記１の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものとする。

【快適トイレに求める機能】（1）～（6）及び【付属品として備えるもの】（7）～(11)の費用については、従来品相当を差し引いた後、57,000 円/基・月を上限に設計変更の対象とする。

なお、設計変更数量は、現場毎に必要性を協議の上、決定する 。

また、運搬・設置費は共通仮設費（率）に含むものとし、積算上限額を超える費用については、現場環境改善費(率)を想定しており、別途計上は行わない。

３．快適トイレの「質の向上」に要する費用

快適トイレの「質の向上」として、積算上限額を超える費用について現場環境改善費(率)を充当することができる。現場環境改善費（率）の充当を希望する場合は、上記２．の協議時に見積書を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとする。

なお、現場環境改善費（率）を充当することにより、特記仕様書に明示されたその他の費目の実施が困難な場合には、実施費目数の変更を合わせて協議することとする。

４．その他

快適トイレの手配が困難の場合は、監督職員と協議の上、本条項の対象外とする。

第３６条　BIM/CIM 適用工事について

本工事は、BIM/CIM 適用工事（受注者希望型）である。受注者が希望する場合、３次元モデルの活用を提案することができる。詳細については、受発注者で協議し実施する。

（参考）３次元モデル作成の目安

詳細度	２００～３００程度　※１ ※１　構造形式がわかるモデル～主構造の形状が分るモデル
属性情報	3次元形状データが何を表すかを識別する情報をオブジェクトごとに属性情報として設定する（BIM/CIM取扱要領「附属資料３　オブジェクト分類」を参照）。

１　BIM/CIM 実施計画書の作成

受発注者において、BIM/CIM の実施内容や、納品方法等を協議し決定した結果を「BIM/CIM 実施計画書」として整理し、提出する。内容に変更が生じた場合は、受発注者間で協議し、BIM/CIM 実施（変更）計画書を作成する。

また、作成した BIM/CIM 実施計画書（変更含む）に基づき、本工事を実施する。

１）工事概要

２）整理すべき課題

３）BIM/CIM の実施内容（３次元モデルの活用内容、期待する効果等）

４）３次元モデルの作成仕様（作成範囲、詳細度、属性情報、別業務等で作成された３次元モデルの仕様等）

５）３次元モデルの作成に用いるソフトウェア、オリジナルデータの種類

６）３次元モデルの閲覧、データ共有ができるソフトウェアの種類、成果物の納品ファイル形式

７）３次元モデルの作成・活用に要する費用

２ BIM/CIM 実施報告書の作成

BIM/CIM 実施計画書に基づき実施した内容について、BIM/CIM 実施報告書を作成する。以下の内容を BIM/CIM 実施計画書に追記して作成する。

８）後段階への引継事項（データかつ用事の留意点、更なる検討が必要な内容、２次元図面との整合等）

９）省人化の効果（前段階から引き継いだデータの活用により省人化した効果、３次元での検討により省人化した効果等）

３ 成果物の納品

以下の内容を納品する。様式については別添資料を参照すること。

１）BIM/CIM 実施計画書・見積書（変更含む）

２）BIM/CIM 実施報告書（３次元モデル作成引継書シート、３次元モデル照査時チェックシートを含む）

３）作成した３次元モデル（オリジナルデータ、標準的なデータ形式（J-LandXML 形式、IFC 形式）、統合モデル、動画等）

４ 貸与資料

本工事に関連する以下の業務等において作成した３次元モデルのデータを貸与することができる。

・Ｒ２日光砂防管内砂防施設設計業務（その４）

５ その他

最新の情報は BIM/CIM ポータルサイト（https://www.nilim.go.jp/lab/qbg/bimcim/bimcimindex.html）で提供されているので、適宜参照すること。

第３７条 工事中の安全確保

１．工事の施工にあたっては、関東地方整備局長が定める「重点的安全対策」について留意し、工事事故の防止を図らなければならない。

なお、令和８年度における重点的安全対策項目は以下の７項目である。

Ⅰ．架空線等上空施設の損傷事故防止

Ⅱ．建設機械等の稼働に関連した人身事故防止

Ⅲ．資機材等の下敷きによる人身事故防止

Ⅳ．足場・法面等からの墜落事故防止

Ⅴ．地下埋設物の損傷事故防止

Ⅵ．第三者の負傷・第三者車両等に対する損害

Ⅶ．事故防止

２．受注者は、工事に従事する就業制限業務及び作業主任者を選任する業務における資格者のうち、資格取得後一定期間経過した資格者に対し、次に掲げる再教育の受講が推進されるよう努めるものとする。

① 労働安全衛生法第 19 条の２に基づく足場組立等作業主任者等に対する能力向上教育

② 労働安全衛生法第 60 条の２に基づく車両系建設機械運転従事者、移動式クレーン運転士、玉掛業務従事者等に対する危険有害業務従事者教育

③ 厚生労働省通達に基づくドラグ・ショベル運転業務従事者等に対する危険再認識教育

３．工事の施工にあたっては、工事等の時期、工事等の方法の概要 及び 工事等を行なう場合における道路交通に対する措置について「道路工事保安施設設置基準（令和６年２月）」に基づき監督職員へ確認を行うものとする。

４．工事中看板、工事情報看板及び工事説明看板の記載内容及び設置箇所については、監督職員の承諾を得るものとする。

５．工事期間中に配置する交通誘導警備員は、以下のとおり計上するものとする。ただし、交通管理者等との協議条件など社会的要件、現地精査に基づき配置人員の変更が必要になった場合は、監督職員と協議するものとする。

工　　種	作業区分	交通誘導警備員	備　　考
コンクリート打設時	昼間作業	１人	交代要員なし

６．安全ネットの設置

切土法面には落石防止網を設置し、災害の防止に努めるものとする。

７．UAV 等を使用する際の安全面への配慮について

受注者は、起工測量等において UAV 等を使用する場合、安全面への配慮として下記 URL に基づいて UAV 等を使用すること。

URL https://www.gsi.go.jp/KOUKYOU/sokuryosidou41042.html

第３８条　熱中症対策に資する現場管理費の補正

１．本工事は、夏季における真夏日などの気候状況を考慮し、工事現場の熱中症対策に掛かる経費に関して「熱中症対策に資する現場管理費の補正」を行う試行工事である。

２．真夏日の考え方は下記のとおりである。

１）真夏日の定義

日最高気温が 30℃以上の日を指す。

ただし、夜間工事の場合は作業時間帯の最高気温が 30℃以上の場合とする。

２）試行にあたっての真夏日の計上の考え方

下記①～③のいずれかに該当する場合、真夏日として計上する。

①　環境省が公表している暑さ指数（WBGT）が日最高 25℃以上の場合。

施工現場から最寄りの環境省が公表している観測地点の暑さ指数（WBGT）が 25℃以上となる日を真夏日とみなす。

②　気象庁が公表している地上気象観測所の日最高気温が 30℃以上の場合。

施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温が 30℃以上の日を真夏日とする。

③　夜間工事については、作業時間帯の最高気温が 30℃以上の場合。

施工現場から最寄りの観測地点における作業時間帯の最高気温が 30℃以上、又は暑さ指数（WBGT）が 25℃以上の場合を真夏日とする。

なお、休工日においては、上記に該当した場合でも真夏日としない。

上記①～③によりがたい場合は、監督職員と協議すること。

３）工期

工事着手から工事完成日までの期間を指す。なお、年末年始休暇６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。

４）基準日

受発注者協議により、「基準日」を定めるものとする。「基準日」は工事着手日を基本とする。

当該「基準日」より工期末までの期間のうち、真夏日にあたる日数を算出する。

なお、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、現場休工日は含まないものとする。

５）真夏日率

以下の式により算出された率をいう。

・真夏日率 ＝ 基準日から工期末までの真夏日 ÷ 工期

６）現場管理費の補正

現場管理費の補正は、工期中の日最高気温の状況に応じて補正値を算出し、現場管理費率に加算する。なお、補正は変更契約において行うものとする。

・補正値（%） ＝ 真夏日率 × 補正係数※

※ 真夏日補正係数：１．２

第３９条　安全管理推進技術者等認定について

１．概要

関東地方整備局（港湾・空港部・営繕部関係を除く）が発注した工事（以下、「直轄工事」という）において、無事故で完成させた技術者に対して、「安全管理推進技術者」（以下、「認定技術者」という）として認定する。

２．認定要件

対象とする技術者は、以下の条件によって認定する。

・直轄工事において、無事故にて完成させた「安全管理担当者」として、施工期間中、全ての工事（準備工を除く）に従事した者。なお、「安全管理担当者」とは、施工体制上、受注者が配置する「統括安全衛生責任者」、「元方安全衛生管理者」、「ずい道等救護技術管理者」、「店社安全衛生管理者」、「工事現場責任者」として安全管理に従事した者で、現場代理人または、主任（監理）技術者が兼務した場合も認定するものとする。

・直轄工事にて、認定技術者として過去５回認定された者については、「優秀安全管理推進技術者」（以下、「優秀認定技術者」という）として認定する。

３．認定技術者の認証

・認定技術者及び優秀認定技術者に認定された者については、「安全管理推進技術者認定ロゴマーク」（以下、「認定ロゴマーク」という）を「企業の名刺」、「ヘルメット貼付」等に使用（印刷、シール）することができる。

・紛失等による認定書の再発行は行わない。

・「認定ロゴマーク」については、当該地方整備局管内で行う直轄工事のみに使用でき、それに要する費用は、当該企業が負担するものとする。

４．認定技術者の認証期間

認定技術者へ授与した認証については、その使用期間に制限を設けないものとする。

５．不適切事項への措置による認証の取り扱い

認定技術者が関係する工事にて、粗雑工事等の発覚より、関東地方整備局から措置（指名停止、文書注意、口頭注意）を受けた場合であっても、過去の認証の取り消しは行わない。ただし、工事完成後、安全管理に関して不適切な事象が発覚した場合、または、不正による認定取得が確認された場合については、認定を取り消す。

第４０条　出水期間中の現場管理及び施工について

１．本工事における出水期間中の現場管理及び施工については、土木工事共通仕様書第１編「１－１－１－３１工事中の安全確保」に基づき、作業員、仮設物及び資機材等の退避及び流出防止等、施工中の退避時の措置等（以下「防災措置等」という。）必要な対策を講ずるものとする。

なお、上記については、土木工事共通仕様書第１編「１－１－１－６施工計画書」に基づき、施工計画書に記載の上、設計審査会で確認したうえで、監督職員に提出するものとする。また、気象情報や河川水位の収集及び伝達方法等についても施工計画書に記載するものとする。なお、施工計画書に記載すべき標準的な項目については、別紙－６を参考にすること。

防災措置に要する費用については第２２条の設計変更ガイドラインに基づき設計変更の対象とする。

２．施工箇所は全範囲を一度に行うことなく、気象状況等を把握しつつ速やかに必要な措置（埋め戻し等）を行える範囲としなければならない。施工範囲、方法、措置を行う時期等については、施工計画書に記載し設計審査会で確認したうえで監督職員に提出するものとする。

なお、退避時の措置等に要した費用については、監督職員と協議するものとする。

第４１条　交通誘導警備員の資格

交通誘導警備員については、資格者（警備業法第 23 条に規定する都・県公安委員会の行う１級又は２級検定に合格した者）又は、経験１年以上の者を配置すること。

なお、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。

第４２条　架空線等事故防止対策

１．施工に先立ち本工事区間に近接する架空線等上空施設については、貸与された資料等を確認のうえ、詳細については、現地で確認するものとする。

２．現地調査等により確認された架空線等上空施設については、種類、位置（場所、高さ等）及び管理者等をとりまとめ、監督職員に報告するものとする。

また、その防護等の処置方法を含めた取り扱い方法等について、施工計画書に明示し監督職員に提出するものとする。

第４３条　架空線等上空施設の事故防止対策について

架空線等上空施設が工事現場内等にある場合は、関係法令並びに、「公衆災害防止マニュアル（河川部運用案）【架空線等上空施設編】（平成２８年１２月 関東地方整備局 河川部）」等を参考とし、公衆災害等の事故防止対策を実施するものとする。

なお、本マニュアルは関東地方整備局HP＞河川＞技術情報に掲載している。

（http://www.ktr.mlit.go.jp/river/gijyutu/index00000000.html）

第４４条　特定調達品目の調達実績の調査について

受注者は、本工事の資材、建設機械の使用にあたっては、必要とされる強度や耐久性、機能の確保等に留意しつつ、環境物品等の調達の推進に関する基本方針に定められた国土交通省の特定調達品目(以下、「特定調達品目」という)の使用を積極的に推進するものとする。設計図書に定めがあるものについて、特定調達品目への変更が可能である場合は、監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。ただし、東日本大震災の影響により、特定調達品目の使用が困難な場合には、監督職員と協議するものとする。

受注者は、特定調達品目の調達実績の集計を行い、工事完了後に、電子データにより監督職員に提出するものとする。集計の方法については、監督職員より指示する。

第４５条　低騒音型建設機械の使用

受注者は、本工事において「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」(昭和62年3月30日建設省経機第58号)に基づき、低騒音型建設機械の使用原則を図られた場合は、「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」に基づき指定された低騒音型建設機械を使用するものとする。

第４６条　過積載による違法運行の防止対策について

受注者は、工事の施工にあたっては、次の事項を遵守するものとする。

１．積載重量制限を超えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。

２．さし枠装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。

３．過積載車輌、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受ける等過積載を助長することのないようにすること。

４．取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行った場合、さし枠装着車、不表示車等を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。

５．建設発生土の処理及び骨材の購入等にあたって、下請事業者及び骨材納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。

６．以上のことにつき、下請業者にも十分指導すること。

第４７条　工事現場の現場環境改善

１．工事現場の現場環境改善は、地域との積極的なコミュニケーションを図りつつ、そこで働く関係者の意識を高めるとともに関係者の作業環境を整えることにより、公共事業

の円滑な執行に資することを目的とするものである。よって、受注者は施工に際し、この趣旨を理解し、発注者と協力しつつ地域との連携を図り、適正に工事を実施するものとする。

2．現場環境改善の内容については、原則として各計上費目（現場環境改善のうち仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）の１内容ずつの合計４項目とし、選択にあたっては、［別表第１］より適切な組み合わせとするが、内容に変更が生じた場合は監督職員と協議するものとする。

3．現場環境改善については具体的な内容、実施時期について施工計画書に含め提出するものとする。

4．選択項目は、現場条件（競合工事等）を十分検討のうえ、行うこと。

5．主に現場の施設や設備に対する熱中症対策・防寒対策については、工事契約後、監督職員と協議するものとし、現場環境改善費（率計上）の100%を上限として設計変更の対象とする。

［別表第１］　　現場環境改善の内容

計上費目	実施する内容（率計上分）
仮設備関係	１．昇降設備の充実、２．環境対策の充実、３．ＩＣＴ設備の充実 ４．作業負荷の低減
営繕関係	１．現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） ２．労働者宿舎の充実 ３．現場休憩所の充実（交通誘導警備員待機室を含む） ４．衛生設備・厚生施設の充実等
安全関係	１．工事標識・照明等安全施設の充実、２．盗難防止対策 ３．健康関連施設の充実、４．野生生物・害虫対策等
地域連携	１．広報活動等（完成予想図、パンフレット、工法説明、ＰＲ看板等） ２．見学会・イベント等の開催（見学施設等設置・管理運営等含む） ３．社会貢献・地域対策費等（地域行事等の経費含む） ４．現場景観向上（美装化・デザイン看板等）

第４８条　工期

1．本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間と実工事期間を合わせた全体工期を設定した工事であり、発注者が示した工事完了期限までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定できる。なお、契約を締結するまでの間に、別紙様式-１６により、工事の始期及び終期を通知すること。

余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。

全体工期：契約締結日の翌日から令和１０年１２月２２日まで

２．工期は、雨天、休日等を見込み契約の翌日から令和１０年１２月２２日までとする。なお、休日には、日曜日、祝日、年末年始休暇及び夏季休暇の他、作業期間内全ての土曜日を含んでおり、降雪等による不稼働日として１月１日～３月３１日を見込んでいる。

工期には、施工に必要な実日数（実働日数）に加えて以下の日数を見込んでいる。

①	準備期間	３０日間
②	後片付け期間	２０日間
③	雨休率（猛暑日補正あり） 実働工期日数に休日と天候等による作業不能日※を見込むための係数	０．７９

※雨休率を算出した際の日換算した年間の作業不能日は以下のとおりである。（当該工事の作業不能日ではない。）

イ）１日の降雨・降雪量が１０㎜/日以上の日：２８日間

ロ）８時から１７時までのWBGT値が３１以上の時間を足し合わせた日数：４日間

（少数第１位を四捨五入（整数止め）し、日数換算した日数）

過去５か年（2020 年～2024 年）の気象庁（日光観測所）及び環境省（日光東町地点（2022 以前は今市地点））のデータより年間の平均発生日数を算出（雨休率を算出した際の日換算した年間の作業不能日）

３．降雪等による現場閉鎖期間は、監督職員の承諾を得るものとする。

４．著しい悪天候や気象状況より工程（官積算）で見込んでいる「天候等による作業不能日」以上に作業を休止せざるを得なかった場合には、受注者は発注者へ工期の延長変更を協議することができる。

５．後片付け期間に検査に要する各種電子データの作成を行うことを想定しているが、更なる期間が必要な場合は、受注者は発注者へ工期の延長変更を協議することができる。

第４９条　工事工程クリティカルパスの共有

受注者は、現場着手前（準備期間内）に設計図書等を踏まえた工事工程表（クリティカルパスを含む）を作成し、監督職員と共有すること。工程に影響する事項がある場合は、その事項の処理対応者（「発注者」又は「受注者」）を明確にすること。

施工中に工事工程表のクリティカルパスに変更が生じた場合は、適切に受発注者間で共有することとし、工程の変更理由が以下の①～⑤に示すような受注者の責によらない場合は、工期の延長が可能となる場合があるので協議すること。

① 受発注者間で協議した工事工程の条件に変更が生じた場合

② 著しい悪天候や気象状況より工程（官積算）で見込んでいる「天候等による作業不能日」以上に作業を休止せざるを得なかった場合

③ 工事中止や工事一部中止により全体工程に影響が生じた場合

④ 資機材や労働需要のひっ迫により、全体工程に影響が生じた場合

⑤ その他特別な事情により全体工程に影響が生じた場合

第５０条　工事工程表の開示の試行工事

１．本工事は、工期設定の根拠とした工事に必要な関係機関との調整、住民合意、用地確保、法定手続きなどの進捗状況を踏まえた工事工程表を開示するとともに、設計審査会等において工事工程クリティカルパスの共有や発注者が作成する工程と受注者が作成する工事工程の照合（クロスチェック）を行うことにより、適切な工期設定の取組を行う「工事工程表の開示の試行工事」である。

２．工事契約後、設計審査会等において、「前条　工事工程クリティカルパスの共有」により作成した工事工程表を確認し、受注者・発注者間でクリティカルパスの共有を行うものとする。

３．設計審査会等において、発注者が開示した工事工程表（別紙-5）との照合（クロスチェック）を実施し、必要に応じて工期延伸の判断について審査を行うなど、適正な工事工程の確保に努めるものとする。

４．本試行に関するアンケート調査を実施する場合はこれに協力すること。

第５１条　悪天候等により工期変更が必要となる場合の協議を簡素化する試行

１．受注者は、著しい悪天候により作業不稼働日が多く発生し、工期内に工事を完成することが困難な場合はその理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。

著しい悪天候とは、当該工事の工期月の雨休率が、直近５カ年における工期月の雨休率の平均値を超える場合をいう。

工期月とは、工事着手日から工事完成予定日までの期間のうちの、工期の延長変更請求時までにかかる月（ただし、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は除く）をいう。

なお、本工事の降雨降雪日は、日光観測所（気象庁のデータ）における１日の降雨・降雪量雨が 10㎜ 以上/日の日を想定している。

２．アンケート調査を行う場合は、これに協力すること。

第５２条　個人情報の取扱について

（基本的事項）

１．受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号）第 66 条第２項第１号の規定に基づき、個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない

（秘密の保持）

２．受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

（取得の制限）

３．受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらか

じめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段で個人情報を取得しなければならない。

（利用及び提供の制限）

4．受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

（複写等の禁止）

5．受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。

（再委託の禁止）

6．受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取り扱いを伴う事務を再委託してはならない。なお、発注者の指示又は承諾により第三者に個人情報の取り扱いを伴う事務を再委託する場合（二以上の段階にわたる委託を含む。）には、受注者は当該第三者に対して、個人情報の保護に関する法律（平成15年5月30日法律第57号）第66条第2項第4号に基づく個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じさせなければならない。

（事案発生時における報告）

7．受注者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

（資料等の返却等）

8．受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後又は解除後速やかに発注者に返却し、又は引き渡さなければならない。ただし、発注者が、廃棄又は消去など別の方法を指示したときは、当該指示に従うものとする。なお、発注者の指示又は承諾により個人情報が記録された資料等を複写等した場合には、確実にそれらを廃棄又は消去するとともに、証明書（別紙－2）を発注者に提出しなければならない。

9．前項の規定は、発注者の指示又は承諾により第三者に個人情報の取り扱いを伴う事務を再委託する場合（二以上の段階にわたる委託を含む。）において準用する。

（管理の確認等）

10．発注者は、受注者における個人情報の管理の状況について適時確認することができる。また、発注者は必要と認めるときは、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告を求め、又は検査することができる。

（管理体制の整備）

11．受注者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定めなければならない。

（従事者への周知）

12．受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して

知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。

第５３条　作業区分

本工事の作業区分は、下記によるものとする。

作業区分	施工区分	標準作業時間
昼間作業	全工種	８：００～１７：００

上記については、積算上の条件明示であり、作業時間を指定するものではない。

標準作業時間には、日々の作業準備、後片付け、ＫＹ等安全活動なども含まれる。

ただし、上記区分に変更を要する場合は、監督職員と協議するものとする。

第５４条　時間的制約

本工事は当初発注時において１日８時間の作業時間の確保が可能であると想定しているが、工事に従事する者の現場への移動時間を考慮したときに１日８時間の作業時間を確保することが困難であると判断された場合においては、契約後に実際にかかる移動時間について必要に応じて監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

第５５条　新技術の活用「新技術の定義」

１．本工事は、新技術活用の促進を図ることを目的とした、新技術活用工事である。

２．新技術の定義

新技術活用の原則化における新技術の定義は以下による。

①　技術の成立性が技術を開発した民間事業者等により実験等の方法で確認されている技術

②　公共工事等において実用段階に達している技術

③　当該技術の適用範囲において従来技術に比べて活用の効果が同程度以上の技術又は同程度以上と見込まれる技術

④　実用段階に達していない技術又は要素技術など研究開発段階にある技術であって国により導入促進を図る技術

３．対象とする新技術

新技術活用の原則義務化の対象とする新技術は以下のとおりとする。

１）新技術情報提供システム（NETIS）登録技術　URL　https://www.netis.mlit.go.jp

２）NETIS のテーマ設定型の技術比較表に掲載されている技術

３）新技術導入促進（Ⅱ）型により活用する技術

４）新技術のニーズ・シーズマッチングにより現場実証し、従来技術と同等以上と確認できた技術

対象とする技術は、NETIS「マッチング」に掲載された技術のうち、「普及促進技術」に該当するものとする。

なお、NETIS 掲載期間終了技術は対象外とする。

第５６条　新技術の活用（施工者選定型）

１．本工事は、施工者が原則１技術以上の新技術を選択したうえで活用を図る新技術活用工事である。

２．本工事において、前条　新技術の活用「新技術の定義」３．対象とする新技術に示す１）～４）の技術が選定されていない場合、受注者は施工に先立ち、当該工事内容について十分把握の上、新技術を原則一つ以上選定し、監督職員の承諾を得た上で活用するものとし、活用する新技術の名称及び内容等を施工計画書に記載するものとする。活用する新技術がNETIS登録技術の場合は新技術活用計画書も提出するものとする。

３．受注者は、選定した新技術が前条　新技術の活用「新技術の定義」３．対象とする新技術に示す１）～４）のいずれの新技術であるか確認できるよう、施工計画書に記載する。

４．当該技術については、設計図書等で定められた事項に係る部分でない場合は、設計変更の対象としない。

５．受注者は、試行現場照会中の技術を活用する場合において当該技術の施工にあたりNETIS申請者が実施する「試行調査」に協力するものとする。なお、試行調査に係る費用はNETIS申請者が負担する。

６．試行現場照会中の技術を活用する場合、当該工事の実施箇所において標準的に使用される技術の施工費相当額を超える費用については、試行調査に係る費用とみなし、NETIS申請者の負担とする。

７．受注者は、活用する新技術が情報種別記号「－ＶＥ」以外のNETIS登録技術の場合は、当該技術の施工にあたり「活用効果調査」を行うものとする。「活用効果調査」は、「新技術情報提供システム(NETIS)」より作成し、監督職員に提出するものとする。

８．受注者は、本工事によって知り得た当該技術に係わる情報は、監督職員の許可なく公表してはならない。

第５７条　建設現場の遠隔臨場における遠隔臨場の実施（発注者指定型）

１．建設現場における遠隔臨場の実施

「建設現場における遠隔臨場の実施」は、受注者における「段階確認に伴う手待ち時間の削減や確認書類の簡素化」や発注者（監督員）における「現場臨場の削減による効率的な時間の活用」を目指し、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）とWeb会議システム等を介して「段階確認」、「材料確認」と「立会」の遠隔臨場を行うものとする。

なお､遠隔臨場の実施にあたっては｢建設現場における遠隔臨場に関する実施要領(案)R5.3」を参考に実施するものとする。

URL　https://www.mlit.go.jp/tec/content/001594449.pdf

２．遠隔臨場を適用する工種、確認項目

現場での適用・不適用については、受発注者間にて協議の上、適用する工種・確認項目を選定することとする。

３．実施内容

(1) 段階確認・材料確認、立会での確認

① 受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により取得した映像及び音声をWeb 会議システム等を介して「段階確認」、「材料確認」と「立会」を行うものとする。

② 確認実施者が現場技術員の場合、現場技術員は使用する PC にて遠隔臨場の映像（実施状況）を画面キャプチャ等で記録し、情報共有システム（ASP）等に登録して保管する。（従来の立会資料の管理と同様とする。）

(2) 動画撮影

動画撮影は、撮影者の安全を確保するため、撮影者が移動の際に横転等が考えられるいわゆる「歩きスマホ」（カメラを手に持って歩きながら撮影）での撮影はしないこと。

動画撮影は、静止して撮影又は撮影者のヘルメットや胸ポケットに付ける等の安全に配慮するものとする。

(3) 機器の準備

遠隔臨場に要する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）や Web 会議システム等は受注者が手配、設置するものとする。これによらない場合は監督職員等と協議し決定するものとする。

なお、配信に利用するシステムは、「パッケージ化したシステム」、「情報共有システム（ASP）」、「Web 会議システム（teams､zoom 等）」等、何れのシステムを利用してよい。

(4) 遠隔臨場を中断した場合の対応

電波状況等により遠隔臨場が中断された場合の対応について、事前に受発注者間で協議を行うものとする。対応方法に関しては、確認箇所を画像・映像で記録したものをメール等の代替手段で共有し、監督職員等は机上確認することも可能とする。

なお、本項目は受発注者間で協議し、別日の現場臨場に変更することを妨げるものではない。

(5) フォローアップ調査

工事完了時に別紙様式-１９を監督職員へ提出するものとする。

また、遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示によるものとする。

(6) 費用

遠隔臨場にかかる費用については、工事実施に必要な施工管理費として、全必要額を技術管理費に積み上げ計上し、設計変更するものとする。

なお、機器の手配は基本的にリースとし、その賃料を計上するものとするが、やむを得ず購入せざるを得ない機器がある場合は、その購入費に、機器の耐用年数に対する使用期間（日単位）割合を乗じた分を計上するものとする。また、受注者が所持する機器を使用する場合も、基本的には同様の考え方とするものとする。

(7) 不正行為

遠隔臨場において故意に不良箇所を撮影しない等の不正行為等を行った場合は、「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準　令和 7 年 12 月 12 日（国不建第 121 号）」等に従い、監督処分を実施する場合がある。

4．遠隔臨場の実施にあたり、現場の通信環境が不良と確認された場合は、対応策を検討の上、監督職員と協議を行うものとする。

第５８条　建設現場における遠隔臨場を活用した工事検査の実施

1．建設現場における遠隔臨場を活用した工事検査の実施

「遠隔臨場を活用した工事検査」は、受注者における「工事検査に伴う移動時間の削減や工事関係書類の簡素化」や発注者（監督職員・検査職員）における「現場実地（現場臨場）の削減による効率的な時間の活用」等を目指し、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ、360 度カメラ等）と Web 会議システム等を介して工事実施状況、出来形、品質と出来ばえの各検査項目を遠隔で行うものである。なお、遠隔臨場による工事検査は、『遠隔臨場による工事検査に関する実施要領（案）』の内容に従い実施する。

2．遠隔臨場を活用した工事検査の対象

遠隔臨場を活用した工事検査は、完成検査、中間技術検査、既済部分検査、完済部分検査における、工事実施状況、出来形、品質、出来ばえの各検査項目を対象とし、以下の表に示す。また、全ての検査を対象とするが、現場条件や、『遠隔臨場による工事検査に関する実施要領（案）』「7.3 検査項目の適応性」を踏まえ、従来方法（対面書類検査、現場実地検査）を選択することも可能である。

凡例○：遠隔臨場による工事検査の対象

	工事実施状況	出来形		品質		出来ばえ	
	書類	書類	実施	書類	実施	書類	実施
完成検査	○	○	○	○	○	○	○
中間技術検査	○	○	○	○	○	○	○
既済部分検査	○	○	○	○	○	○	○
完済部分検査	○	○	○	○	○	○	○

3．遠隔臨場を活用した工事検査を適用する検査項目

現場条件により遠隔臨場による工事検査の適応性が一致しない場合も想定されることから、検査項目での適用・不適用については、監督職員が検査職員と調整・決定し、受注者に遠隔臨場による工事検査を適用する検査項目を連絡する。遠隔臨場による工事検査を適用する検査項目については、『遠隔臨場による工事検査に関する実施要領（案）』「7.3 検査項目の適応性」を踏まえ判断する。

4．実施内容

(1) 技術検査、工事検査での実施

受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ、360 度カメラ等）により取得した映像及び音声を Web 会議システム等を介して工事実施状況、出来形、品質と出

来ばえの各検査を実施するものである。

(2) 機器の準備

遠隔臨場による工事検査に要する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ、360度カメラ等）や Web 会議システム等は受注者が手配、設置するものとする。これによらない場合は監督職員と協議し決定するものとする。

(3) 遠隔臨場による工事検査を中断した場合の対応

電波状況等により遠隔臨場による工事検査が中断された場合の対応について、事前に受発注者間で予備日を取り決めて検査日を連絡する。

(4) 効果の検証

遠隔臨場による工事検査を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。

(5) 費用

遠隔臨場による工事検査にかかる費用については、受発注者間の協議を踏まえ、技術管理費に積上げ計上する。なお、監督業務で遠隔臨場を実施する工事については、遠隔検査を行うために追加で要する費用が生じた場合に監督職員と協議するものとする。

(6) 不正行為

遠隔臨場による工事検査において故意に不良箇所を撮影しない等の不正行為等を行った場合は、『建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準 令和 7 年 12 月 12 日（国不建第 121 号）』等に従い、監督処分を実施する場合がある。

第５９条　契約後ＶＥ方式

１．「ＶＥ提案」とは、契約書第 19 条の２の規定に基づき、設計図書に定める工事の目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする工事材料、施工方法等に係る設計図書の変更について、受注者が発注者に行う提案である。

２．受注者がＶＥ提案を行う範囲は、設計図書に定められている内容のものとする。

３．以下の提案は、ＶＥ提案の範囲に含まないものとする。

(1) 施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴う提案。

(2) 契約書第 18 条に規定された条件変更等に該当する事実との関係が認められる提案。

(3) 提案の実施に当たり、関係機関協議等、第三者との調整等を要する提案。

４．受注者は、前項のＶＥ提案を行う場合は、次に掲げる事項をＶＥ提案書(別紙様式－１～４)に記載し、発注者に提出しなければならない。

(1) 設計図書に定める内容とＶＥ提案の内容の対比及び提案理由

(2) ＶＥ提案の実施方法に関する事項(当該提案に係る施工上の条件等を含む)

(3) ＶＥ提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額及び算出根拠

(4) 発注者が別途発注する関連工事との関係

(5) 工業所有権等の排他的権利を含むＶＥ提案である場合、その取扱いに関する事項

(6) その他ＶＥ提案が採用された場合に留意すべき事項

５．発注者は、提出されたＶＥ提案書に関する追加的資料、図書その他の書類の提出を受

注者に求めることができる。

6．受注者は、前項のＶＥ提案を契約の締結日より、当該ＶＥ提案に係る部分の施工に着手する３５日前までに、発注者に提出できるものとする。

7．ＶＥ提案の提出費用は、受注者の負担とする。

8．提出されたＶＥ提案は、施工の確実性、安全性が確保され、かつ設計図書に定める工事の目的物と比較し、機能、性能等が同等以上で経済性が優位であると判断されるものについては、ＶＥ提案として採用することを原則として審査を行い、当該提案の採否を決定するものとする。

9．ＶＥ提案の採否について、原則として、ＶＥ提案の受領後 14 日以内に書面(別紙様式－5)により通知するものとする。ただし、受注者の同意を得た上でこの期間を延長することができるものとする。また、ＶＥ提案を採用しなかった場合には、その理由を付して通知するものとする。

10．ＶＥ提案を採用した場合において、必要があるときは、発注者は設計図書の変更を行わなければならない。

11．前項の規定により設計図書の変更が行われた場合において、発注者は、必要があるときは請負代金額を変更しなければならない。

12．前項の変更を行う場合においては、ＶＥ提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の 10 分の 5 に相当する金額(以下「ＶＥ管理費」という。)を削減しないものとする。

13．ＶＥ提案を採用した後、契約書第 18 条の条件変更が生じた場合、発注者がＶＥ提案に対する変更案を求めた場合、受注者はこれに応じるものとする。なお、ＶＥ管理費については、原則として変更しないものとする。

14．評定の結果、当該ＶＥ提案内容の活用が効果的であると認められた場合は、他の工事においても積極的に活用を図るものとする。その場合、工業所有権等の排他的権利を有する提案については、当該権利の保護に留意するものとする。

第６０条　生産性向上チャレンジ工事

１．試行の実施

本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組みを推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。

２．試行の内容

工事契約後、受注者は、当該工事において、省人化等の生産性向上に資する取組みを実施することができる。

本取組みを実施する場合は、施工計画書に「生産性向上チャレンジ工事」の項目を設け、①取組内容、②期待される効果等を明記するものとし、完成検査までに実施内容及び効果を報告するものとする。また、期待される効果等について、人員削減や作業時間削減等の定量的な効果を記載できる場合は記載することとする。

なお、「第 55 条　新技術活用「新技術の定義」」において採用した取組については本試行の対象外とする。

３．工事成績評定

施工計画書で位置づけられた「生産性向上チャレンジ工事」の取組の履行が確認できた場合は加点を行うこととする。

４．本試行に係る費用については、原則、受注者負担によるものとする。

第６１条　出来高部分払方式

本工事の部分払は、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施し、円滑かつ速やかな工事代金の流通を確保することによって、より双務性及び質の高い施工体制の確保を目指すため、「出来高部分払方式実施要領」［国土交通省 HP　https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000052.html　参照］に基づき行うものとする。

第６２条　見積活用方式の試行について

本工事は、直接工事費及び共通仮設費の一部について、見積もりの提出を求める「見積活用方式」の試行工事である。

直接工事費に係わる以下のものについて、見積書の提出を求め、予定価格作成の為の参考とする工事である。

工　　種	種　　別	細　　別
床固め工	床固め本体工	D種コンクリート

見積採用工種等の変更については、他の工種と同様の扱いとする。

第６３条　建設資材調達に係る設計変更

資材については、安定的な確保を図るために、当初想定していた調達地域以外から調達せざるを得ないなどの理由により、見込んでいた単価と乖離が生じる場合、事前に監督職員と協議するものとする。また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出するものとし、必要と認められる費用については設計変更の対象とする。

第６４条　地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更について

１．本工事は、「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用（以下、実績変更対象費）について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。

営 繕 費：労働者送迎費、宿泊費、借上費（宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る）

労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用

２．受注者から請負代金内訳書の提出があった後、発注者は工事費構成書にて共通仮設費

及び現場管理費に対する実績変更対象費の割合を提示するものとする。

3．受注者は、当初契約締結後の単価合意を行う際に、前項で示された割合を参考にして実績変更対象費に係る費用の内訳を記載した実施計画書（様式１）を作成し、監督職員に提出するものとする。

4．最終精算変更時点において、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合は、変更実施計画書（様式２）及び実績変更対象費に実際に支払った全ての証明書類（領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など）を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。

5．受注者の責による工事工程の遅れ等受注者の責に帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。

6．実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、共通仮設費率分は、土木工事標準積算基準に基づく算出額から実施計画書（様式１）に記載された共通仮設費率分の合計額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。また、現場管理費は、土木工事標準積算基準に基づく算出額から実施計画書（様式１）に記載された現場管理費の合計額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。

なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって金額の変更を行うものとする。

7．受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。

8．疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

第６５条　直轄土木工事における賃金・労働時間等の実態調査（試行）（受注者希望方式）

1．本工事は、受注者の協力の下、賃金・労働時間・労務費（以下「賃金・労働時間等」という。）の実態を調査する試行工事である。

2．受注者は、契約締結後、賃金・労働時間等の実態調査に協力する意向がある場合には、実態調査に協力する工種・種別・細別（以下、「工種等」という。）を発注者へ報告するものとする。

3．発注者は、実態調査に協力する工種等の報告を受けた工種等より調査対象を選定するとともに、調査対象工種等の施工が完了した後、受注者は、別途監督職員より通知される実態調査要領に基づき資料を提出するものとする。

4．発注者は、提出された資料をもとに賃金、労働時間等の実施率・達成率を算出後、積算上の作業時間を示した資料を提出するとともに、賃金、労働時間等の実施率・達成率を工事完成検査後に受注者、下請業者（注文者）、下請業者（使用者）に通知するものとする。

第６６条　情報管理体制の確保

受注者は、本工事に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報であって、発注者が保護を要さないことを同意していない一切の非公表情報（以下「要保護情報」という。）

を取り扱う場合は、当該情報を適切に管理するため、土木工事共通仕様書 1-1-1-6 に基づく施工計画書の現場組織表において、別紙様式－１８を参考に、情報取扱者名簿及び情報管理体制図を記載し、発注者の同意を得なければならない。また、記載内容に変更が生じた場合も、同様に作成の上、あらかじめ発注者の同意を得なければならない。

・受注者は、要保護情報を情報取扱者以外には秘密とし、また、本工事の施工以外の目的に使用してはならない。
・受注者は、要保護情報を本工事の終了後においても第三者に漏らしてはならない。
・要保護情報は、アクセス制限、パスワード管理等により適切に管理するとともに、発注者の許可なく複製・転送等しないこと。
・受注者は、本工事完了時に、要保護情報について、発注者への返却若しくは消去又は破棄を確実に行うこと。
・受注者は、要保護情報の外部への漏えい若しくは目的外利用が認められ又そのおそれがある場合には、これを速やかに発注者に報告すること。なお、報告がない場合でも、情報の漏えい等の懸念がある場合は、発注者が行う報告徴収や調査に応じること。

第２章　　土　工

第６７条　一般事項及び土の分類

１．発生材については、関係法令等を遵守し、適切に処理するものとする。
２．本工事で掘削する土の分類は、以下のとおりとする。
　　分類　土砂：礫質土

第６８条　建設発生土の受け入れ地

１．発生土は、現場内にて処理するものとする。
　　なお、詳細な位置、整地及び後片付け等については監督職員の承諾を得るものとする。
２．工事発注後に明らかになったやむをえない事情により、上記の指定により難い場合は、監督職員と協議するものとする。

第３章　　無筋・鉄筋コンクリート

第６９条　レディーミクストコンクリート

１．コンクリートは、レディーミクストコンクリートを原則とし、下記の仕様によるものとする。

用　　途	記号	施工基準強度 (N/mm2)	スランプ	セメントの種類	粗骨材の最大寸法	水セメント比等
提冠部	A	27.0以上	5±1.5cm	高炉Ｂ種	40mm	W/C 50%以下

床固め本体工	D	24.0以上	5±2.5cm	高炉Ｂ種	40mm	W/C 60%以下

ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。

本工事の特記仕様書、数量総括表及び図面に記載されたスランプは、積算上の参考値である。

現場打ちの鉄筋コンクリート構造物の施工にあたっては、「流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関するガイドライン（平成29 年3 月）」を基本とし、構造物の種類、部材の種類と大きさ、鋼材の配筋条件、コンクリートの運搬、打込み、締固め等の作業条件を適切に考慮し、スランプ値を設定するものとする。契約後に受発注者間でスランプ値の確認を行い、施工条件等により、協議の上、スランプを指定することができる。

ただし、（1） 使用するコンクリートの単位水量、単位セメント量、水セメント比を配合計画書により確認する（2）使用するコンクリートの目標スランプが12cm を超える場合には、（1）に加え、試し練りを行い材料分離抵抗性を確認すること。

2．コンクリートの耐久性向上の対策は「コンクリートの耐久性向上」仕様書(土木編)(平成14年8月一部改正)により行うものとする。

第７０条　配合

水セメント比については、示方配合表により監督職員の確認を得なければならない。

なお、水セメント比を減じることにより施工性が著しく低下する場合は、必要に応じて、高性能減水剤の使用等を検討しなければならない。また、下記構造物については適用除外とする。

・仮設構造物(建設後数年の内に撤去するもの。)
・最大高さ1m 未満の擁壁・水路・側溝及び街渠等の構造物。
・管(函)渠等(φ600 未満、600mm×600mm 未満)の構造物。
・道路照明、標識、防護柵等の構造物。
・耐久性を期待しない構造物。
・河川における護岸構造物(特殊堤及び船着場等は除く。)

第７１条　現場練りコンクリート

鉄材コンクリートの示方配合は下記の仕様によるものとする。

構造物名	記号	粗骨材の最大寸法	スランプ	水ｾﾒﾝﾄ比	単位ｾﾒﾝﾄ量	混和材量（鉄材）	セメントの種類
堤冠の上下流肩部	G	25mm	1±1.0cm	W/C 50%以下	310kg/m3	310kg/m3	高炉Ｂ種

但し、これにより難い場合は、監督職員と協議しなければならない。

第７２条　レディーミクストコンクリート単位水量測定

本工事においては、1 日当たりレディーミクストコンクリートの使用量が 100m3 以上施工するコンクリート工において、「レディーミクストコンクリートの品質確保について(平成 15 年 10 月 2 日、国官技第 185 号)」、「「レディーミクストコンクリートの品質確保について」の運用について(平成 15 年 10 月 2 日、国コ企第 3 号)」及び「レディーミクストコンクリート単位水量測定要領(案)」(以下、測定要領という)(これらについて、受注者が所持しない場合は工事契約後に受注者から監督職員に通知を求めるものとする。)に基づき、施工管理を行い、その記録及び関係書類を直ちに作成、保管し、完成検査時に提出しなければならない。ただし、それ以外で監督職員から請求があった場合は直ちに提示しなければならない。測定機器は測定要領の「２．測定機器」によるものとするが、現場条件により発注者から測定機器を指示する場合がある。又、使用する機器を施工計画書に記載するものとする。

単位水量の測定は、測定要領の「６．測定頻度」及び「７．管理基準値・測定結果と対応」により実施することとする。なお、これらに定められてない場合は監督職員と協議するものとする。

第２編　　土木工事共通編

第１章　　総　　則

第７３条　現場技術員

本工事は、現場技術員の配置対象工事であり、現場技術業務を建設コンサルタント等に委託する予定としている。

第７４条　施工体制調査員

本工事は、現場における施工体制の点検補助を建設コンサルタント等に委託する予定としている。

また、本工事の施工体制の点検を担当する施工体制調査員の氏名は、別途監督職員より通知する。

なお、施工体制調査員は、工事の情報共有システム（ＡＳＰ）により電子書類を閲覧し、点検を行うため、施工体制調査員を情報共有システム（ＡＳＰ）のユーザーに登録するものとする。（「閲覧のみ可能」で登録）

第７５条　施工体制の点検

１．受注者は「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成 12 年法律第 127 号　最終改正令和 6 年 12 月 13 日)第 15 条 3 により発注者から施工体制について点検を求められたときは、これを受けることを拒んではならない。

２．施工体制の点検員は当該工事の監督職員、施工体制調査員及び発注担当事務所の職員である。

３．施工体制調査員は、業務証明書を携帯し、胸に委託業務名、委託先、業務職（施工体

制調査員）、氏名、顔写真の入った名札を着用している。

4．当該工事の監督職員及び発注担当事務所の職員は、所属、氏名、顔写真の入った名札を着用している。

5．施工体制調査員は、施工体制の点検を行う者で、指示等の権限は有しない。

6．施工体制調査員は、電子書類の点検を工事の情報共有システム（ＡＳＰ）により「閲覧」し、点検する。

7．施工体制調査員は、第１回目の現地点検は現地で点検するが、以降の点検は、映像により点検が可能な項目は、必要に応じ、工事の受注者が導入しているＷＥＢ会議や遠隔臨場システムを活用し、点検することを可能とする。

ただし、立会や打合せ等においてＷＥＢ会議や遠隔臨場システムを導入していない工事や現地での点検を希望する工事は、従来通り、現地で点検する。

第７６条　監督職員による検査(確認を含む)及び立会等

受注者は、下記の工種の施工段階においては、段階確認を受けなければならない。この際、受注者は、種別、細別、確認の予定時期を監督職員に書面により報告しなければならない。

ただし、段階確認の実施時期及び実施箇所は監督職員が定めるものとする。

種　　別	細　　別	確認時期
作業土工	床掘（掘削(砂防)）	土質の変化した時
床固め工		法線設置完了時（床掘完了時）

第７７条　品質証明

本工事は、品質証明対象工事とする。なお、提出様式は別紙様式－１２によるものとする。

第７８条　工事完成図書の納品

1．本工事は電子納品対象工事とする。電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。ここでいう電子成果品とは、「工事完成図書の電子納品等要領(令和５年３月)：(以下「要領」という。)」に基づいて作成した電子データを指す。

「要領」で特に記載がない項目については、原則として電子データを提出する義務はないが、「要領」の解釈に疑義がある場合は監督職員と協議の上、電子化の是非を決定する。なお、電子納品の運用にあたっては、「電子納品等運用ガイドライン【土木工事編】（令和６年３月）」を参考とするものとする。

2．本工事は「オンライン電子納品実施要領」に基づき、オンライン電子納品を行うものとする。

オンライン電子納品は、発注者が用意した電子納品保管管理サーバへのオンラインによる納品を原則とする。なお。オンラインによる納品が実施できない場合は、監督職員と協議の上、電子媒体に格納して納品するものとする。

３．成果品の提出の際には、電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウィルス対策を実施したうえで提出すること。

第７９条　技術検査

１．本工事は、中間技術検査対象工事とし、実施回数は２回以上を原則とする。なお、工事成績優秀企業の適用工事にあたっては、減免することが出来るものとする。但し、低入札価格調査制度対象工事となった工事及び監督強化価格対象工事については、減免の適用の対象外とする。

２．中間技術検査の実施時期は、完成、既済部分(完済を含む)の検査時期及び当該工事の主要工種を考慮し、施工上の重要な変化点で行うことを原則とする。実施時期は、監督職員が選定するものとし、監督職員は、受注者に対して書面をもって検査日及び検査職員名を通知するものとする。

３．中間技術検査は、上記を標準として実施することとするが、中間技術検査の主旨を踏まえ、現場条件、工事規模、内容、工期等を考慮して、実施時期、実施回数を変更することが出来る。

第８０条　書類限定検査

１．本工事は、検査に必要な書類を限定し、監督職員と技術検査官の重複確認廃止の徹底及び受注者における説明用資料等の書類削減により効率化を図る「書類限定検査」の対象である。

２．書類限定検査とは、検査時に下記の１０書類に限定して資料検査を行うものとする。

①　施工計画書	⑥　出来形管理図表
②　施工体制台帳（下請引取検査書類を含む）	⑦　品質管理図表
③　工事打合せ簿（協議）	⑧　品質規格証明資料
④　工事打合せ簿（提出）	⑨　品質証明書
⑤　工事打合せ簿（承諾）	⑩　工事写真

なお、以下の工事については対象外とする。

・「低入札価格対象工事」又は「監督体制強化工事」は対象外

・施工中、監督職員より文書等により改善指示が発出された工事は対象外

３．実施状況や改善点等を把握するためのアンケートに協力する。

第８１条　ウィルス対策

受注者は、電子納品時のみならず、監督職員に工事に関する事項について電子データを提出する際には、ウイルス対策を実施した上で提出しなければならない。また、ウイルスチェックソフトは常に最新データに更新（アップデート）しなければならない。

第２章　　一般施工

第８２条　作業土工（床掘り・埋戻し）

１．埋戻し場所は、構造物設置のために掘削した箇所とする。

２．埋戻し高については、監督職員の承諾を得るものとする。

３．前項１の埋戻し場所のうち、締固めを要する箇所は、構造物の基礎、背面及びその他監督職員の指示する箇所とする。

４．締固めは、一層４０㎝以内に敷均し、次のいずれかの方法又は、監督職員の承諾を得た方法で締固めなければならない。

(1) ブルドーザ１５ｔ以上の場合は５回以上、２１ｔ以上の場合は４回以上。

(2) 振動ローラー２．５ｔ以上の場合は５回以上。

(3) タンパ６０～１００kg の場合は５回以上。

５．埋戻し材料・盛土材料は掘削土砂・河床材料とし、監督職員の承諾を得たものとする。

第８３条　立木の伐採

１．本工事で支障となる樹木については、本工事で伐採及び処分を行うものとする。なお、伐木および伐木処分に要する費用については見込んでいないので、受注者は木材の処理方法等について監督職員と協議するものとする。必要と認められる費用については設計変更の対象とする。

２．有価物が発生する場合は、監督職員と協議すること。

第８４条　工事用道路工

１．仮道路及び既設の工事用道路等は、工事期間中適切な管理を行い利用するものとする。

２．既設の市道等の補修等が必要な場合は、監督職員と協議するものとする。

３．工事用道路は、工事終了後撤去し、原形に復するものとする。

４．上記により難い場合は協議するものとする。

第８５条　砂防仮締切工

１．本工事の工事用道路、砂防仮締切及びその他の仮設備等に関する仮設にあたっては、現地の状況を十分把握し、安全性、経済性、細部構造等については受注者においては十分検討を行い、受注者の責任において決定し、施工するものとする。

２．本工事における仮締切工は大型土のう締切を予定しているが、これによりがたい場合は監督職員と協議するものとし、必要と認められる費用については設計変更の対象とする。

３．砂防仮締切について以下の条件を満たしているものとする。

（１）設計対象流量は、次表のとおりとする。

対象時期	対象流量
１月～２月、１１月～１２月	１．７　ｍ３／sec
３月～５月	３．５　ｍ３／sec

６月	５．２　ｍ３／sec
７月～１０月	６．９　ｍ３／sec

（２）原則として、仮排水路のために下流の岩盤を掘削してはならない。

第８６条　施工継目

床固め工の施工継ぎ目は、以下の位置に設けるものとするが、これにより難い場合は監督職員と協議するものとする。

・床固め工：Ｒ１．０

第８７条　資機材運搬

本工事においては、資機材運搬用としてケーブルクレーン設備を見込んでいる。設備の細部構造等については、受注者において現地の状況、安全性、経済性等を十分検討を行い、受注者の責任において決定し、施工するものとする。

第８８条　人員輸送

本工事においては、人員輸送用としてモノレール設備を見込んでいる。

なお、細部構造等については、受注者において現地の状況、安全性、経済性等を十分検討を行い、受注者の責任において決定し、施工するものとする。

第３章　　その他

第８９条　震災対策

１．地震発生等の天災に備えて、あらかじめその対応策を定めておくものとする。

２．地震注意情報等が発令された場合は、直ちに工事を中断し、その情報に応じた適切な保全措置等を講ずるものとする。

第９０条　地震発生後の建設工事現場の点検について

地震発生後の建設工事現場の点検実施及び報告時期については、以下によることとする。

①　気象庁地震計で震度４の地震が発生した場合。

イ）現場稼働日（開庁日）の夜間に発生した場合には、翌現場稼働日（開庁日）の始業時に点検。異常があった場合は直ちに監督職員に報告。異常が無い場合は、開庁日に速やかに監督職員へ報告。

ロ）現場休工日（閉庁日）に発生した場合には、翌現場稼働日（開庁日）の始業時に点検。異常があった場合は直ちに監督職員に報告。異常が無い場合は、開庁日に速やかに監督職員へ報告。

※開庁日に現場が休工であった場合は開庁日を優先して判断し建設工事現場の点検を行うこと。

②　気象庁地震計で震度５弱以上の地震が発生した場合。

夜間・現場休工日（休祭日）に関わらず直ちに点検。点検結果については、速やかに監督職員へ報告。

第９１条　土石流に対する安全対策

１．安全対策の検討のための資料提供

検討のために以下の資料を貸与する。

(1) 流域面積・河床勾配・最新及び過去の災害時の航空写真（の撮影者・撮影時期）

(2) 過去の土砂災害発生年月、災害状況写真、災害時の降雨量、最新の崩壊分布図

２．安全対策設備

安全対策として必要な仮設備の仮設にあたっては、請負者自らの責任において、現地状況を十分に把握し安全性、経済性及び細部構造等について十分に検討を行ったうえ、必要な安全対策設備を施工するものとする。なお、当初において安全対策設備費として土石流センサー等の設置に要する費用は計上していないが、協議のうえ、契約変更の対象とする。

第９２条　工事現場における説明性の向上

受注者は、事業名、事業の目的・内容・効果、工事名、工事内容、連絡先を記した工事説明書を作成し、近隣住民等から事業内容等の説明を求められた場合は、工事の安全確保に支障のない範囲において、当該工事説明書を配布する等、工事現場の説明性の向上を図るものとする。

また、受注者は、工事現場作業員に対し、工事内容及び事業目的・効果を周知するものとする。

第９３条　特定外来生物の対応

本工事施工にあたり、工事区域内で「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」による特定外来生物が確認された場合は、速やかに監督職員に報告するものとし、対応については監督職員の指示によるものとする。

第９４条　現場における留意事項

施工を行うにあたって、以下の事項について留意すること。

１．施工を行うに当たっては、地層構造や地山の劣化状態を調査し、崩壊等の危険性について詳細に確認・検討すること。また、過去及び現在の地山の崩壊等の状況、作業箇所の形状等にも注意した上で危険性を判断すること。

２．崩壊等の危険性が高い場所での作業に当たっては、崩壊等の危険がある部分を確実に取り除く等した上で行うこと。

３．法面等において作業を行う場合は、万一の崩壊に備え、その日の作業開始前や異常時の地山の点検を適正に行って施工するほか、関係法令の遵守に加え、作業員の安全確保に万全を期すこと。

４．以上の事項については、関係作業員のみならず、関係請負人及び関係請負人の作業員

を含めた関係者へも周知徹底を図ること。

５．上記４項目に対し実施する内容については、施工計画書を提出するものとし、必要と認められるものについては、契約変更の対象とする。

別紙－１

明示項目及び明示事項

明示項目	明示事項	記載条項
工程関係	□ 施工時期、施工時間及び施工方法が制限される場合は、制限される施工内容、施工時期、施工時間及び施工方法。 □ 余裕工期を設定して発注する工事については、工事の着手時期。 □ 設計工程上見込んでいる休日日数等作業不能日数。	第４０条、第４８条、第５３条 第４８条 第４８条
公害関係	□ 工事に伴う公害防止（騒音、振動、粉塵、排出ガス等）のため、施工方法、建設機械・設備、作業時間等を指定する必要がある場合は、その内容。	第４５条
安全対策関係	□ 鉄道、ガス、電気、電話、水道等の施設と近接する工事での施工方法、作業時間等に制限がある場合は、その内容。 □ 落石、雪崩、土砂崩落等に対する防護施設が必要な場合は、その内容。 □ 交通誘導員、警戒船及び発破作業等の保全設備、保安要員の配置を指定する場合又は発破作業等に制限がある場合は、その内容。	第４２条、第４５条 第３７条 第３７条、第４１条
工事用道路関係	一般道路を搬入路として使用する場合 □ 搬入路の使用中及び使用後の処置が必要である場合は、その処置内容。 仮道路を設置する場合。 □ 仮道路に関する安全施設等が必要である場合は、その内容、期間。 □ 仮道路の工事終了後の処置（存置又は撤去）。 □ 仮道路の維持補修が必要である場合は、その内容。	第８４条 第８４条 第８４条 第８４条
仮設備関係	□ 仮設備の設計条件を指定する場合は、その内容。	第８４条、第８５条
建設副産物関係	□ 建設発生土が発生する場合は、残土の受入場所及び仮置き場所までの距離、時間等の処分及び保管条件。 □ 建設副産物及び建設廃棄物が発生する場合は、その処理方法、処理場等の処理条件。	第６８条 第２５条

様式１

実績変更対象費に関する実施計画書

費　目		費　用	内　容	計上額
共通仮設費	営繕費	借上費	現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要した地代及び建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げした場合に要した費用	
		宿泊費	労働者が、旅館、ホテル等に宿泊した場合に要した費用	
		労働者送迎費	労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送（水上輸送を含む）をするために要した費用（運転手賃金、車両損料、燃料費等含む）	
	小　計			
現場管理費	労務管理費	募集及び解散に要する費用	労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当	
		賃金以外の食事、通勤等に要する費用	労働者の食事補助、交通費の支給	
	小　計			
合　計				

様式２

実績変更対象費に関する変更実施計画書

費目		費用	内容	当初計上額	変更計上額	差額
共通仮設費	営繕費	借上費	現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要した地代及び建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げした場合に要した費用			
		宿泊費	労働者が、旅館、ホテル等に宿泊した場合に要した費用			
		労働者送迎費	労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送（水上輸送を含む）をするために要した費用（運転手賃金、車両損料、燃料費等含む）			
	小計					
現場管理費	労務管理費	募集及び解散に要する費用	労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当			
		賃金以外の食事、通勤等に要する費用	労働者の食事補助、交通費の支給			
	小計					
合計						

別紙－5

概略工事工程表

工事名 ： R8般若沢第4床固改築工事

工種	単位	数量	令和8年度 10月	11月	12月	1月	2月	3月	令和9年度 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	令和10年度 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	備考
準備工	式	1	余裕期間																											・30日間
砂防土工	式	1	※任意で設定可能																											・1pt
床固め本体工	式	1																												・1pt ・2pt（コンクリート削孔）
構造物撤去工	式	1																												・1pt
仮設工	式	1																												・1pt
後片付け	式	1																												・20日間
制約条件 ・お盆 ・年末年始		－																												・8月中旬 ・1月上旬～3月下旬

＜関係機関協議＞

工事着手にあたっての関係機関協議、地元説明は、発注者が主体となって実施します。

〈余裕期間制度（フレックス）の活用について〉

本工事は、受注者の円滑な工事施行体制の確保を図るため、事前に建築資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、発注者があらかじめ設定した全体工期（余裕期間と工期を合わせた期間）の内で、受注者は工事の始期と終期を任意に設定することができます。

なお、工事の始期までの余裕期間は、監理技術者の配置が不要となります。

位　置　図　1:50,000





工事名	Ｒ８般若沢第４床固改築工事						
図面名	位　置　図						
縮　尺	1:50,000	図面番号	12 の 1				
年月日	令和　8 年　7 月　日						
所長		副所長		課長		係長		設計	

国土交通省　日光砂防事務所

平面図 S=1:500

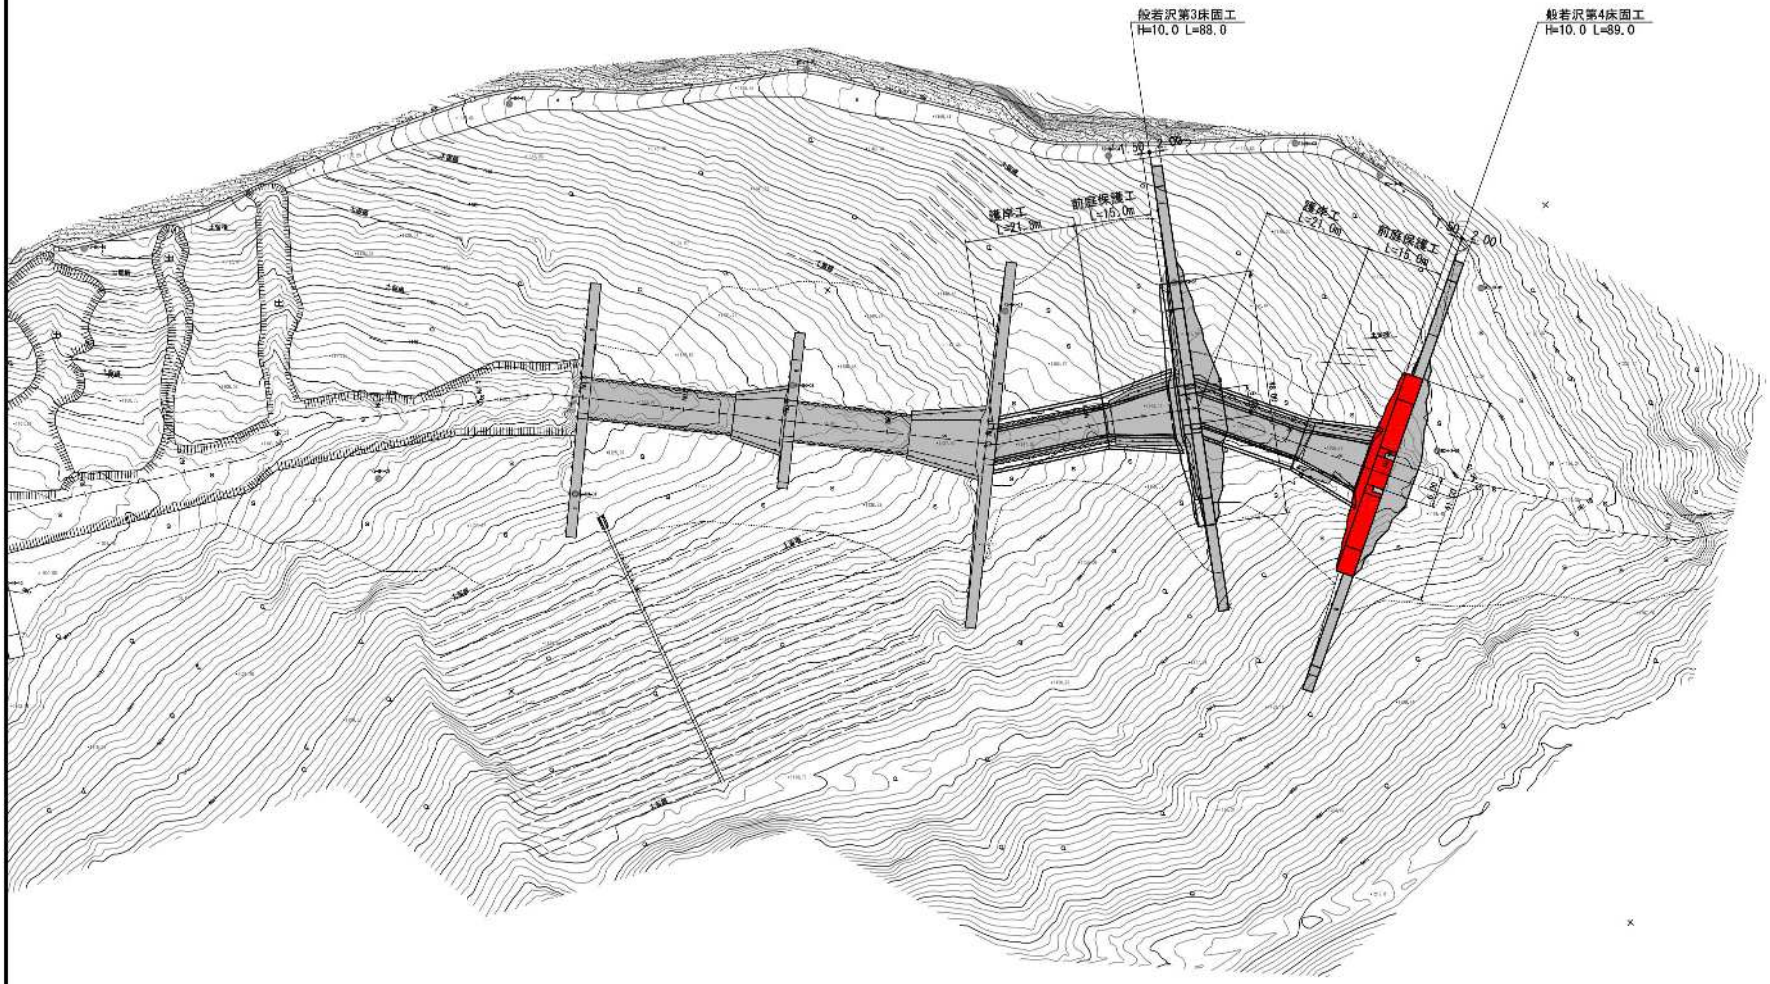

凡例	
	今回施工箇所
	施工済箇所

本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります

工事名	R8般若沢第4床固改築工事		
図面名	平面図		
縮尺	1:500	図面番号	12 の 2
年月日	令和 8 年 7 月 日		
会社名	大日本コンサルタント株式会社		
事務所名	国土交通省 日光砂防事務所		

縦断図 V=1:200 H=1:500

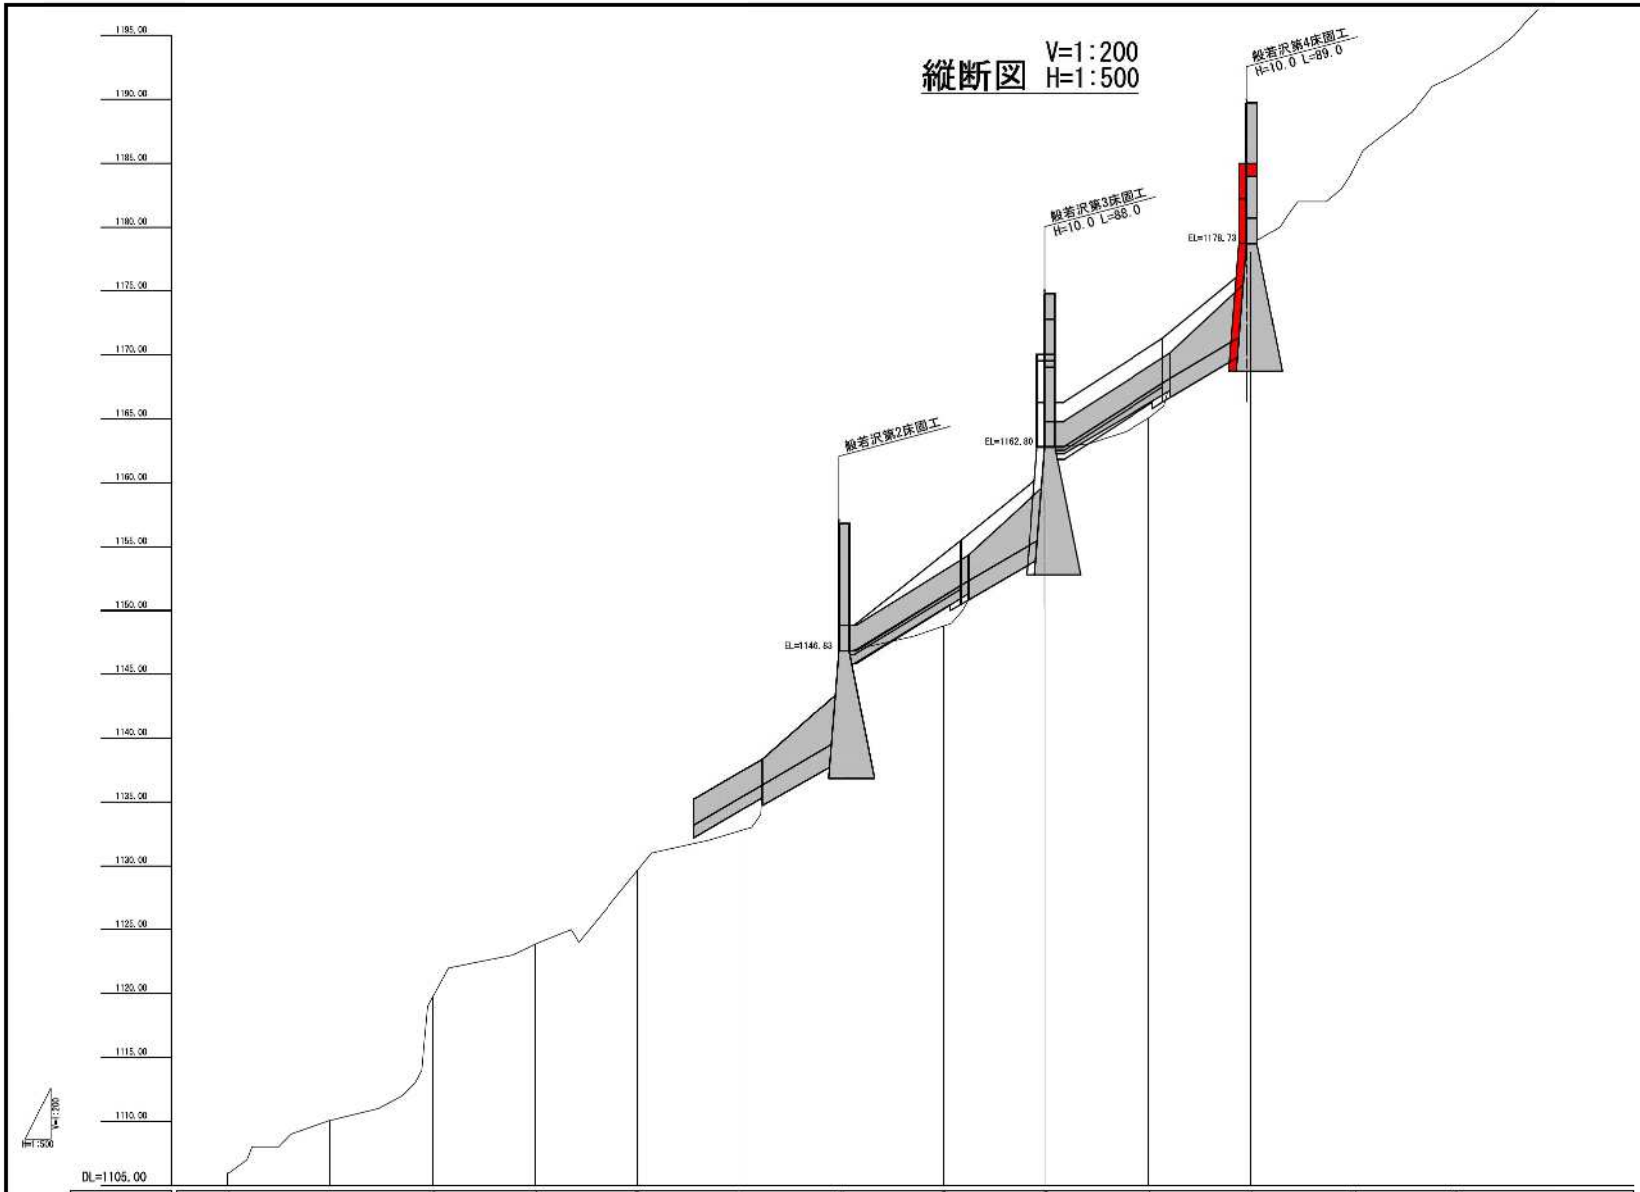

本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります

凡例	
	今回施工箇所
	施工済箇所

工事名	R8般若沢第4床固改築工事		
図面名	縦断図		
縮尺	V=1:200 H=1:500	図面番号	12 の 3
年月日	令和8年7月 日		
会社名	大日本コンサルタント株式会社		
事務所名	国土交通省 日光砂防事務所		

床固工構造図 S=1:200

（第４床固工）

本堤正面図

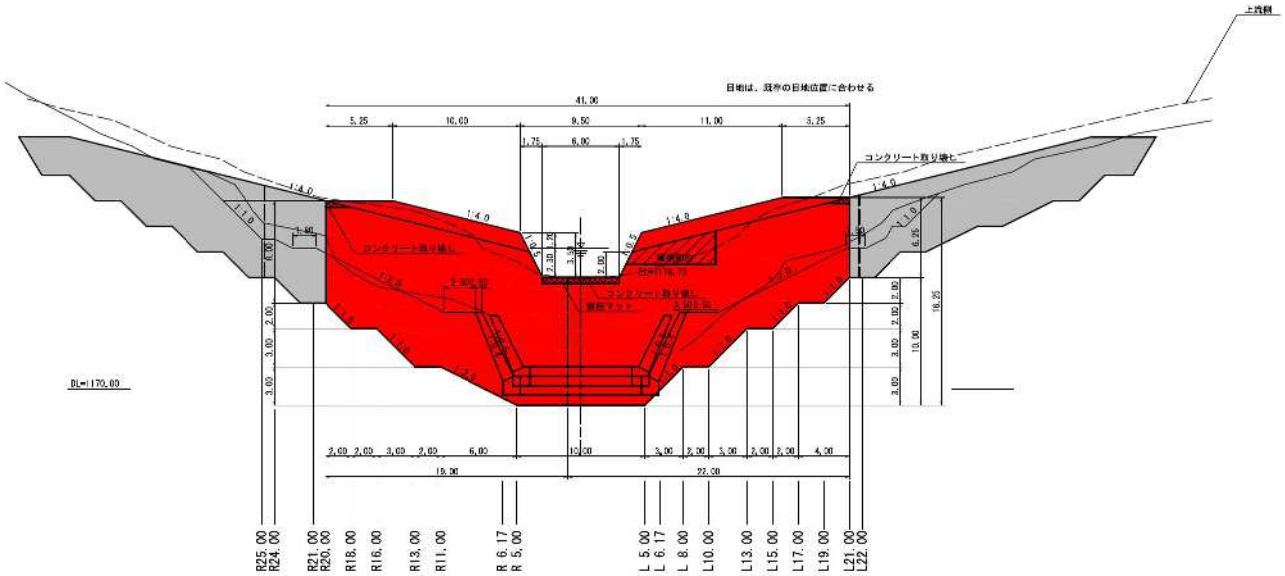
上流側
目地は、既存の目地位置に合わせる
41.00
5.25
10.00
9.50
11.00
5.25
1.75
6.00
1.75
コンクリート取り壊し
1:1.0
1:1.5
1:1.8
1:1.0
1:1.5
1:1.8
1:1.0
1:1.5
1:1.8

堤冠コンクリート詳細図 S=1:100

A種コンクリート

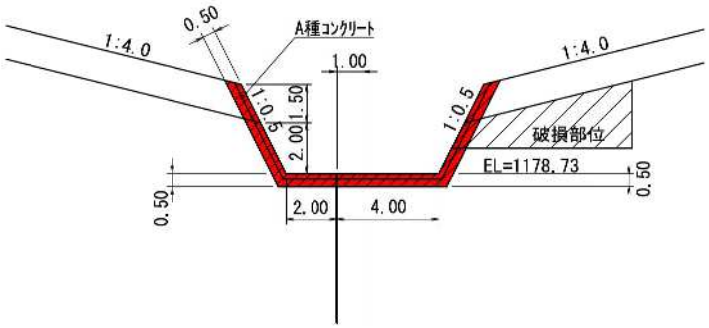

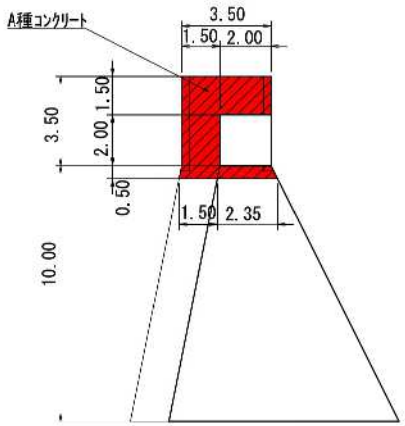

G種コンクリート

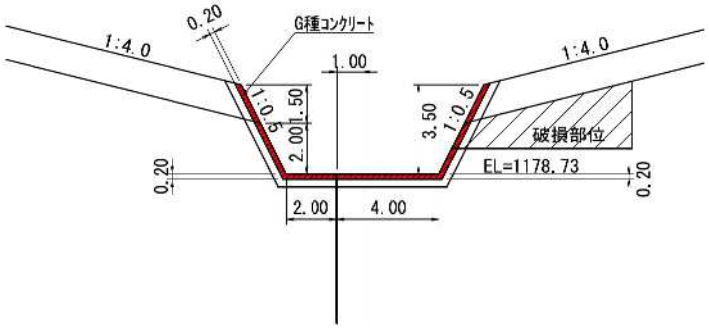

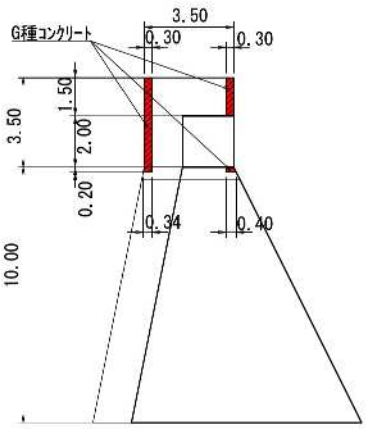

凡例	
	今回施工箇所

本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります

工事名	R8般若沢第4床固改築工事
図面名	堤冠コンクリート詳細図
縮尺	1:100
図面番号	12 の 5
年月日	令和 8 年 7 月 日
会社名	
事務所名	国土交通省 日光砂防事務所

補強鉄筋詳細図
（第４床固工）

本堤正面図 S=1:200

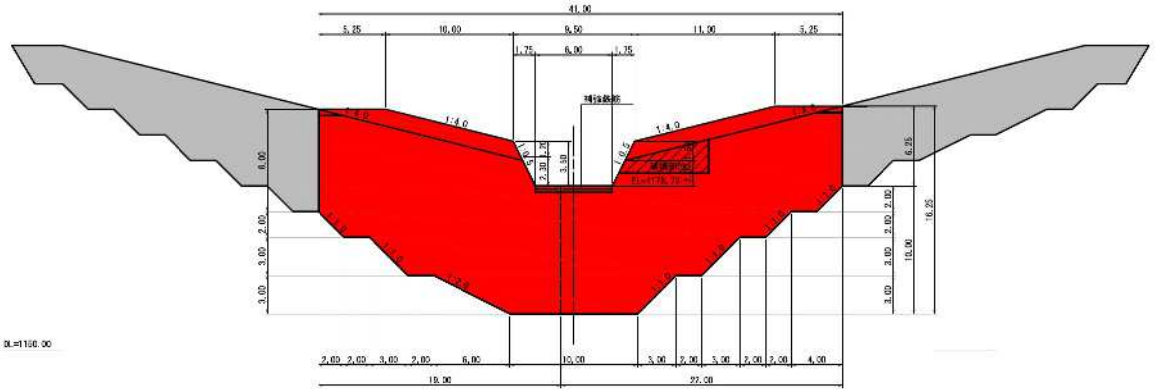

本堰堤水通し断面図 S=1:100



本堰堤水通し平面図 S=1:100

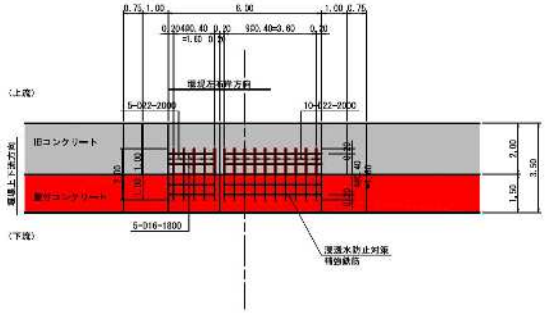

本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります

凡　例	
	今回施工箇所
	施工済箇所

工事名	R８般若沢第４床固改築工事		
図面名	補強鉄筋詳細図		
縮　尺	図示	図面番号	12 の 6
年月日	令和８年７月　日		
会社名	大日本コンサルタント株式会社		
事務所名	国土交通省　日光砂防事務所		

差筋詳細図 S=1:200
（第４床固工）

本堤正面図 S=1:200

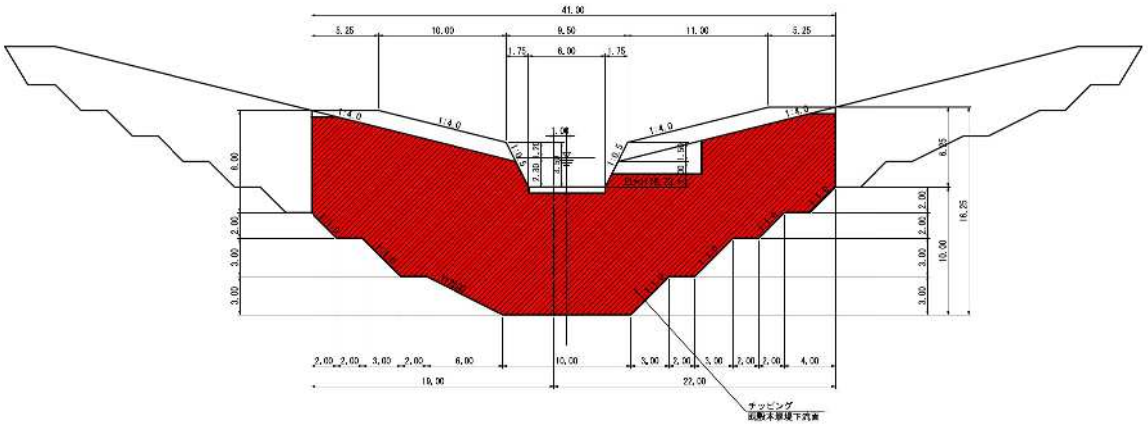

側面図 S=1:200

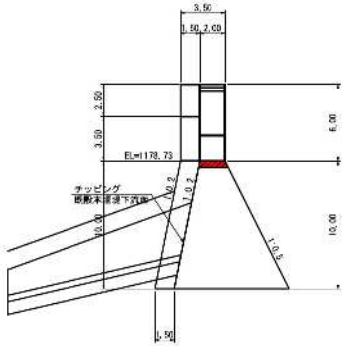

平面図 S=1:200

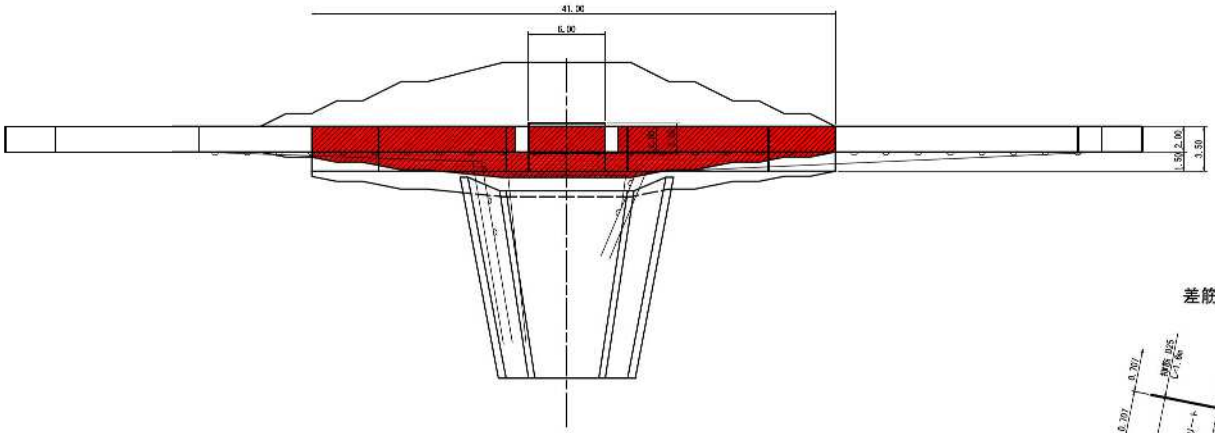

用心鉄筋配置図 S=1:200

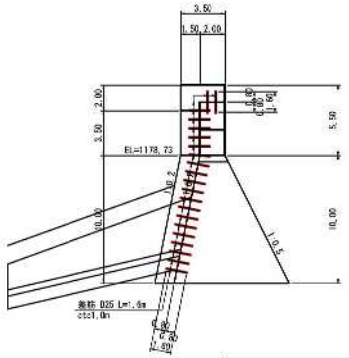

差筋詳細図 S=1:50



凡　例
今回施工箇所
施工済箇所

本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります

工事名	R８般若沢第４床固改築工事		
図面名	差筋詳細図		
縮尺	図示	図面番号	12 の 7
年月日	令和８年７月　日		
会社名	大日本コンサルタント株式会社		
事務所名	国土交通省　日光砂防事務所		

残存型枠区分図
（第４床固工）

下流側正面図　S=1:100

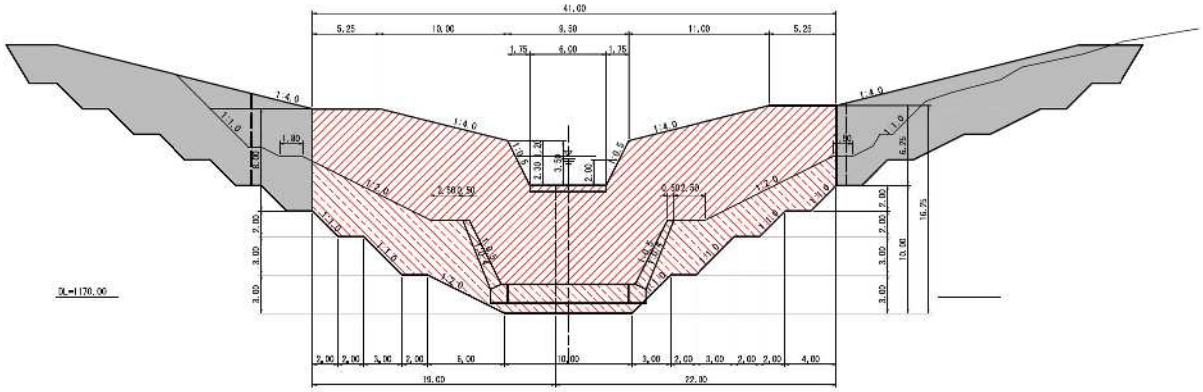

上流側正面図　S=1:100

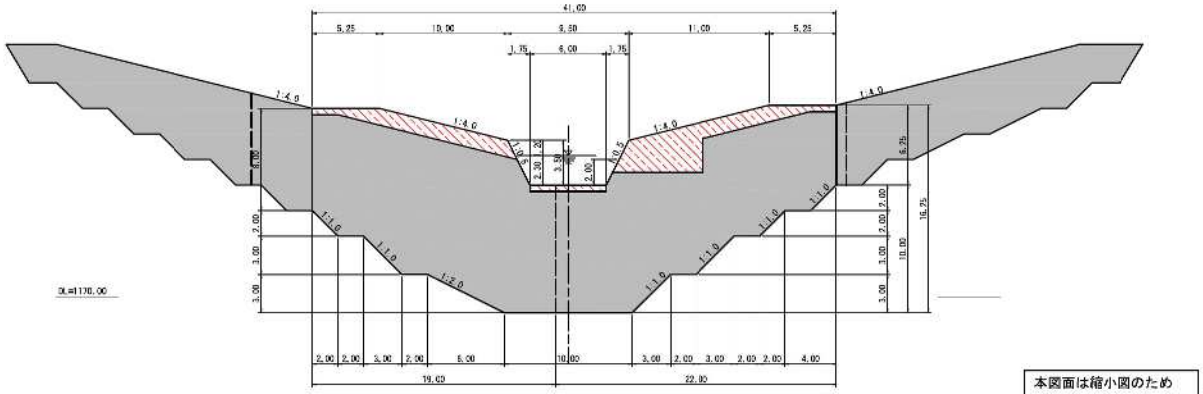

本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります

凡　例
残存滑面型枠
残存型枠
施工済箇所

工事名	R８般若沢第４床固改築工事
図面名	残存型枠区分図
縮尺	図示　図面番号　12 の 8
年月日	令和８年７月　日
会社名	
事務所名	国土交通省　日光砂防事務所

横断図（１） S=1:200

（第４床固工）

R24.00

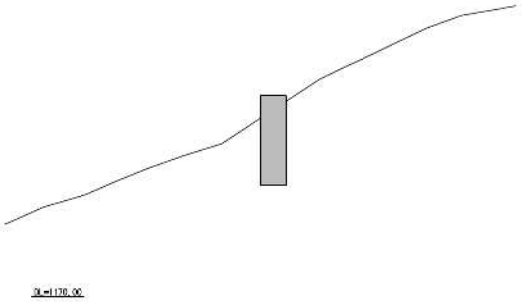

R18.00

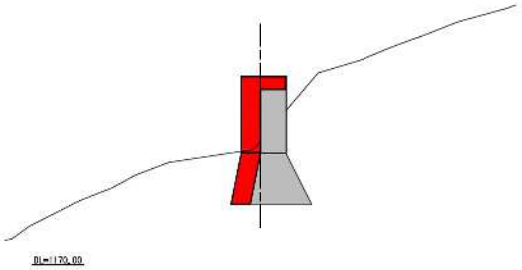

R11.00

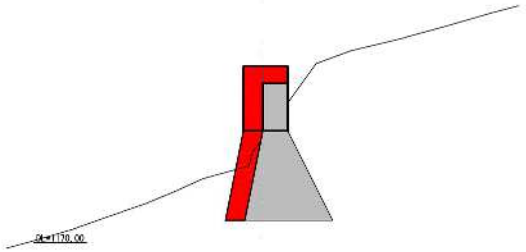

R25.00

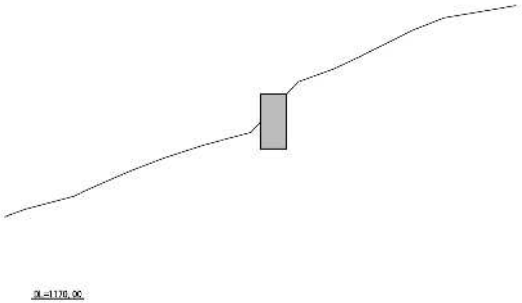

R20.00

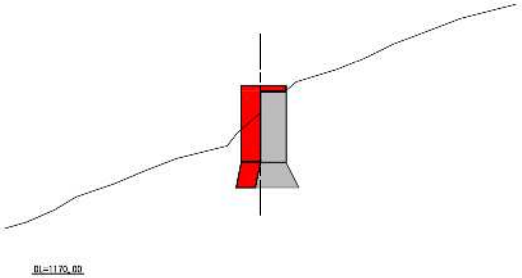

R13.00

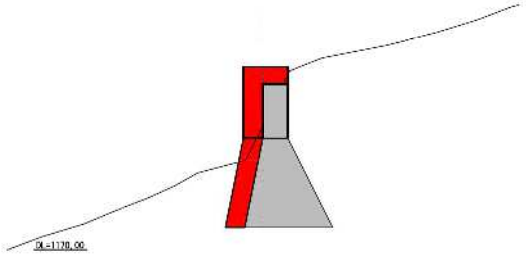

R27.74

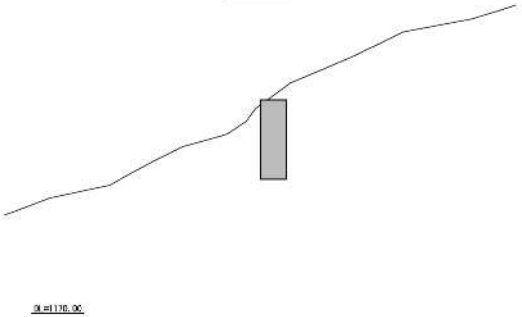

R21.00



R16.00

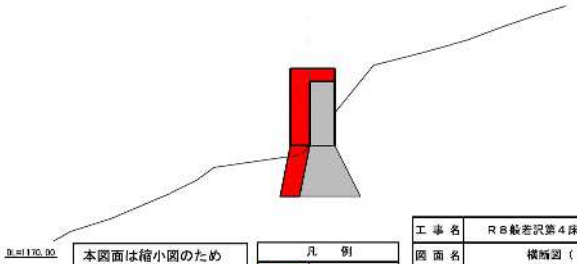

本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります

凡　例	
	今回施工箇所
	施工済箇所

工事名	R８般若沢第４床固改築工事		
図面名	横断図（１）		
縮　尺	1:200	図面番号	12 の 9
年月日	令和８年７月　日		
会社名	大日本コンサルタント株式会社		
事務所名	国土交通省　日光砂防事務所		

横断図（２） S=1:200

（第４床固工）

CL

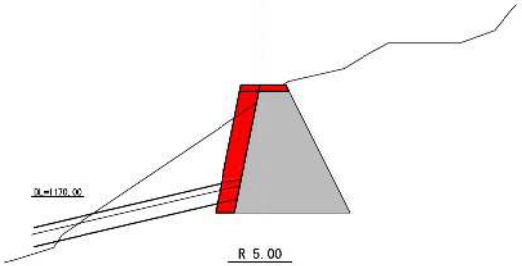

L 8.00



L15.00

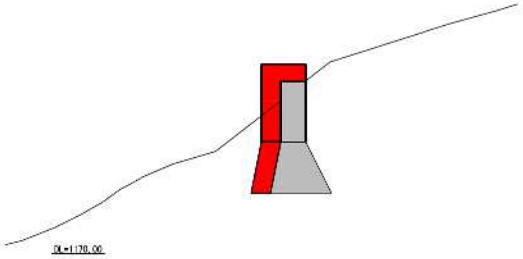

R 5.00

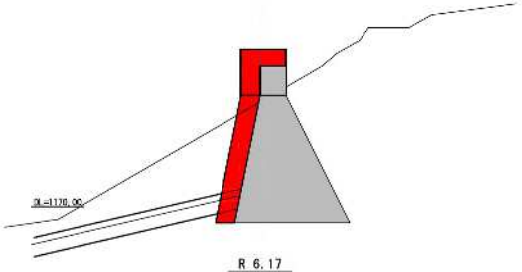

L 6.17

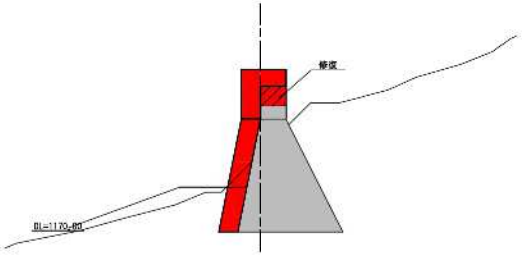

L13.00



R 6.17



L 5.00

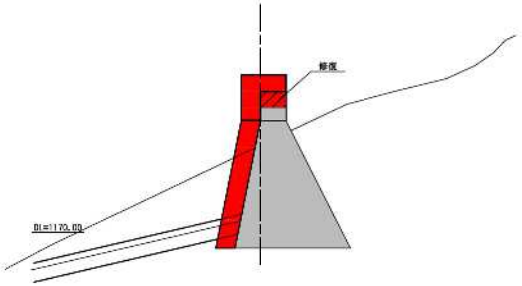

L10.00



本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります

凡　例	
	今回施工箇所
	施工済箇所

工事名	R８般若沢第４床固改築工事		
図面名	横断図（２）		
縮　尺	1:200	図面番号	12 の 10
年月日	令和８年７月　日		
会社名	大日本コンサルタント株式会社		
事務所名	国土交通省　日光砂防事務所		

横断図（３） S=1:200

（第４床固工）

L21.00

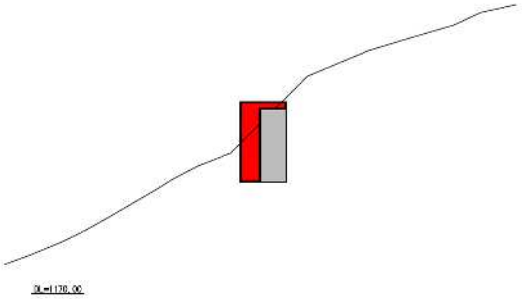

DL=1170.00

L26.00

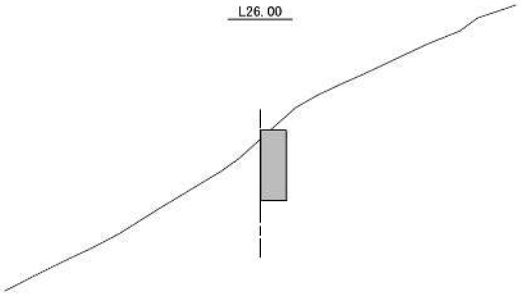

DL=1170.00

L19.00

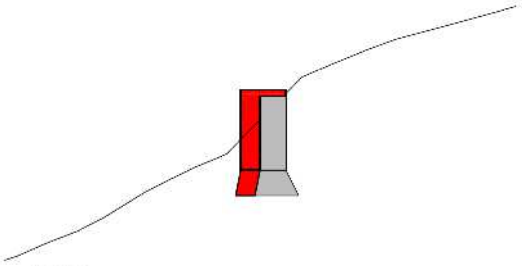

DL=1170.00

L25.00

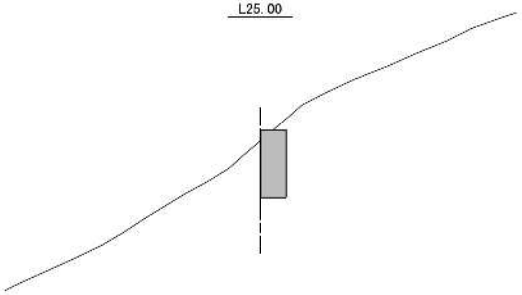

DL=1170.00

L17.00

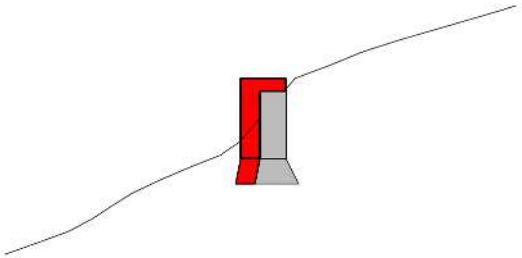

DL=1170.00

L22.00

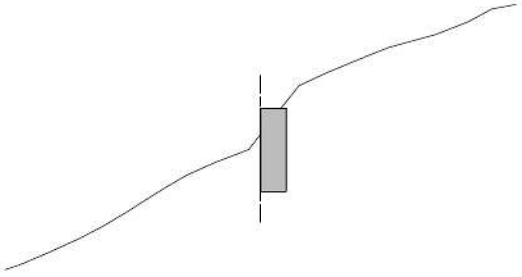

DL=1170.00

L26.67

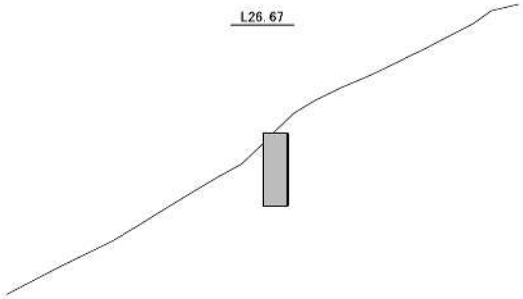

DL=1170.00

本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります

凡　例	
	今回施工箇所
	施工済箇所

工事名	R８般若沢第４床固改築工事		
図面名	横断図（３）		
縮　尺	1:200	図面番号	12 の 11
年月日	令和８年７月　日		
会社名	大日本コンサルタント株式会社		
事務所名	国土交通省　日光砂防事務所		

構造物撤去工詳細図 S=1:200

（既設堰堤取壊し）　（第４床固工）

本堤正面図

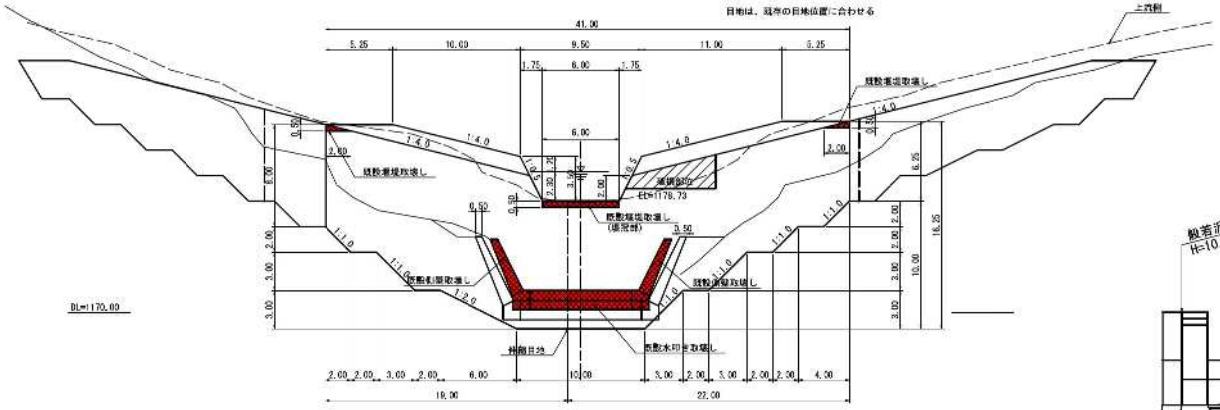

側面図

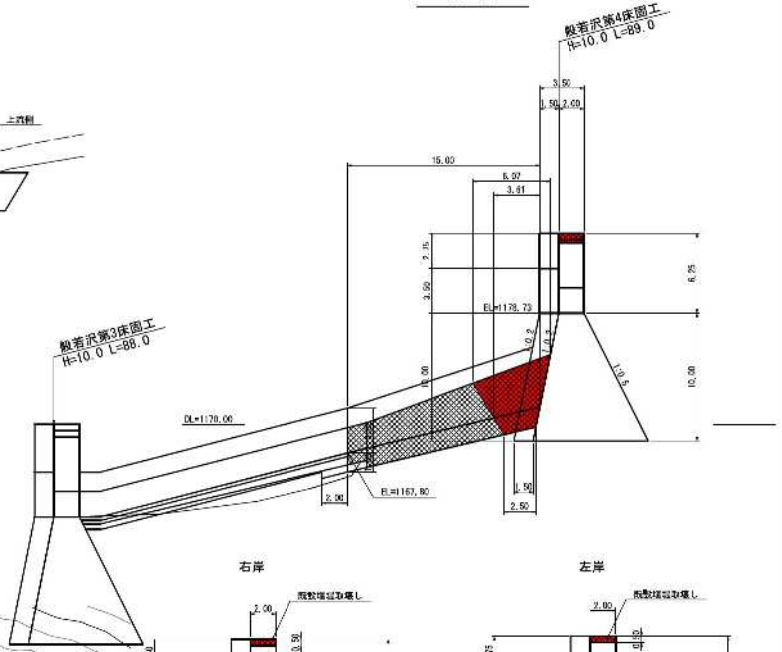

平面図

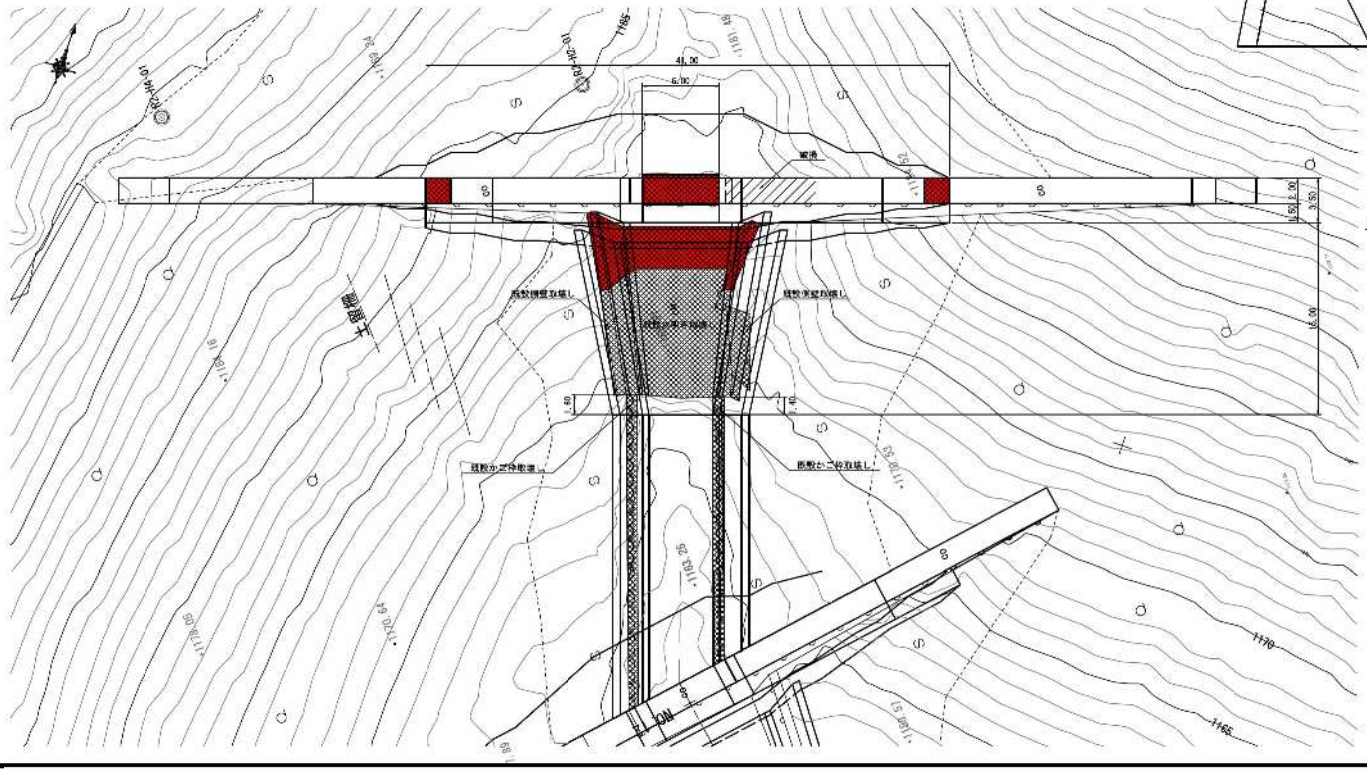

右岸

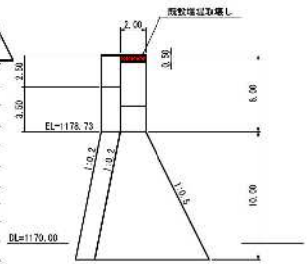

左岸

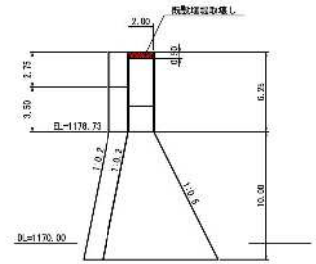

越流部

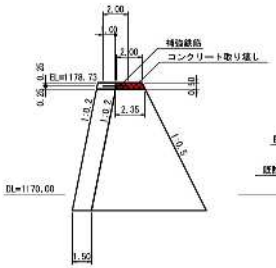

前庭保護工正面図



本図面は縮小図のため縮尺は表示と異なります

凡例	
	今回施工箇所
	施工済箇所

工事名	R８般若沢第４床固改築工事		
図面名	構造物撤去工詳細図		
縮尺	1:200	図面番号	12 の 12
年月日	令和８年７月　日		
会社名	大日本コンサルタント株式会社		
事務所名	国土交通省　日光砂防事務所		
